

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Acarape do Meio


MUNICÍPIO: Redenção

B. HIDROGRÁFICA: Metropolitanas

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
31.500.000	30.000	130,02	105,50	60	0	210	1924

ANO: ano de construção do açude

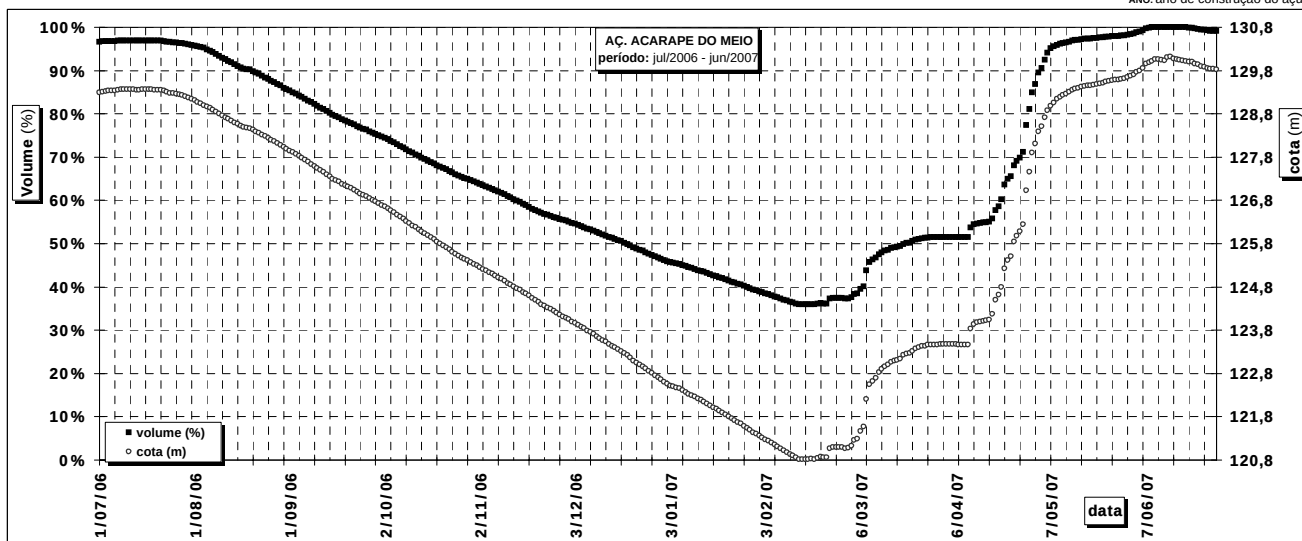

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	18/2/2007	232	129,29	120,83	8,46	3,65	30.426.460	11.341.203	19.085.257	952	49	903

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
19/2/2007	19/2/2007	20/6/2007	109	120,82	130,12	20.282.412	9.504.000	1.051.488	215.921	31.053.821

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
786.473	0	0	0	0	0	0	1.265.053	7.211.318	12.457.688	6.959.146	3.298.912	31.978.590

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	129,29	30.426.460	96,6%	-264.694	-8.539	-0,18	-0,58
01/08/2006	129,11	30.161.766	95,8%	-3.296.774	-106.348	-1,16	-3,74
01/09/2006	127,95	26.864.992	85,3%	-3.339.986	-111.333	-1,26	-4,20
01/10/2006	126,69	23.525.006	74,7%	-3.358.004	-108.323	-1,40	-4,52
01/11/2006	125,29	20.167.002	64,0%	-2.826.996	-94.233	-1,24	-4,13
01/12/2006	124,05	17.340.006	55,0%	-2.787.105	-89.907	-1,44	-4,65
01/01/2007	122,61	14.552.901	46,2%	-2.292.100	-73.939	-1,25	-4,03
01/02/2007	121,36	12.260.801	38,9%	-516.202	-18.436	-0,29	-1,04
01/03/2007	121,07	11.744.599	37,3%	4.486.208	144.716	2,41	7,77
01/04/2007	123,48	16.230.807	51,5%	10.499.197	349.973	4,42	14,73
01/05/2007	127,90	26.730.004	84,9%	4.211.172	135.844	1,74	5,61
01/06/2007	129,64	30.941.176	98,2%	264.718	8.824	0,18	0,60
01/07/2007	129,82	31.205.894	99,1%				
TOTAL ANUAL				779.434		0,53	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.198.320	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)
365	0	10	78	359,5	11,54	125,75	21.798.000

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência GEMET

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Acaraú Mirim


MUNICÍPIO: Massapê

B. HIDROGRÁFICA: Acaraú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
52.000.000	9.500.000	115,00	106,50	60	0	492	1907

ANO: ano de construção do açude

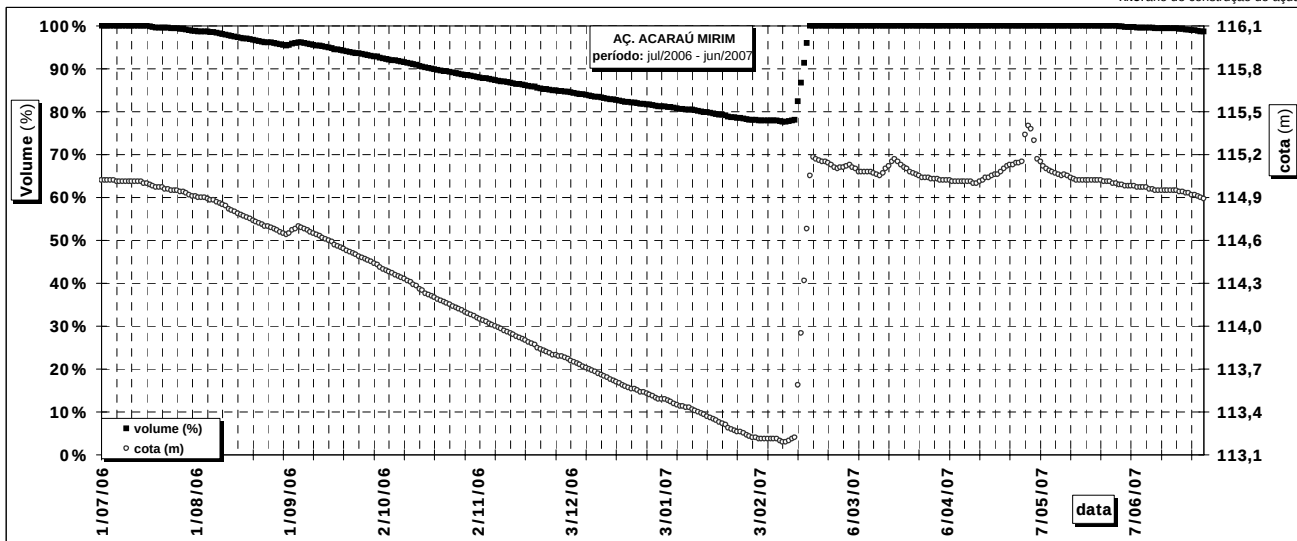

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	115,02	113,19	1,83	0,81	52.000.000	40.378.016	11.621.984	597	466	131

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	31/5/2007	103	113,19	115,40	11.621.984	1.883.520	25.148.647	2.719.096	41.373.247

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
846.968	193.833	0	0	0	0	0	16.085.043	8.666.953	3.926.185	11.830.819	0	41.549.801

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	115,02	52.000.000	100,0%	-593.976	-19.161	-0,11	-0,35
01/08/2006	114,91	51.406.024	98,9%	-1.716.012	-55.355	-0,26	-0,84
01/09/2006	114,65	49.690.012	95,6%	-1.583.988	-52.800	-0,24	-0,80
01/10/2006	114,41	48.106.024	92,5%	-2.244.028	-72.388	-0,34	-1,10
01/11/2006	114,07	45.861.996	88,2%	-1.826.004	-60.867	-0,29	-0,97
01/12/2006	113,78	44.035.992	84,7%	-1.798.004	-58.000	-0,29	-0,94
01/01/2007	113,49	42.237.988	81,2%	-1.673.980	-53.999	-0,27	-0,87
01/02/2007	113,22	40.564.008	78,0%	-1.435.992	-48.000	-0,27	-0,87
01/03/2007	113,10	40.000.000	77,0%	-564.008	-18.471	-0,07	-0,23
01/04/2007	115,03	52.000.000	100,0%	0	0	0,12	0,40
01/05/2007	115,15	52.000.000	100,0%	0	0	-0,15	-0,48
01/06/2007	115,00	52.000.000	100,0%	-792.020	-26.401	-0,12	-0,40
01/07/2007	114,88	51.207.980	98,5%	-792.020	-26.401	-0,12	-0,40
TOTAL ANUAL				-792.020		-0,14	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						13.429.626	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
146	0	98	37	456,8	6,83	114,47	48.412.000	93,1%

O monitoramento deste açude conta com o apoio da gerência Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Adauto Bezerra


MUNICÍPIO: Pereiro

B. HIDROGRÁFICA: Médio Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
5.250.000		100,00		24	0	31	1984

ANO: ano de construção do açude

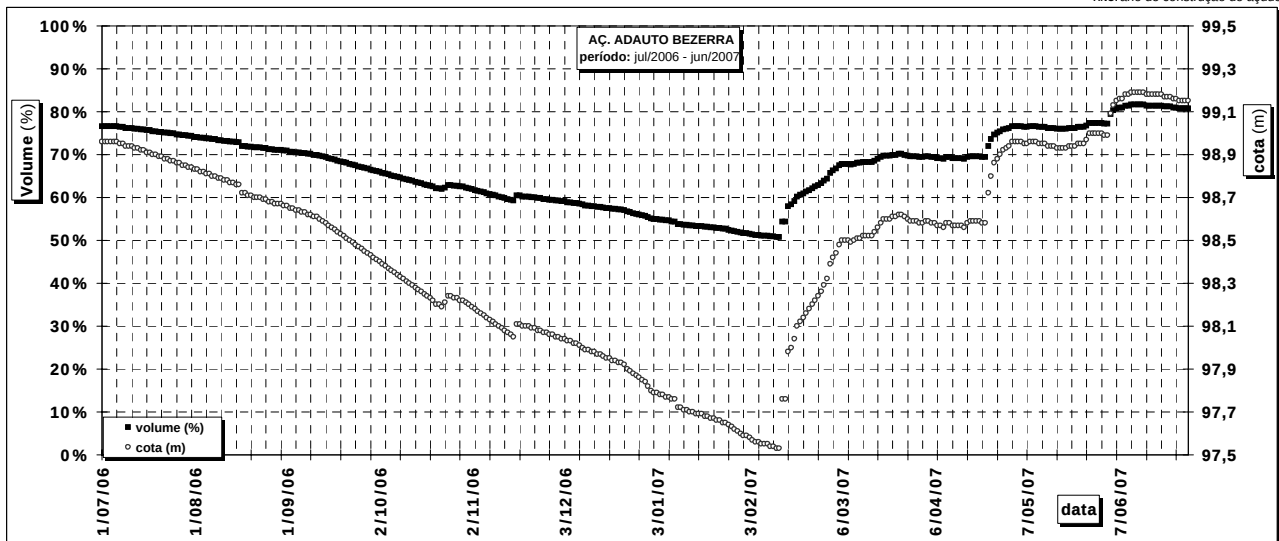

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	98,96	97,54	1,42	0,63	4.019.999	2.669.001	1.350.998	69	69	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	10/6/2007	102	97,53	99,18	1.785.606	69.120	0	335.225	2.189.951

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	76.515	71.017	0	0	820.792	411.911	502.836	165.849	294.463	2.343.383

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	98,96	4.019.999	76,6%	-129.997	-4.193	-0,13	-0,42
01/08/2006	98,83	3.890.002	74,1%	-169.998	-5.484	-0,17	-0,55
01/09/2006	98,66	3.720.004	70,9%	-250.000	-8.333	-0,25	-0,83
01/10/2006	98,41	3.470.004	66,1%	-210.007	-6.774	-0,21	-0,68
01/11/2006	98,20	3.259.997	62,1%	-149.994	-5.000	-0,15	-0,50
01/12/2006	98,05	3.110.003	59,2%	-220.000	-7.097	-0,25	-0,81
01/01/2007	97,80	2.890.003	55,0%	-178.506	-5.758	-0,21	-0,68
01/02/2007	97,59	2.711.497	51,6%	668.503	23.875	0,73	2,61
01/03/2007	98,32	3.380.000	64,4%	260.002	8.387	0,26	0,84
01/04/2007	98,58	3.640.002	69,3%	360.001	12.000	0,36	1,20
01/05/2007	98,94	4.000.003	76,2%	59.997	1.935	0,06	0,19
01/06/2007	99,00	4.060.000	77,3%	166.600	5.553	0,14	0,47
01/07/2007	99,14	4.226.600	80,5%				
TOTAL ANUAL				206.601		0,18	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						2.098.602	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	MÉDIO (%)
365	0	0	23	817,7	3,55	98,45	3.522.750	67,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Amanary


MUNICÍPIO: Maranguape

B. HIDROGRÁFICA: Metropolitanas

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
11.010.000		96,00		19	0	32	1938

ANO: ano de construção do açude

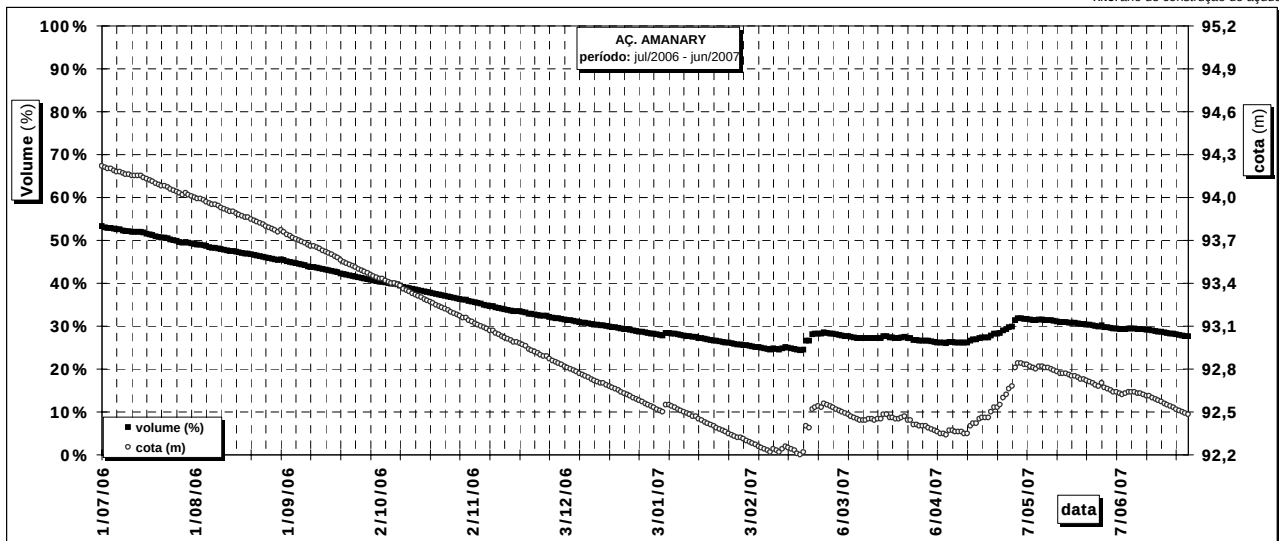

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	4/1/2007	187	94,22	92,51	1,71	0,91	5.862.003	3.072.803	2.789.200	172	95	77

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
5/1/2007	11/4/2007	9/6/2007	30	92,20	92,84	1.459.198	40.608	0	154.909	1.654.715

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
29.114	26.652	0	0	0	0	75.551	607.112	126.989	500.575	308.855	40.675	1.715.523

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	94,22	5.862.003	53,2%	-462.003	-14.903	-0,22	-0,71
01/08/2006	94,00	5.400.000	49,0%	-442.003	-14.258	-0,26	-0,84
01/09/2006	93,74	4.957.997	45,0%	-509.993	-17.000	-0,30	-1,00
01/10/2006	93,44	4.448.004	40,4%	-510.005	-16.452	-0,30	-0,97
01/11/2006	93,14	3.937.999	35,8%	-442.804	-14.760	-0,30	-1,00
01/12/2006	92,84	3.495.195	31,7%	-383.994	-12.387	-0,30	-0,97
01/01/2007	92,54	3.111.201	28,3%	-294.404	-9.497	-0,23	-0,74
01/02/2007	92,31	2.816.797	25,6%	307.207	10.972	0,24	0,86
01/03/2007	92,55	3.124.004	28,4%	-192.002	-6.194	-0,15	-0,48
01/04/2007	92,40	2.932.002	26,6%	332.803	11.093	0,26	0,87
01/05/2007	92,66	3.264.805	29,7%	51.191	1.651	0,04	0,13
01/06/2007	92,70	3.315.996	30,1%	-294.394	-9.813	-0,23	-0,77
01/07/2007	92,47	3.021.602	27,4%				
TOTAL ANUAL				-2.840.401		-1,75	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						2.194.434	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	18	2.342,5	2,55	92,97	3.776.430	34,3%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência GEMET

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Angicos


MUNICÍPIO: Coreaú

B. HIDROGRÁFICA: Coreaú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
56.050.000	3.700.000	105,50	97,00	100	32	287	1998

ANO: ano de construção do açude

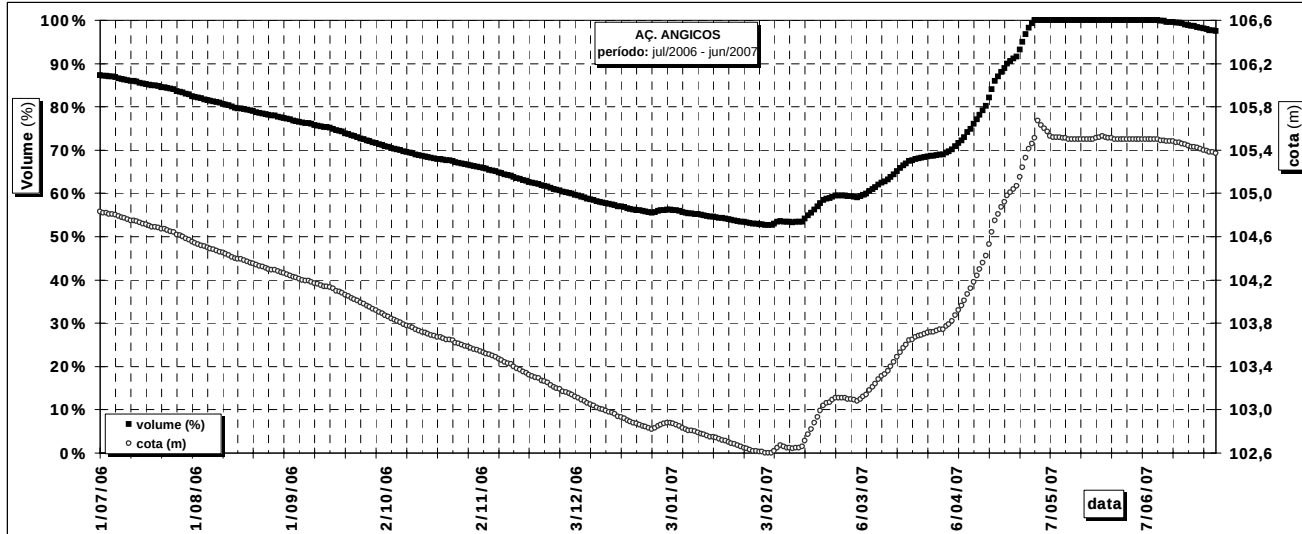

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	4/2/2007	218	104,83	102,60	2,23	1,02	48.937.416	29.537.990	19.399.426	1.029	671	358

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
5/2/2007	5/2/2007	11/6/2007	107	102,60	105,67	26.978.790	578.314	3.326.400	2.738.336	33.621.840

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	586.229	161.646	4.683.264	6.375.848	18.002.179	4.089.805	0	33.898.971

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	104,83	48.937.416	87,3%	-2.836.208	-91.491	-0,29	-0,94
01/08/2006	104,54	46.101.208	82,3%	-2.934.028	-94.646	-0,30	-0,97
01/09/2006	104,24	43.167.180	77,0%	-3.274.484	-109.149	-0,35	-1,17
01/10/2006	103,89	39.892.696	71,2%	-2.866.172	-92.457	-0,34	-1,10
01/11/2006	103,55	37.026.524	66,1%	-3.372.012	-112.400	-0,40	-1,33
01/12/2006	103,15	33.654.512	60,0%	-2.191.392	-70.690	-0,28	-0,90
01/01/2007	102,87	31.463.120	56,1%	-1.853.816	-59.801	-0,26	-0,84
01/02/2007	102,61	29.609.304	52,8%	3.708.002	132.429	0,50	1,79
01/03/2007	103,11	33.317.306	59,4%	5.310.874	171.319	0,63	2,03
01/04/2007	103,74	38.628.180	68,9%	16.985.812	566.194	1,72	5,73
01/05/2007	105,46	55.613.992	99,2%	436.008	14.065	0,04	0,13
01/06/2007	105,50	56.050.000	100,0%	-1.525.992	-50.866	-0,14	-0,47
01/07/2007	105,36	54.524.008	97,3%				
TOTAL ANUAL				5.586.592		0,53	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						17.669.284	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
106	0	17	16	603,5	4,53	103,97	41.252.800	73,6%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Aracoiaba


MUNICÍPIO: Aracoiaba

B. HIDROGRÁFICA: Metropolitanas

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
170.700.000	5.660.000	95,00	75,00	32	0	533	2003

ANO: ano de construção do açude

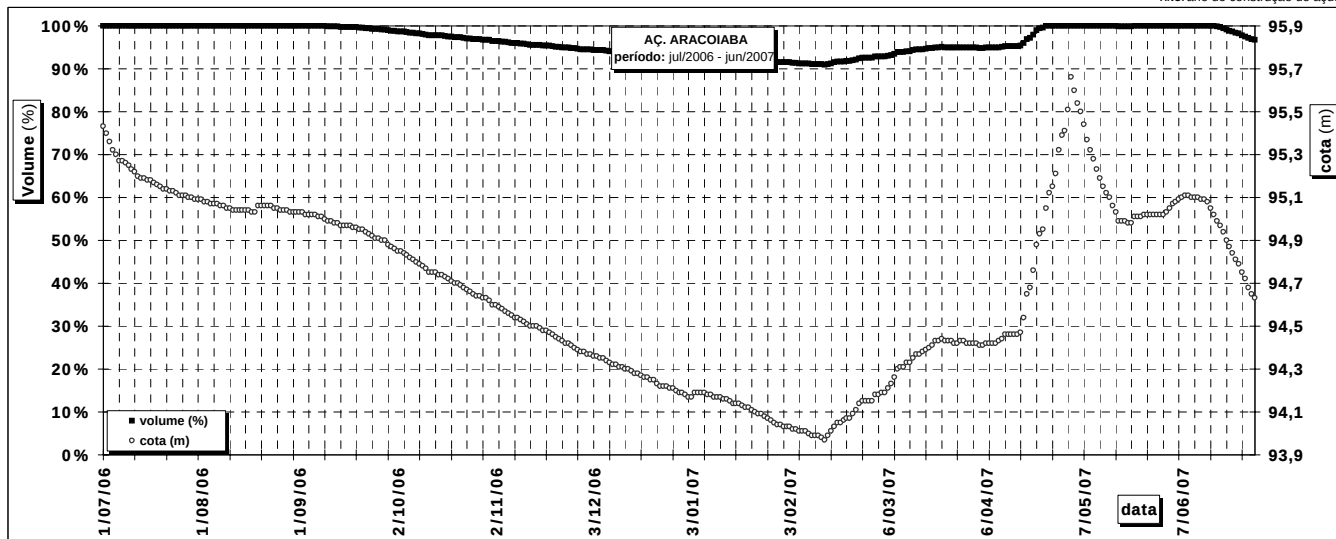

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	1/1/2007	184	95,43	94,18	1,25	0,68	170.700.000	158.349.168	12.350.832	776	776	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
2/1/2007	14/2/2007	17/6/2007	117	93,97	95,66	16.568.176	2.903.040	20.312.712	5.724.885	45.508.813

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
15.858.523	5.559.887	1.295.904	0	0	0	638.140	3.940.400	6.354.874	12.453.624	18.060.883	17	64.162.252

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	95,43	170.700.000	100,0%	0	0	-0,34	-1,10
01/08/2006	95,09	170.700.000	100,0%	0	0	-0,06	-0,19
01/09/2006	95,03	170.700.000	100,0%	-2.108.672	-70.289	-0,17	-0,57
01/10/2006	94,86	168.591.328	98,8%	-3.916.144	-126.327	-0,26	-0,84
01/11/2006	94,60	164.675.184	96,5%	-3.464.208	-115.474	-0,23	-0,77
01/12/2006	94,37	161.210.976	94,4%	-2.861.808	-92.316	-0,19	-0,61
01/01/2007	94,18	158.349.168	92,8%	-2.259.328	-72.882	-0,15	-0,48
01/02/2007	94,03	156.089.840	91,4%	1.807.488	64.553	0,12	0,43
01/03/2007	94,15	157.897.328	92,5%	4.066.688	131.183	0,27	0,87
01/04/2007	94,42	161.964.016	94,9%	8.735.984	291.199	0,99	3,30
01/05/2007	95,41	170.700.000	100,0%	0	0	-0,39	-1,26
01/06/2007	95,02	170.700.000	100,0%	-5.572.976	-185.766	-0,39	-1,30
01/07/2007	94,63	165.127.024	96,7%				
TOTAL ANUAL				-5.572.976		-0,80	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						30.677.778	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	49	15	971,1	11,28	94,67	165.066.900	96,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência GEMET

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Araras


MUNICÍPIO: Varjota

B. HIDROGRÁFICA: Acaraú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
891.000.000	17.757.500	153,00	129,50	260	389	3.517	1958

ANO: ano de construção do açude

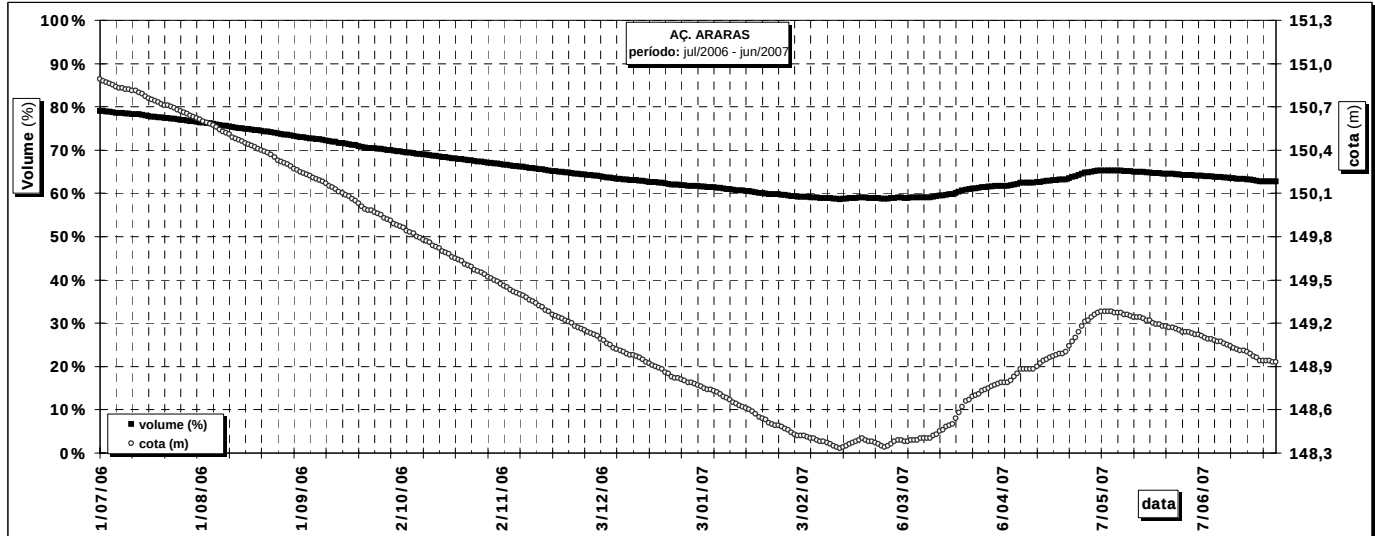

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	14/2/2007	228	150,89	148,34	2,55	1,12	704.482.304	522.739.776	181.742.528	9.225	5.148	4.077

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
15/2/2007	2/3/2007	6/5/2007	70	148,33	149,27	63.645.632	10.674.552	0	14.677.448	88.997.632

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	7.989.713	35.175.899	36.208.244	9.016.656	0	88.390.512

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA (m)	VOLUME (m³)	(%)	VARIÇÃO VOLUME (m³)	(m³/dia)	VARIÇÃO COTA (m)	(cm/dia)
01/07/2006	150,89	704.482.304	79,1%	-23.717.568	-765.083	-0,28	-0,90
01/08/2006	150,61	680.764.736	76,4%	-30.494.208	-983.684	-0,36	-1,16
01/09/2006	150,25	650.270.528	73,0%	-29.107.456	-970.249	-0,37	-1,23
01/10/2006	149,88	621.163.072	69,7%	-25.776.640	-831.505	-0,39	-1,26
01/11/2006	149,49	595.386.432	66,8%	-24.455.488	-815.183	-0,37	-1,23
01/12/2006	149,12	570.930.944	64,1%	-21.351.040	-688.743	-0,34	-1,10
01/01/2007	148,78	549.579.904	61,7%	-21.350.336	-688.721	-0,35	-1,13
01/02/2007	148,43	528.229.568	59,3%	-5.489.792	-196.064	-0,09	-0,32
01/03/2007	148,34	522.739.776	58,7%	24.400.576	787.115	0,40	1,29
01/04/2007	148,74	547.140.352	61,4%	27.756.096	925.203	0,44	1,47
01/05/2007	149,18	574.896.448	64,5%	-2.643.328	-85.269	-0,04	-0,13
01/06/2007	149,14	572.253.120	64,2%	-14.133.248	-471.108	-0,22	-0,73
01/07/2007	148,92	558.119.872	62,6%				
TOTAL ANUAL				-146.362.432		-1,97	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						132.598.632	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº D. V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
170	0	0	4	3.679,3	8,54	149,33	587.169.000	65,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Arneiroz II


MUNICÍPIO: Arneiroz

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
197.060.000	821.197	368,00	345,00	300	2.571	5.407	2004

ANO: ano de construção do açude

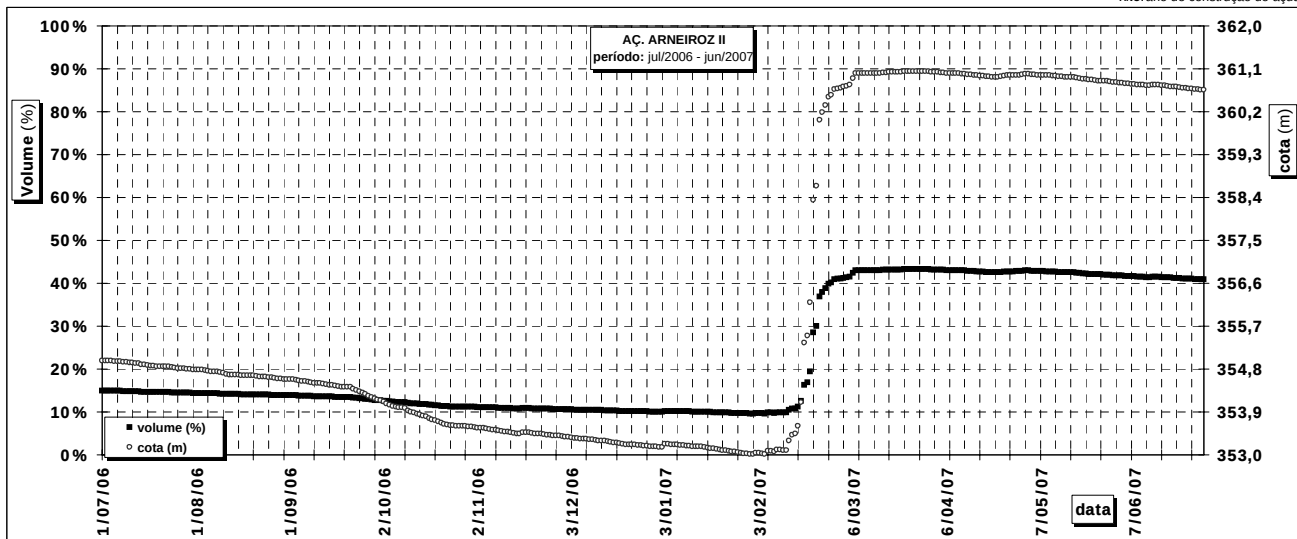

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	354,97	353,17	1,80	0,98	29.337.400	19.763.522	9.573.878	605	554	51

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	9/2/2007	12/6/2007	84	353,02	361,05	67.906.828	0	0	2.229.282	70.136.110

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	253.725	0	455.728	62.850.289	5.265.795	1.066.404	203.035	340.056	70.435.032

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	354,97	29.337.400	14,9%	-957.354	-30.882	-0,18	-0,58
01/08/2006	354,79	28.380.046	14,4%	-1.117.078	-36.035	-0,21	-0,68
01/09/2006	354,58	27.262.968	13,8%	-2.340.148	-78.005	-0,44	-1,47
01/10/2006	354,14	24.922.820	12,6%	-2.978.710	-96.087	-0,56	-1,81
01/11/2006	353,58	21.944.110	11,1%	-1.063.674	-35.456	-0,20	-0,67
01/12/2006	353,38	20.880.436	10,6%	-1.170.156	-37.747	-0,22	-0,71
01/01/2007	353,16	19.710.280	10,0%	-744.718	-24.023	-0,14	-0,45
01/02/2007	353,02	18.965.562	9,6%	61.901.174	2.210.756	7,67	27,39
01/03/2007	360,69	80.866.736	41,0%	4.188.904	135.126	0,34	1,10
01/04/2007	361,03	85.055.640	43,2%	-615.872	-20.529	-0,05	-0,17
01/05/2007	360,98	84.439.768	42,8%	-1.971.312	-63.591	-0,16	-0,52
01/06/2007	360,82	82.468.456	41,8%	-2.094.648	-69.822	-0,17	-0,57
01/07/2007	360,65	80.373.808	40,8%				
TOTAL ANUAL				51.036.408		5,68	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						16.831.754	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	MÉDIO (%)
361	0	0	215	1.021,2	5,25	356,39	44.732.620	22,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência/guatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Arrebita


MUNICÍPIO: Forquilha

B. HIDROGRÁFICA: Acaraú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
19.600.000	290.000	112,00	102,00	70	0	126	1992

ANO: ano de construção do açude

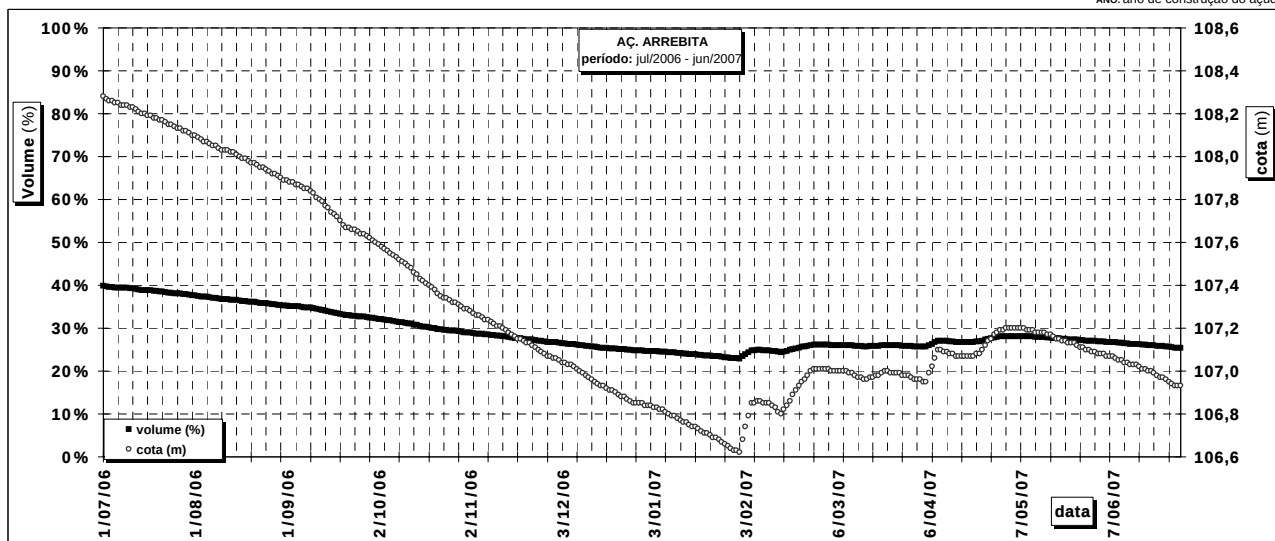

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/1/2007	214	108,28	106,63	1,65	0,77	7.810.397	4.496.896	3.313.501	179	148	31

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/2/2007	1/2/2007	30/4/2007	49	106,62	107,19	1.330.804	0	0	298.083	1.628.887

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	886.869	109.174	632.844	0	0	1.628.887

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	108,28	7.810.397	39,8%	-437.400	-14.110	-0,18	-0,58
01/08/2006	108,10	7.372.997	37,6%	-466.298	-15.042	-0,21	-0,68
01/09/2006	107,89	6.906.699	35,2%	-588.702	-19.623	-0,29	-0,97
01/10/2006	107,60	6.317.997	32,2%	-629.295	-20.300	-0,31	-1,00
01/11/2006	107,29	5.688.702	29,0%	-466.907	-15.564	-0,23	-0,77
01/12/2006	107,06	5.221.795	26,6%	-382.601	-12.342	-0,22	-0,71
01/01/2007	106,84	4.839.194	24,7%	-358.589	-11.567	-0,22	-0,71
01/02/2007	106,62	4.480.605	22,9%	639.700	22.846	0,39	1,39
01/03/2007	107,01	5.120.305	26,1%	-85.506	-2.758	-0,05	-0,16
01/04/2007	106,96	5.034.799	25,7%	450.906	15.030	0,23	0,77
01/05/2007	107,19	5.485.705	28,0%	-203.012	-6.549	-0,10	-0,32
01/06/2007	107,09	5.282.693	27,0%	-313.096	-10.437	-0,17	-0,57
01/07/2007	106,92	4.969.597	25,4%				
TOTAL ANUAL				-2.840.800		-1,36	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						3.727.029	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	MÉDIO (%)
164	0	0	6	4.392,0	2,93	107,28	5.703.600	29,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Atalho


MUNICÍPIO: Brejo Santo

B. HIDROGRÁFICA: Salgado

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
108.250.000	7.250.000	425,00	400,00	90	0	1.530	1991

ANO: ano de construção do açude

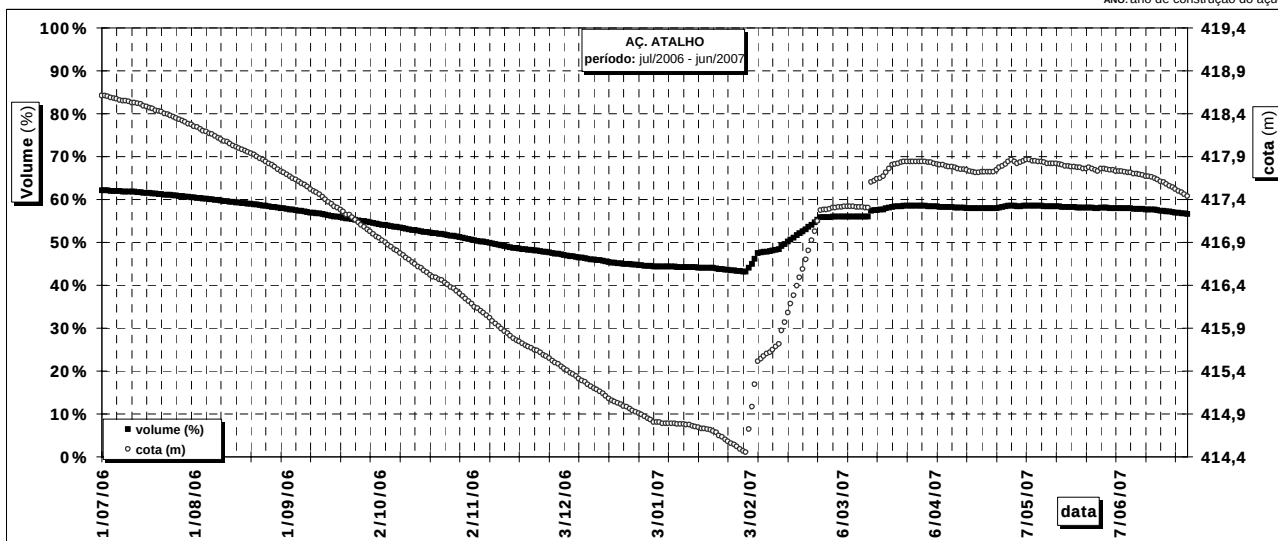

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	1/2/2007	215	418,61	414,47	4,14	1,93	67.233.664	46.741.124	#####	1.103	434	669

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
2/2/2007	2/2/2007	31/5/2007	72	414,45	417,86	17.896.640	17.280	0	1.240.162	19.154.082

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	14.315.879	3.284.520	835.868	529.201	0	18.965.468

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	418,61	67.233.664	62,1%	-1.848.164	-59.618	-0,36	-1,16
01/08/2006	418,25	65.385.500	60,4%	-2.875.028	-92.743	-0,56	-1,81
01/09/2006	417,69	62.510.472	57,7%	-3.696.484	-123.216	-0,72	-2,40
01/10/2006	416,97	58.813.988	54,3%	-3.901.892	-125.867	-0,76	-2,45
01/11/2006	416,21	54.912.096	50,7%	-3.747.720	-124.924	-0,73	-2,43
01/12/2006	415,48	51.164.376	47,3%	-3.092.744	-99.766	-0,65	-2,10
01/01/2007	414,83	48.071.632	44,4%	-1.330.508	-42.920	-0,36	-1,16
01/02/2007	414,47	46.741.124	43,2%	13.664.388	488.014	2,81	10,04
01/03/2007	417,28	60.405.512	55,8%	2.875.028	92.743	0,56	1,81
01/04/2007	417,84	63.280.540	58,5%	0	0	0,00	0,00
01/05/2007	417,84	63.280.540	58,5%	-410.648	-13.247	-0,08	-0,26
01/06/2007	417,76	62.869.892	58,1%	-1.745.544	-58.185	-0,34	-1,13
01/07/2007	417,42	61.124.348	56,5%				
TOTAL ANUAL				-6.109.316		-1,19	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						11.129.356	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
83	0	0	30	2.083,3	11,80	416,91	58.563.250	54,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrato

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Ayres de Souza

MUNICÍPIO: Sobral

B. HIDROGRÁFICA: Acaraú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
104.430.000	9.290.000	95,00	82,00	173	0	1.102	1936

ANO: ano de construção do açude



INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/1/2007	214	94,82	91,56	3,26	1,52	102.280.800	68.106.976	34.173.824	1.848	781	1.067

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/2/2007	1/2/2007	26/5/2007	108	91,54	95,62	37.276.752	4.221.504	341.462.734	4.545.066	387.506.056

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	30.282.363	22.424.835	256.892.435	61.337.504	0	370.937.137

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	94,82	102.280.800	97,9%	-4.776.024	-154.065	-0,40	-1,29
01/08/2006	94,42	97.504.776	93,4%	-5.629.752	-181.605	-0,48	-1,55
01/09/2006	93,94	91.875.024	88,0%	-5.125.000	-170.833	-0,50	-1,67
01/10/2006	93,44	86.750.024	83,1%	-4.407.504	-142.178	-0,43	-1,39
01/11/2006	93,01	82.342.520	78,8%	-4.714.992	-157.166	-0,46	-1,53
01/12/2006	92,55	77.627.528	74,3%	-5.227.520	-168.630	-0,51	-1,65
01/01/2007	92,04	72.400.008	69,3%	-4.469.496	-144.177	-0,50	-1,61
01/02/2007	91,54	67.930.512	65,0%	27.186.304	970.939	2,68	9,57
01/03/2007	94,22	95.116.816	91,1%	9.313.184	300.425	1,02	3,29
01/04/2007	95,24	104.430.000	100,0%	0	0	0,23	0,77
01/05/2007	95,47	104.430.000	100,0%	-716.368	-23.109	-0,53	-1,71
01/06/2007	94,94	103.713.632	99,3%	-2.746.240	-91.541	-0,23	-0,77
01/07/2007	94,71	100.967.392	96,7%				
TOTAL ANUAL				-1.313.408		-0,11	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						20.991.670	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
170	0	66	22	102,8	8,05	93,79	90.540.810	86,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Banabuiú


MUNICÍPIO: Banabuiú

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
1.601.000.000	185.641	142,50	94,12	102	9.896	14.250	1966

ANO: ano de construção do açude

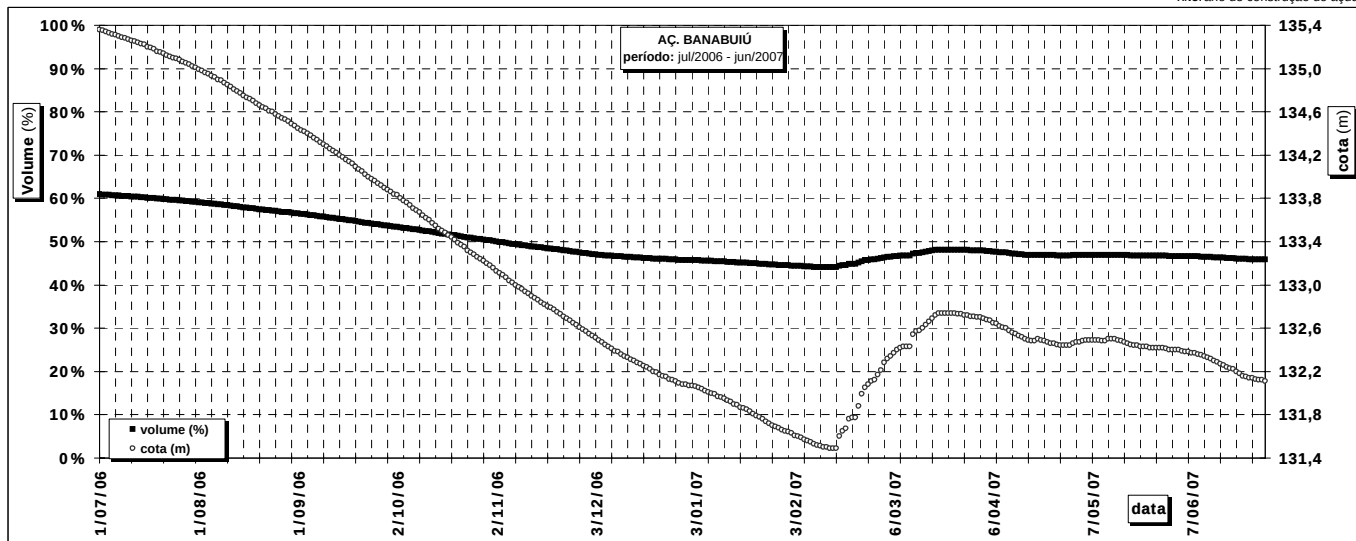

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	13/2/2007	227	135,36	131,50	3,86	1,70	974.580.032	705.500.032	269.080.000	13.719	5.606	8.113

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
14/2/2007	14/2/2007	11/5/2007	59	131,49	132,74	69.320.832	13.571.710	0	10.650.901	93.543.443

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	40.536.627	43.403.848	4.286.984	5.747.110	0	93.974.569

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	135,36	974.580.032	60,9%	-28.859.584	-930.954	-0,37	-1,19
01/08/2006	134,99	945.720.448	59,1%	-42.120.704	-1.358.732	-0,54	-1,74
01/09/2006	134,45	903.599.744	56,4%	-47.580.032	-1.586.001	-0,61	-2,03
01/10/2006	133,84	856.019.712	53,5%	-53.039.424	-1.710.949	-0,68	-2,19
01/11/2006	133,16	802.980.288	50,2%	-47.580.032	-1.586.001	-0,61	-2,03
01/12/2006	132,55	755.400.256	47,2%	-23.679.936	-763.869	-0,48	-1,55
01/01/2007	132,07	731.720.320	45,7%	-19.780.352	-638.076	-0,43	-1,39
01/02/2007	131,64	711.939.968	44,5%	24.379.968	870.713	0,53	1,89
01/03/2007	132,17	736.319.936	46,0%	30.779.840	992.898	0,53	1,71
01/04/2007	132,70	767.099.776	47,9%	-17.439.488	-581.316	-0,24	-0,80
01/05/2007	132,46	749.660.288	46,8%	-2.760.576	-89.051	-0,06	-0,19
01/06/2007	132,40	746.899.712	46,7%	-13.799.424	-459.981	-0,30	-1,00
01/07/2007	132,10	733.100.288	45,8%				
TOTAL ANUAL				-241.479.744		-3,26	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						142.975.424	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	11	6.218,3	11,74	133,02	797.298.000	49,8%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Quixeramobim

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Barra Velha


MUNICÍPIO: Independência

B. HIDROGRÁFICA: Parnaíba

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
99.500.000	4.430.000	333,60	324,50	310	0	856	1999

ANO: ano de construção do açude

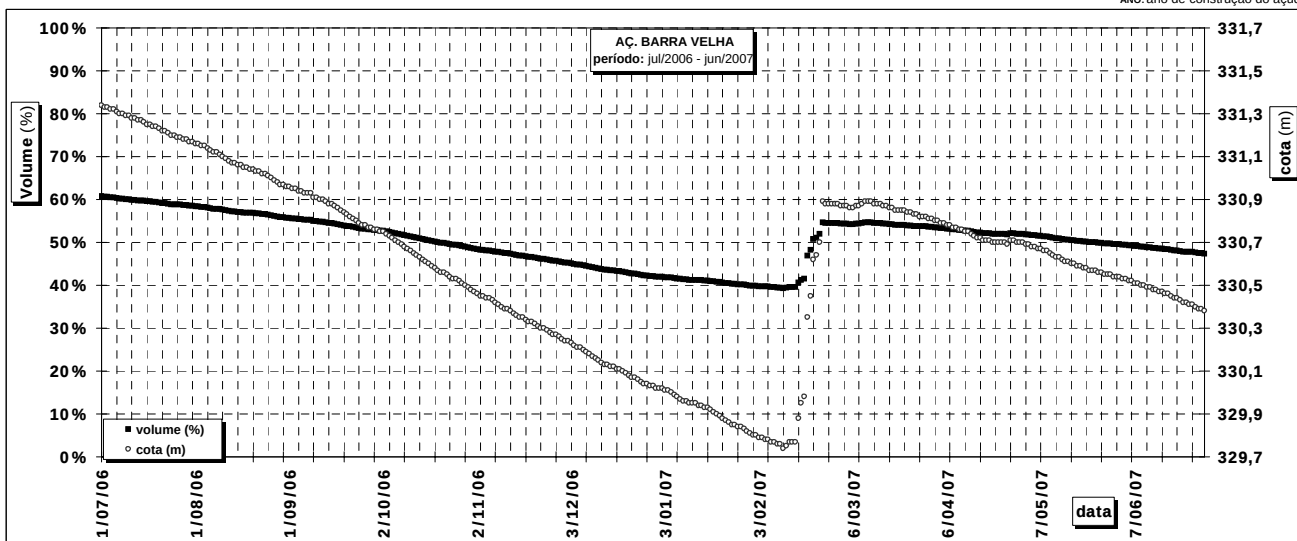

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	10/2/2007	224	331,34	329,76	1,58	0,71	60.375.752	39.244.492	#####	1.091	1.091	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
11/2/2007	11/2/2007	26/4/2007	51	329,74	330,89	16.075.568	0	0	1.210.521	17.286.089

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	16.205.832	739.305	392.383	0	0	17.337.520

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	331,34	60.375.752	60,7%	-2.316.504	-74.726	-0,18	-0,58
01/08/2006	331,16	58.059.248	58,4%	-2.638.972	-85.128	-0,20	-0,65
01/09/2006	330,96	55.420.276	55,7%	-3.042.776	-101.426	-0,21	-0,70
01/10/2006	330,75	52.377.500	52,6%	-4.057.184	-130.877	-0,28	-0,90
01/11/2006	330,47	48.320.316	48,6%	-3.332.856	-111.095	-0,23	-0,77
01/12/2006	330,24	44.987.460	45,2%	-3.187.820	-102.833	-0,22	-0,71
01/01/2007	330,02	41.799.640	42,0%	-2.177.756	-70.250	-0,22	-0,71
01/02/2007	329,80	39.621.884	39,8%	14.639.388	522.835	1,08	3,86
01/03/2007	330,88	54.261.272	54,5%	-1.014.408	-32.723	-0,07	-0,23
01/04/2007	330,81	53.246.864	53,5%	-1.593.688	-53.123	-0,11	-0,37
01/05/2007	330,70	51.653.176	51,9%	-2.318.452	-74.789	-0,16	-0,52
01/06/2007	330,54	49.334.724	49,6%	-2.318.452	-77.282	-0,16	-0,53
01/07/2007	330,38	47.016.272	47,3%				
TOTAL ANUAL				-13.359.480		-0,96	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						38.226.028	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
363	0	0	37	2.094,7	3,78	330,59	50.048.500	50,3%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrateús

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Benguê


MUNICÍPIO: Aiuaba

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
19.560.000	1.300.000	448,54	438,00	150	0	932	2000

ANO: ano de construção do açude

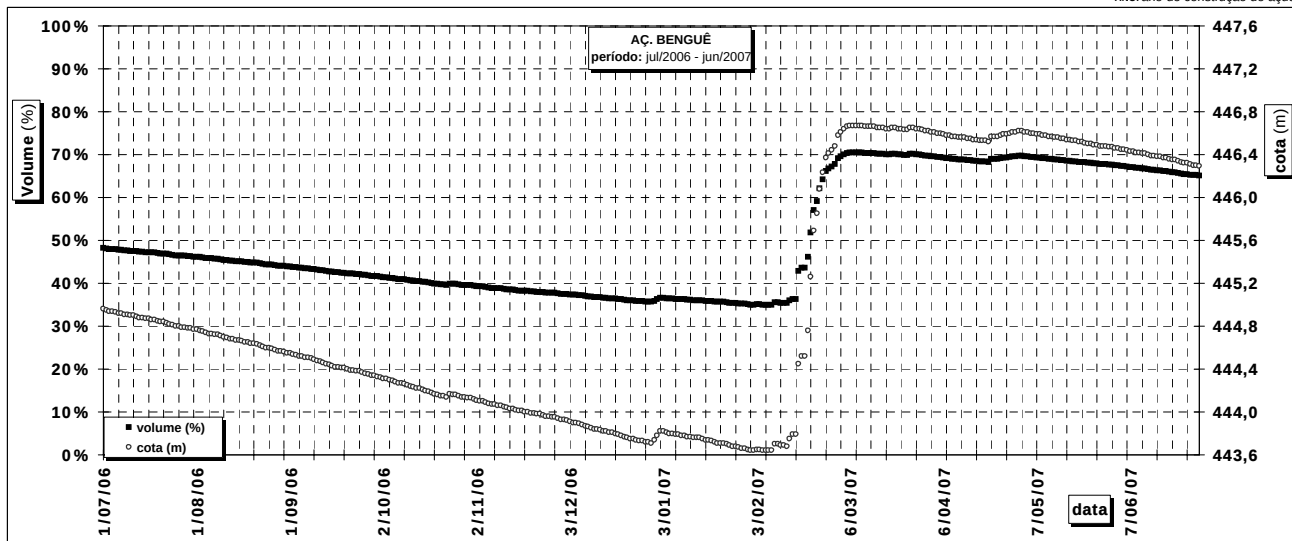

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	444,96	443,74	1,22	0,67	9.418.383	7.015.384	2.402.999	151	151	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	8/2/2007	30/4/2007	58	443,64	446,67	7.409.253	0	0	426.245	7.835.498

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	78.558	0	148.155	88.715	6.650.219	723.035	373.529	0	0	8.062.211

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	444,96	9.418.383	48,2%	-387.605	-12.503	-0,19	-0,61
01/08/2006	444,77	9.030.778	46,2%	-448.803	-14.478	-0,22	-0,71
01/09/2006	444,55	8.581.975	43,9%	-469.160	-15.639	-0,23	-0,77
01/10/2006	444,32	8.112.815	41,5%	-408.025	-13.162	-0,20	-0,65
01/11/2006	444,12	7.704.790	39,4%	-364.502	-12.150	-0,19	-0,63
01/12/2006	443,93	7.340.288	37,5%	-256.490	-8.274	-0,15	-0,48
01/01/2007	443,78	7.083.798	36,2%	-239.373	-7.722	-0,14	-0,45
01/02/2007	443,64	6.844.425	35,0%	6.400.006	228.572	2,84	10,14
01/03/2007	446,48	13.244.431	67,7%	389.155	12.553	0,14	0,45
01/04/2007	446,62	13.633.586	69,7%	0	0	0,00	0,00
01/05/2007	446,62	13.633.586	69,7%	-416.983	-13.451	-0,15	-0,48
01/06/2007	446,47	13.216.603	67,6%	-528.206	-17.607	-0,19	-0,63
01/07/2007	446,28	12.688.397	64,9%				
TOTAL ANUAL				3.270.014		1,32	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						5.197.636	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DÍAS V.MORTO	Nº DÍAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	66	885,5	4,33	445,03	9.858.240	50,4%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência/guatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Bonito


MUNICÍPIO: Ipú

B. HIDROGRÁFICA: Acaraú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
6.000.000	800.000	104,50	99,00	80	0	36	1964

ANO: ano de construção do açude

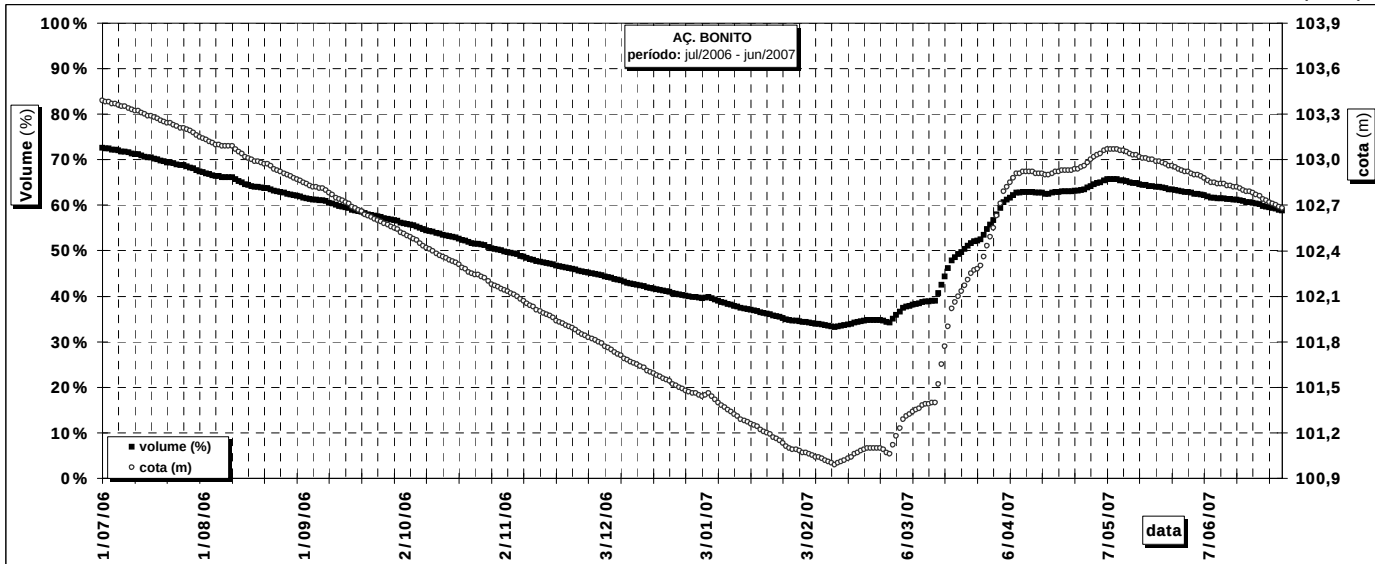

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	1/1/2007	184	103,39	101,45	1,94	1,05	4.356.999	2.382.498	1.974.501	124	77	47

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
2/1/2007	1/3/2007	3/5/2007	70	100,99	103,02	1.966.994	0	0	220.010	2.187.004

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	25.495	131.987	1.371.571	524.897	83.460	0	2.137.410

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	103,39	4.356.999	72,6%	-325.000	-10.484	-0,25	-0,81
01/08/2006	103,14	4.031.999	67,2%	-332.000	-10.710	-0,29	-0,94
01/09/2006	102,85	3.699.999	61,7%	-330.002	-11.000	-0,33	-1,10
01/10/2006	102,52	3.369.997	56,2%	-369.995	-11.935	-0,37	-1,19
01/11/2006	102,15	3.000.002	50,0%	-319.999	-10.667	-0,35	-1,17
01/12/2006	101,80	2.680.003	44,7%	-297.505	-9.597	-0,35	-1,13
01/01/2007	101,45	2.382.498	39,7%	-314.496	-10.145	-0,37	-1,19
01/02/2007	101,08	2.068.002	34,5%	-17.004	-607	-0,02	-0,07
01/03/2007	101,06	2.050.998	34,2%	1.289.000	41.581	1,43	4,61
01/04/2007	102,49	3.339.998	55,7%	490.005	16.334	0,49	1,63
01/05/2007	102,98	3.830.003	63,8%	-60.005	-1.936	-0,06	-0,19
01/06/2007	102,92	3.769.998	62,8%	-239.998	-8.000	-0,24	-0,80
01/07/2007	102,68	3.530.000	58,8%				
TOTAL ANUAL				-826.999		-0,71	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)				1.874.725			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO	
							(m³)	(%)
101	0	0	12	1.024,6	3,20	102,31	3.198.000	53,3%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência: Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Cachoeira


MUNICÍPIO: Aurora

B. HIDROGRÁFICA: Salgado

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
34.330.000	320.000	305,00	289,00	40	0	135	1999

ANO: ano de construção do açude

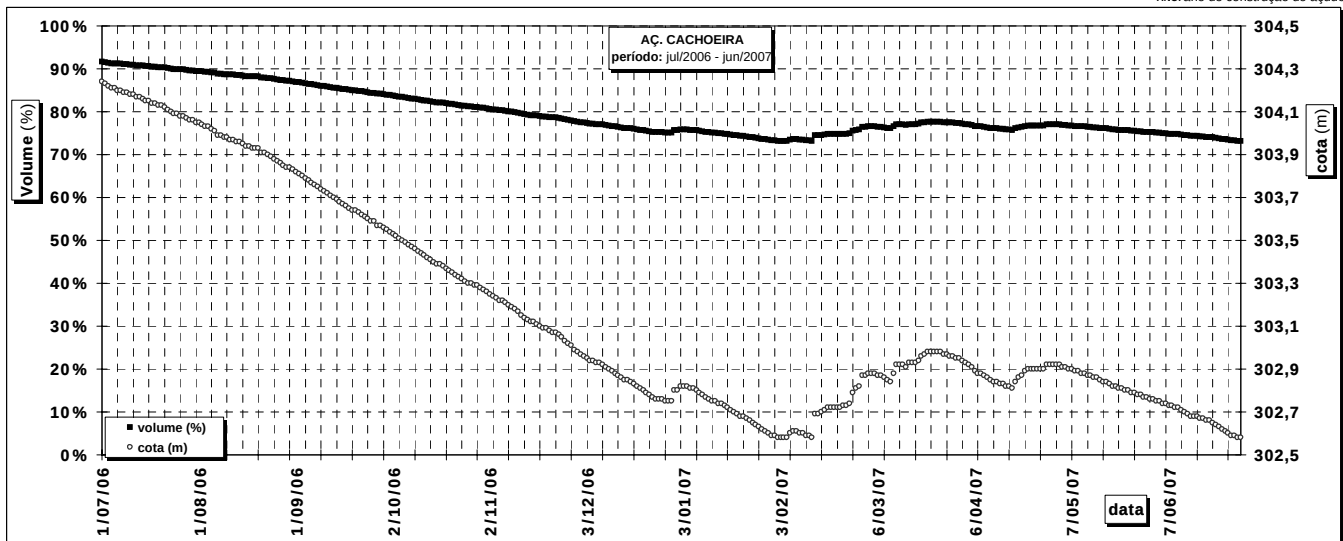

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	30/12/2006	182	304,24	302,75	1,49	0,82	31.438.922	25.771.000	5.667.922	360	356	4

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
31/12/2006		28/4/2007	53	302,58	302,98	2.320.736	185.760	0	691.185	3.197.681

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	285.683	125.720	1.608.391	864.038	586.305	0	0	3.470.137

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	304,24	31.438.922	91,6%	-722.768	-23.315	-0,19	-0,61
01/08/2006	304,05	30.716.154	89,5%	-874.846	-28.221	-0,23	-0,74
01/09/2006	303,82	29.841.308	86,9%	-1.065.116	-35.504	-0,28	-0,93
01/10/2006	303,54	28.776.192	83,8%	-1.065.114	-34.359	-0,28	-0,90
01/11/2006	303,26	27.711.078	80,7%	-1.103.194	-36.773	-0,29	-0,97
01/12/2006	302,97	26.607.884	77,5%	-646.730	-20.862	-0,17	-0,55
01/01/2007	302,80	25.961.154	75,6%	-798.808	-25.768	-0,21	-0,68
01/02/2007	302,59	25.162.346	73,3%	1.065.116	38.040	0,28	1,00
01/03/2007	302,87	26.227.462	76,4%	304.384	9.819	0,08	0,26
01/04/2007	302,95	26.531.846	77,3%	-114.114	-3.804	-0,03	-0,10
01/05/2007	302,92	26.417.732	77,0%	-608.654	-19.634	-0,16	-0,52
01/06/2007	302,76	25.809.078	75,2%	-722.770	-24.092	-0,19	-0,63
01/07/2007	302,57	25.086.308	73,1%				
TOTAL ANUAL				-6.352.614		-1,67	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						9.327.752	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)
365	0	0	11	3.610,9	6,66	303,16	27.326.680

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrato

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Canafistula


MUNICIPIO: Iracema

B. HIDROGRÁFICA: Médio Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
13.110.000	1.160.000	101,00	94,50	60	31	51	1992

ANO: ano de construção do açude

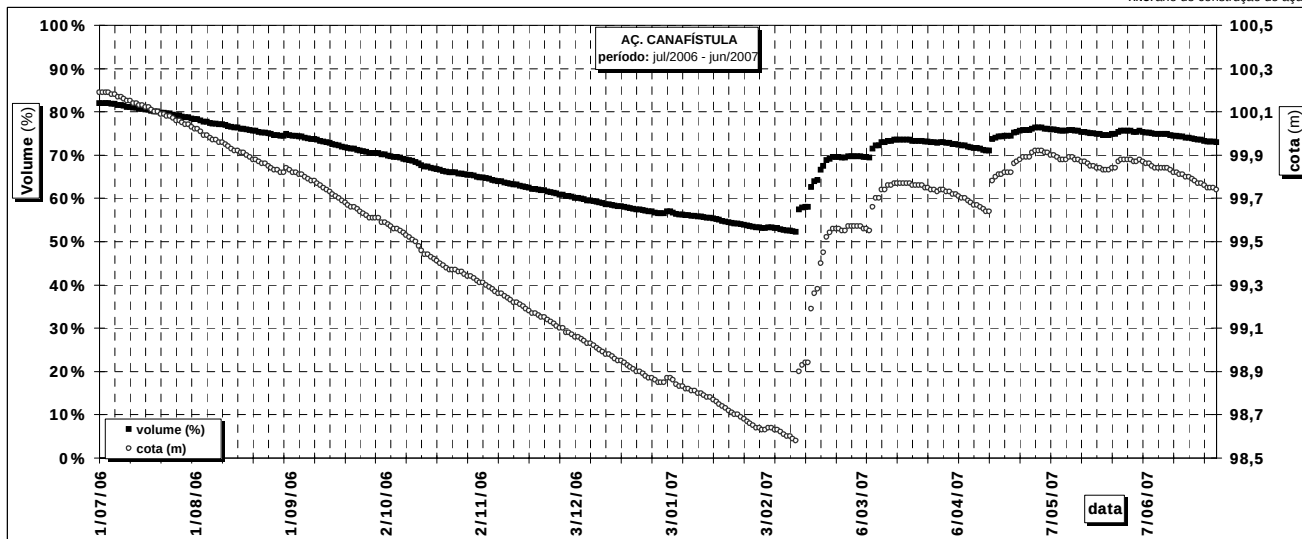

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	29/12/2006	181	100,19	98,86	1,33	0,73	10.752.907	7.436.002	3.316.905	212	203	9

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
30/12/2006	13/2/2007	4/6/2007	83	98,58	99,92	3.810.142	0	0	661.695	4.471.837

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	87.608	0	0	0	0	73.215	2.490.207	732.413	818.552	267.539	48.208	4.517.742

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	100,19	10.752.907	82,0%	-494.717	-15.959	-0,17	-0,55
01/08/2006	100,02	10.258.190	78,2%	-478.085	-15.422	-0,19	-0,61
01/09/2006	99,83	9.780.105	74,6%	-592.814	-19.760	-0,24	-0,80
01/10/2006	99,59	9.187.291	70,1%	-666.892	-21.513	-0,27	-0,87
01/11/2006	99,32	8.520.399	65,0%	-592.794	-19.760	-0,24	-0,80
01/12/2006	99,08	7.927.605	60,5%	-512.608	-16.536	-0,23	-0,74
01/01/2007	98,85	7.414.997	56,6%	-440.998	-14.226	-0,21	-0,68
01/02/2007	98,64	6.973.999	53,2%	2.114.509	75.518	0,91	3,25
01/03/2007	99,55	9.088.508	69,3%	469.287	15.138	0,19	0,61
01/04/2007	99,74	9.557.795	72,9%	419.914	13.997	0,17	0,57
01/05/2007	99,91	9.977.709	76,1%	-74.116	-2.391	-0,03	-0,10
01/06/2007	99,88	9.903.593	75,5%	-370.485	-12.350	-0,15	-0,50
01/07/2007	99,73	9.533.108	72,7%				
TOTAL ANUAL				-1.219.799		-0,46	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						5.266.173	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	MÉDIO (%)
365	0	0	32	1.059,2	3,64	99,53	9.045.900	69,0%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Canoas


MUNICÍPIO: Assaré

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
69.250.000	8.002	393,00	354,00	50	0	582	1999

ANO: ano de construção do açude

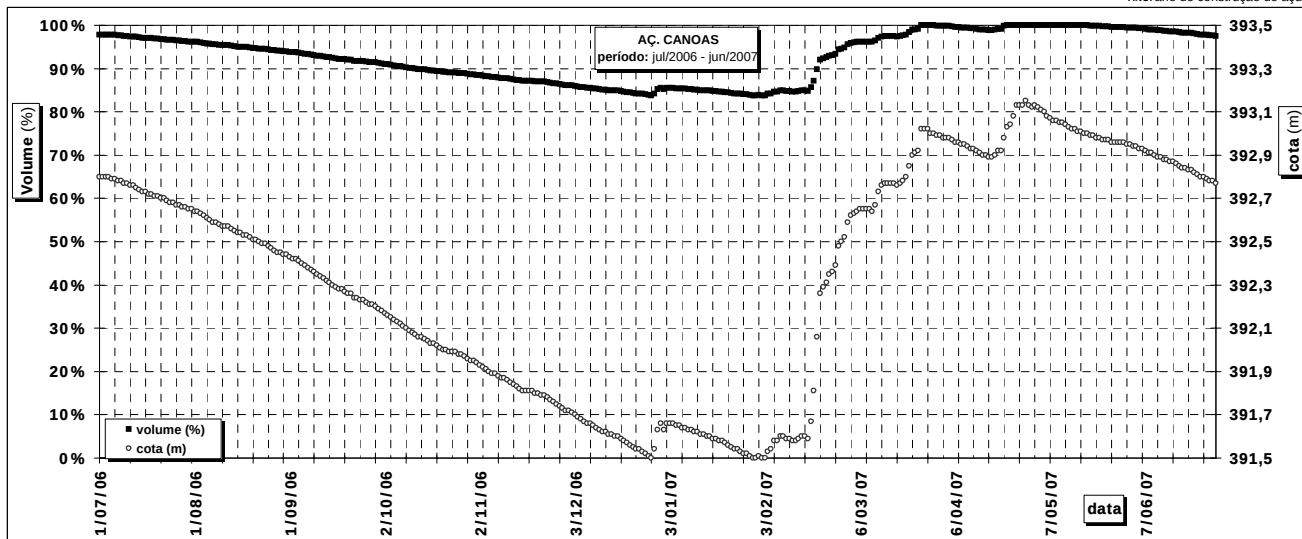

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	392,80	391,66	1,14	0,62	67.751.912	59.213.428	8.538.484	540	540	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	3/2/2007	19/5/2007	88	391,50	393,15	12.732.864	33.696	5.182.619	1.971.375	19.920.554

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	1.360.425	446.978	8.463.364	4.288.917	3.215.130	3.100.949	0	20.875.763

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	392,80	67.751.912	97,8%	-1.198.204	-38.652	-0,16	-0,52
01/08/2006	392,64	66.553.708	96,1%	-1.573.064	-50.744	-0,21	-0,68
01/09/2006	392,43	64.980.644	93,8%	-1.872.500	-62.417	-0,25	-0,83
01/10/2006	392,18	63.108.144	91,1%	-1.797.524	-57.985	-0,24	-0,77
01/11/2006	391,94	61.310.620	88,5%	-1.647.812	-54.927	-0,22	-0,73
01/12/2006	391,72	59.662.808	86,2%	-674.072	-21.744	-0,09	-0,29
01/01/2007	391,63	58.988.736	85,2%	-898.764	-28.992	-0,12	-0,39
01/02/2007	391,51	58.089.972	83,9%	7.564.744	270.169	1,01	3,61
01/03/2007	392,52	65.654.716	94,8%	3.520.308	113.558	0,47	1,52
01/04/2007	392,99	69.175.024	99,9%	74.976	2.499	0,13	0,43
01/05/2007	393,12	69.250.000	100,0%	-374.408	-12.078	-0,17	-0,55
01/06/2007	392,95	68.875.592	99,5%	-1.348.376	-44.946	-0,18	-0,60
01/07/2007	392,77	67.527.216	97,5%				
TOTAL ANUAL				-224.696		-0,03	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						15.370.612	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	MÉDIO (%)
365	0	28	25	1.210,8	10,14	392,35	64.333.250	92,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaIguatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Capitão Mor


MUNICÍPIO: Pedra Branca

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
6.000.000	1.460.000	97,30	90,00	90	0	113	1988

ANO: ano de construção do açude

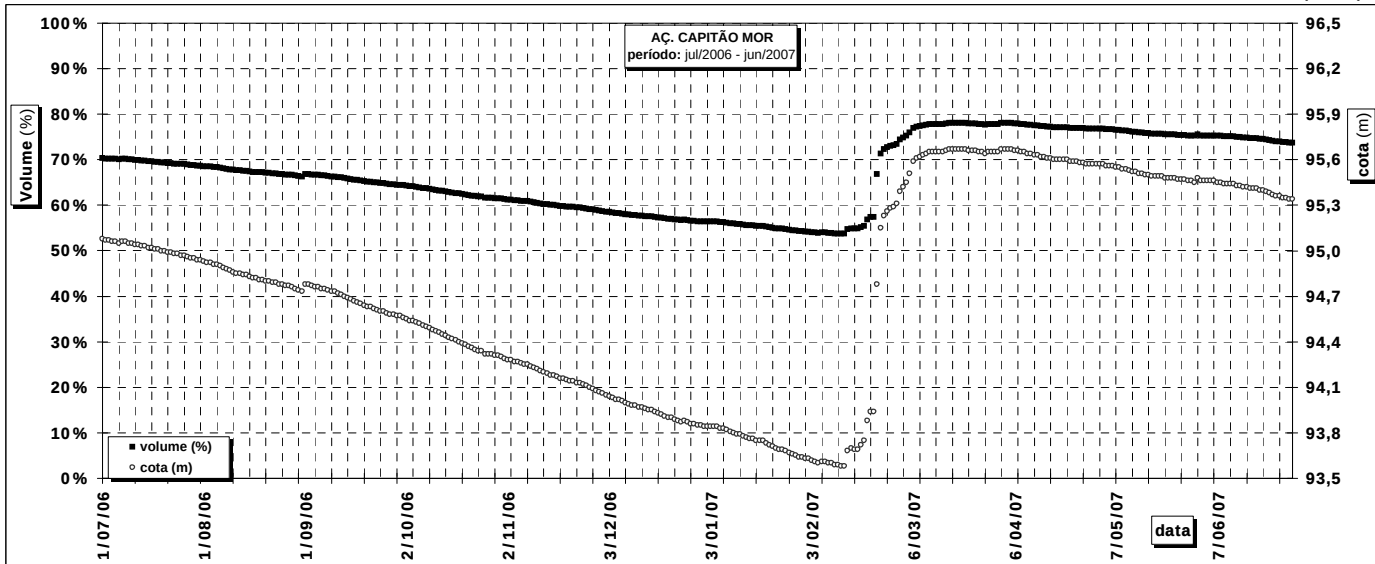

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INICIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	13/2/2007	227	95,08	93,61	1,47	0,67	4.222.402	3.238.201	984.201	52	50	2

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
13/2/2007	13/2/2007	31/5/2007	79	93,58	95,67	1.522.200	0	0	131.980	1.654.180

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
18.368	39.604	0	0	0	11.880	0	1.263.314	339.411	21.844	26.593	0	1.721.014

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	95,08	4.222.402	70,4%	-110.002	-3.548	-0,15	-0,48
01/08/2006	94,93	4.112.400	68,5%	-102.001	-3.290	-0,15	-0,48
01/09/2006	94,78	4.010.399	66,8%	-149.601	-4.987	-0,22	-0,73
01/10/2006	94,56	3.860.798	64,3%	-183.597	-5.922	-0,27	-0,87
01/11/2006	94,29	3.677.201	61,3%	-156.403	-5.213	-0,23	-0,77
01/12/2006	94,06	3.520.798	58,7%	-140.000	-4.516	-0,22	-0,71
01/01/2007	93,84	3.380.798	56,3%	-130.200	-4.200	-0,21	-0,68
01/02/2007	93,63	3.250.598	54,2%	1.151.200	41.114	1,68	6,00
01/03/2007	95,31	4.401.798	73,4%	265.203	8.555	0,34	1,10
01/04/2007	95,65	4.667.001	77,8%	-62.401	-2.080	-0,08	-0,27
01/05/2007	95,57	4.604.600	76,7%	-70.197	-2.264	-0,09	-0,29
01/06/2007	95,48	4.534.403	75,6%	-117.001	-3.900	-0,15	-0,50
01/07/2007	95,33	4.417.402	73,6%				
TOTAL ANUAL				195.000		0,25	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.764.149	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	84	1.272,5	5,65	94,75	4.014.000	66,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência: Quixeramobim

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Caracas


MUNICÍPIO: Canindé

B. HIDROGRÁFICA: Curu

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
9.630.000	3.660.800	103,00	99,32	65	0	46	1986

ANO: ano de construção do açude

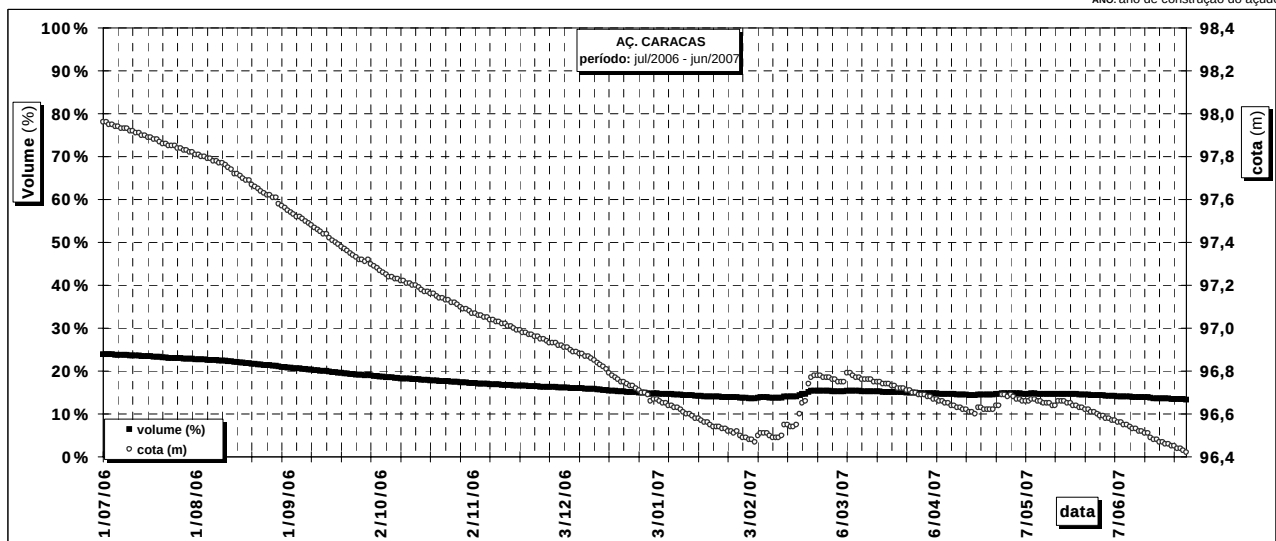

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	5/2/2007	219	97,96	96,69	1,27	0,69	2.300.799	1.429.501	871.298	55	55	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
5/2/2007		17/5/2007	59	96,47	96,79	296.995	0	0	83.758	380.753

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	12.923	0	0	0	21.456	231.403	27.922	68.808	32.692	0	395.204

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	97,96	2.300.799	23,9%	-109.501	-3.532	-0,15	-0,48
01/08/2006	97,81	2.191.298	22,8%	-189.796	-6.122	-0,26	-0,84
01/09/2006	97,55	2.001.502	20,8%	-197.103	-6.570	-0,27	-0,90
01/10/2006	97,28	1.804.399	18,7%	-145.998	-4.710	-0,20	-0,65
01/11/2006	97,08	1.658.401	17,2%	-102.402	-3.413	-0,16	-0,53
01/12/2006	96,92	1.555.999	16,2%	-142.997	-4.613	-0,26	-0,84
01/01/2007	96,66	1.413.002	14,7%	-93.503	-3.016	-0,17	-0,55
01/02/2007	96,49	1.319.499	13,7%	153.999	5.500	0,28	1,00
01/03/2007	96,77	1.473.498	15,3%	-43.997	-1.419	-0,08	-0,26
01/04/2007	96,69	1.429.501	14,8%	-5.501	-183	-0,01	-0,03
01/05/2007	96,68	1.424.000	14,8%	-49.502	-1.597	-0,09	-0,29
01/06/2007	96,59	1.374.498	14,3%	-98.996	-3.300	-0,18	-0,60
01/07/2007	96,41	1.275.502	13,2%				
TOTAL ANUAL				-1.025.297		-1,55	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.345.057	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
353	0	0	8	8.894,0	2,55	96,98	1.627.470	16,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Carão


MUNICÍPIO: Tamboril

B. HIDROGRÁFICA: Acaraú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
26.230.000	1.270.500	96,00	86,50	140	0	310	1980

ANO: ano de construção do açude

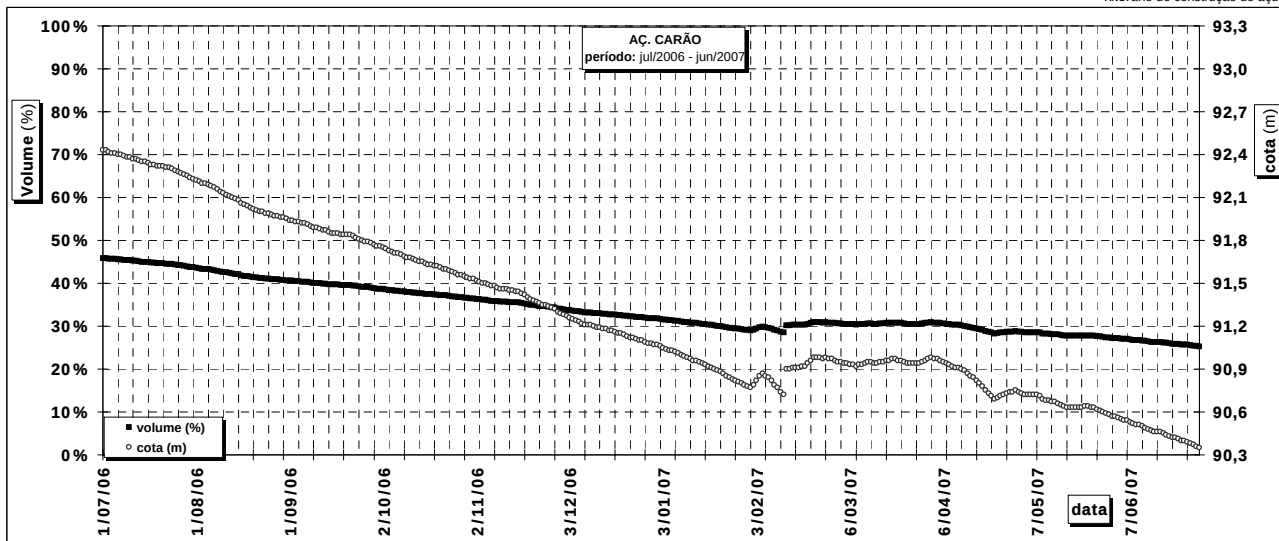

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/1/2007	214	92,43	90,78	1,65	0,77	12.025.941	7.626.397	4.399.544	237	237	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/2/2007		21/5/2007	44	90,63	90,98	1.234.915	0	0	434.057	1.668.972

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	1.072.670	358.617	204.725	45.529	0	1.681.541

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	92,43	12.025.941	45,8%	-600.178	-19,361	-0,21	-0,68
01/08/2006	92,22	11.425.763	43,6%	-788.237	-25,427	-0,28	-0,90
01/09/2006	91,94	10.637.526	40,6%	-478.440	-15,948	-0,18	-0,60
01/10/2006	91,76	10.159.086	38,7%	-611.349	-19,721	-0,23	-0,74
01/11/2006	91,53	9.547.737	36,4%	-664.500	-22,150	-0,25	-0,83
01/12/2006	91,28	8.883.237	33,9%	-558.178	-18,006	-0,21	-0,68
01/01/2007	91,07	8.325.059	31,7%	-721.967	-23,289	-0,30	-0,97
01/02/2007	90,77	7.603.092	29,0%	442.706	15,811	0,19	0,68
01/03/2007	90,96	8.045.798	30,7%	23.305	752	0,01	0,03
01/04/2007	90,97	8.069.103	30,8%	-535.908	-17,864	-0,23	-0,77
01/05/2007	90,74	7.533.195	28,7%	-396.095	-12,777	-0,17	-0,55
01/06/2007	90,57	7.137.100	27,2%	-535.908	-17,864	-0,23	-0,77
01/07/2007	90,34	6.601.192	25,2%				
TOTAL ANUAL				-5.424.749		-2,09	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						7.611.628	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
103	0	0	18	5.693,6	3,43	91,27	8.918.200	34,0%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrateús

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Carmina


MUNICÍPIO: Catunda

B. HIDROGRÁFICA: Acaraú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
13.628.000	63.960	280,00	267,00	100	0	194	2003

ANO: ano de construção do açude

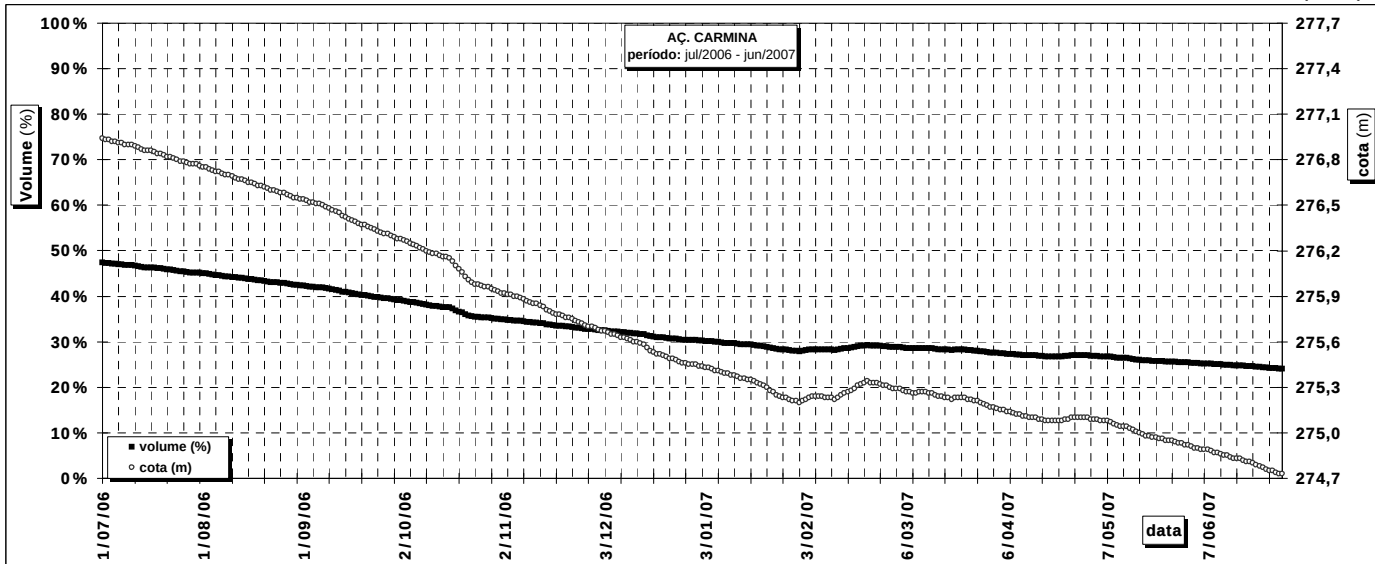

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/1/2007	214	276,94	275,21	1,73	0,81	6.450.614	3.817.272	2.633.342	142	142	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/2/2007		23/4/2007	27	275,08	275,34	249.627	0	0	132.180	381.807

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	311.691	48.425	47.724	0	0	407.840

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	276,94	6.450.614	47,3%	-322.448	-10.402	-0,19	-0,61
01/08/2006	276,75	6.128.166	45,0%	-356.371	-11.496	-0,21	-0,68
01/09/2006	276,54	5.771.795	42,4%	-441.255	-14.709	-0,26	-0,87
01/10/2006	276,28	5.330.540	39,1%	-580.283	-18.719	-0,36	-1,16
01/11/2006	275,92	4.750.257	34,9%	-315.393	-10.513	-0,24	-0,80
01/12/2006	275,68	4.434.864	32,5%	-315.353	-10.173	-0,24	-0,77
01/01/2007	275,44	4.119.511	30,2%	-315.352	-10.173	-0,24	-0,77
01/02/2007	275,20	3.804.159	27,9%	131.370	4.692	0,10	0,36
01/03/2007	275,30	3.935.529	28,9%	-170.789	-5.509	-0,13	-0,42
01/04/2007	275,17	3.764.740	27,6%	-91.992	-3.066	-0,07	-0,23
01/05/2007	275,10	3.672.748	27,0%	-207.926	-6.707	-0,18	-0,58
01/06/2007	274,92	3.464.822	25,4%	-181.759	-6.059	-0,19	-0,63
01/07/2007	274,73	3.283.063	24,1%				
TOTAL ANUAL				-3.167.551		-2,21	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						4.226.972	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO	
							(m³)	(%)
104	0	0	1	12.196,5	3,28	275,69	4.510.868	33,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência: Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Carnaubal


MUNICÍPIO: Crateús

B. HIDROGRÁFICA: Parnaíba

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
87.690.000	7.600.000	300,00	291,00	200	663	2.068	1990

ANO: ano de construção do açude

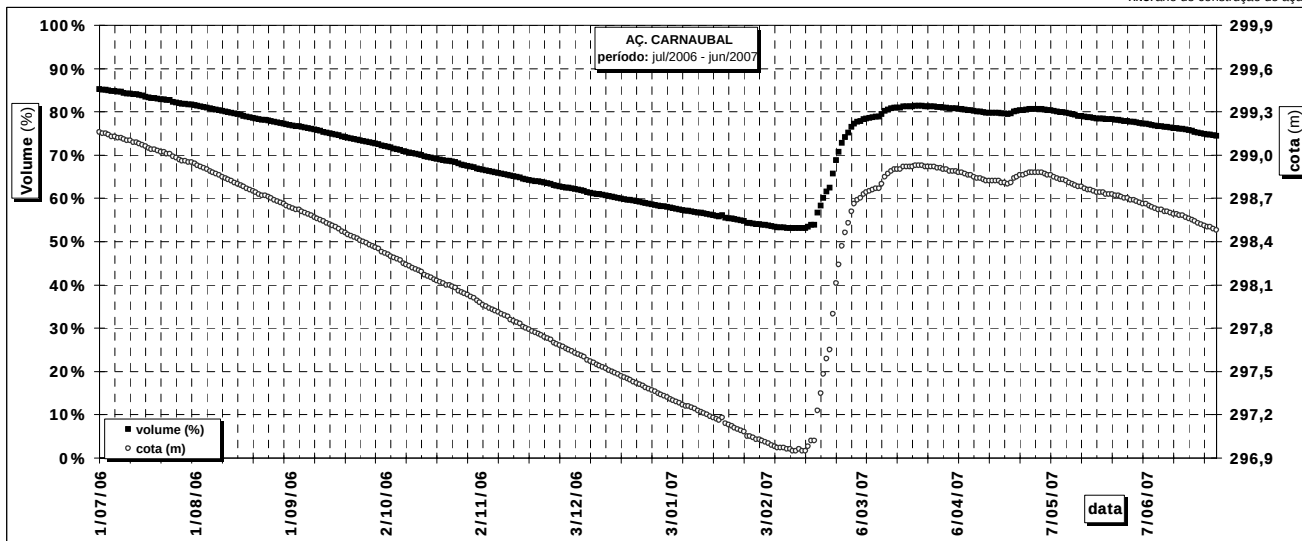

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	14/2/2007	228	299,16	296,96	2,20	0,96	74.762.456	46.633.912	28.128.544	1.427	1.427	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
15/2/2007	15/2/2007	29/4/2007	60	296,95	298,93	25.902.512	289.948	0	2.450.454	28.642.914

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	331.415	19.768.766	7.608.089	1.584.332	0	0	29.292.602

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	299,16	74.762.456	85,3%	-3.272.424	-105.562	-0,22	-0,71
01/08/2006	298,94	71.490.032	81,5%	-4.049.832	-130.640	-0,30	-0,97
01/09/2006	298,64	67.440.200	76,9%	-4.185.380	-139.513	-0,31	-1,03
01/10/2006	298,33	63.254.820	72,1%	-4.572.536	-147.501	-0,34	-1,10
01/11/2006	297,99	58.682.284	66,9%	-3.998.356	-133.279	-0,34	-1,13
01/12/2006	297,65	54.683.928	62,4%	-3.763.284	-121.396	-0,32	-1,03
01/01/2007	297,33	50.920.644	58,1%	-3.527.860	-113.802	-0,30	-0,97
01/02/2007	297,03	47.392.784	54,0%	-17.617.100	629.182	1,43	5,11
01/03/2007	298,46	65.009.884	74,1%	6.075.164	195.973	0,45	1,45
01/04/2007	298,91	71.085.048	81,1%	-404.984	-13.499	-0,03	-0,10
01/05/2007	298,88	70.680.064	80,6%	-2.429.896	-78.384	-0,18	-0,58
01/06/2007	298,70	68.250.168	77,8%	-3.105.152	-103.505	-0,23	-0,77
01/07/2007	298,47	65.145.016	74,3%				
TOTAL ANUAL				-9.617.440		-0,69	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						37.663.376	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	25	1.092,7	4,77	298,28	62.961.420	71,8%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrateús

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Castanhão


MUNICÍPIO: Alto Santo

B. HIDROGRÁFICA: Médio Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
6.700.000.000	57.500.000	106,00	56,50	153	30.397	45.310	2002

ANO: ano de construção do açude

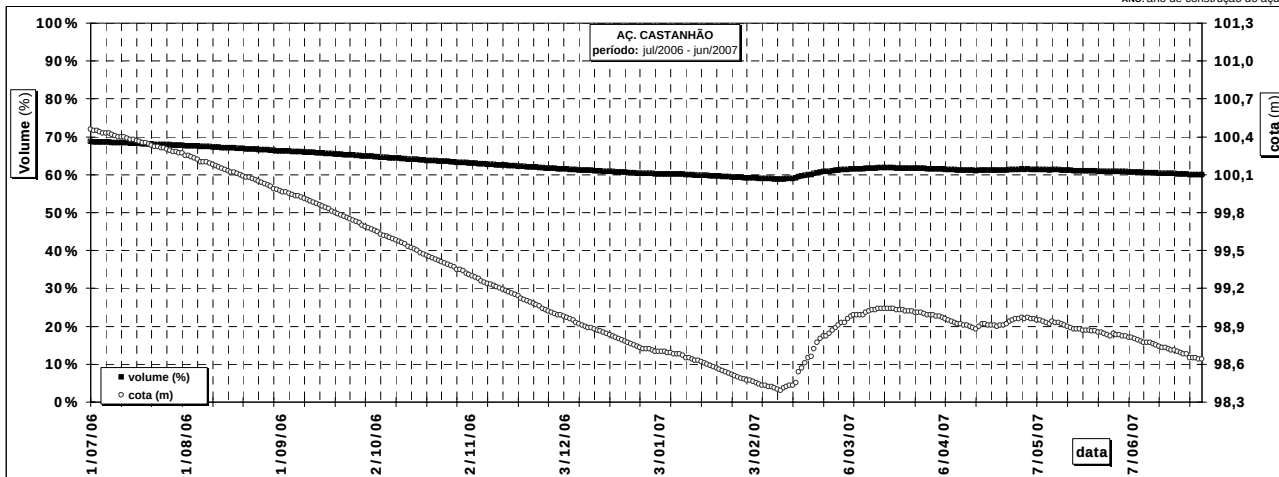

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO	COTA FIM	REDUÇÃO COTA	REDUÇÃO MÉDIA COTA	VOLUME INÍCIO	VOLUME FIM	REDUÇÃO VOLUME	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO	VAZÃO MÉDIA EVAPOR.	VAZÃO RESIDUAL
			(m)	(m)	(m)	(cm/dia)	(m³)	(m³)	(m³)	(L/s)	(L/s)	(L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	100,46	98,40	2,06	0,92	4.601.600.512	3.940.760.576	660.839.936	33.993	28.325	5.668

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA	COTA MÁXIMA	VOLUME ACRESC.	VOLUME LIBER.	VOLUME SANGR.	VOLUME EVAPOR.	APORTE D'ÁGUA TOTAL
				(m)	(m)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
12/2/2007	12/2/2007	31/5/2007	72	98,39	99,04	250.542.848	29.635.200	0	52.357.670	332.535.718

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	187.709.194	73.429.663	46.768.205	24.628.656	0	332.535.718

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	100,46	4.601.600.512	68,7%	-70.135.296	-2.262.429	-0,21	-0,68
01/08/2006	100,25	4.531.465.216	67,6%	-93.274.624	-3.008.859	-0,28	-0,90
01/09/2006	99,97	4.438.190.592	66,2%	-97.801.216	-3.260.041	-0,30	-1,00
01/10/2006	99,67	4.340.389.376	64,8%	-112.663.040	-3.634.292	-0,35	-1,13
01/11/2006	99,32	4.227.726.336	63,1%	-104.867.072	-3.495.569	-0,33	-1,10
01/12/2006	98,99	4.122.859.264	61,5%	-86.799.616	-2.799.988	-0,28	-0,90
01/01/2007	98,71	4.036.059.648	60,2%	-74.159.360	-2.392.237	-0,24	-0,77
01/02/2007	98,47	3.961.900.288	59,1%	-123.760.640	-4.420.023	0,40	1,43
01/03/2007	98,87	4.085.660.928	61,0%	37.198.336	1.199.946	0,12	0,39
01/04/2007	98,99	4.122.859.264	61,5%	-9.299.456	-309.982	-0,03	-0,10
01/05/2007	98,96	4.113.559.808	61,4%	-37.200.896	-1.200.029	-0,12	-0,39
01/06/2007	98,84	4.076.358.912	60,8%	-65.099.776	-2.169.993	-0,21	-0,70
01/07/2007	98,63	4.011.259.136	59,9%				
TOTAL ANUAL				-590.341.376		-1,83	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)							682.278.400

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRESC.	TEMPO DE RESID.	PROFUND. MÉDIA	COTA MÉDIA	V. ARMAZ. MÉDIO	
			(cm/dia)	(dias)	(m)	(m)	(m³)	(%)
365	0	0	9	7.354,1	13,64	99,22	4.200.900.000	62,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência: Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇÚDE: Castro


MUNICÍPIO: Itapiúna

B. HIDROGRÁFICA: Metropolitanas

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
63.900.000	4.028.000	151,50	137,00	80	0	354	1997

ANO: ano de construção do açude

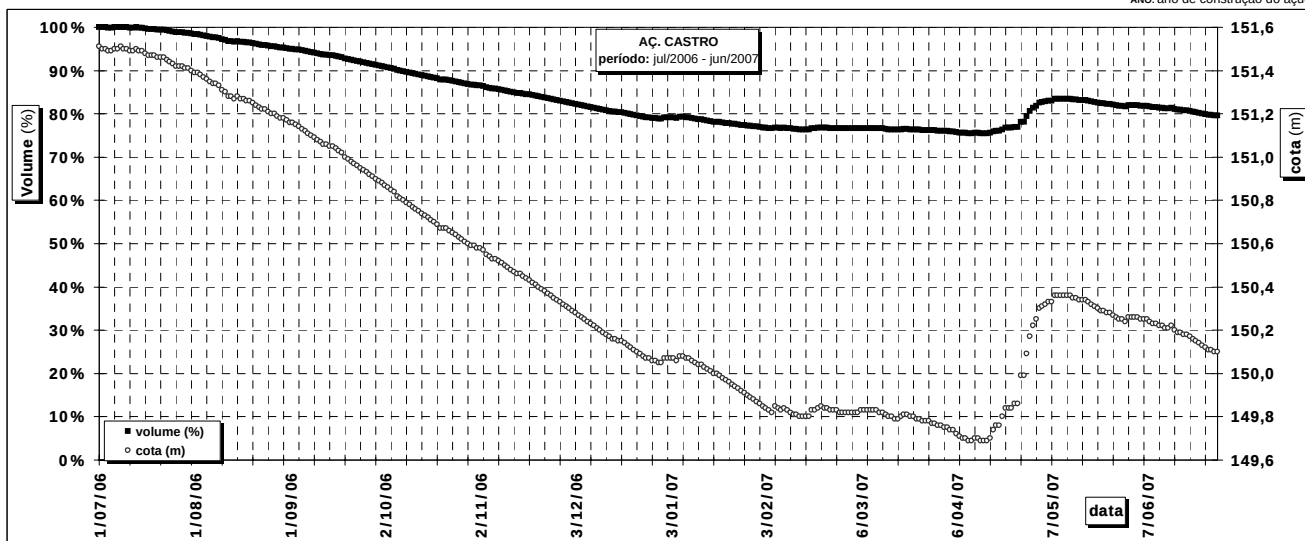

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	4/1/2007	187	151,51	150,07	1,44	0,77	63.900.000	50.572.468	13.327.532	824	797	27

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
5/1/2007	17/4/2007	14/6/2007	74	149,69	150,36	6.237.500	609.120	0	1.193.457	8.040.077

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
702.484	158.418	0	0	0	323.364	299.348	823.084	416.938	4.507.901	1.782.040	171.450	9.185.027

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	151,51	63.900.000	100,0%	-1.025.204	-33.071	-0,12	-0,39
01/08/2006	151,39	62.874.796	98,4%	-2.143.560	-69.147	-0,23	-0,74
01/09/2006	151,16	60.731.236	95,0%	-2.609.592	-86.986	-0,28	-0,93
01/10/2006	150,88	58.121.644	91,0%	-2.796.028	-90.194	-0,30	-0,97
01/11/2006	150,58	55.325.616	86,6%	-2.609.588	-86.986	-0,28	-0,93
01/12/2006	150,30	52.716.028	82,5%	-2.143.560	-69.147	-0,23	-0,74
01/01/2007	150,07	50.572.468	79,1%	-1.421.344	-45.850	-0,21	-0,68
01/02/2007	149,86	49.151.124	76,9%	-219.644	-7.844	-0,04	-0,14
01/03/2007	149,82	48.931.480	76,6%	-329.592	-10.632	-0,06	-0,19
01/04/2007	149,76	48.601.888	76,1%	3.368.524	112.284	0,46	1,53
01/05/2007	150,22	51.970.412	81,3%	372.736	12.024	0,04	0,13
01/06/2007	150,26	52.343.148	81,9%	-1.584.384	-52.813	-0,17	-0,57
01/07/2007	150,09	50.758.764	79,4%				
TOTAL ANUAL				-13.141.236		-1,42	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						15.764.677	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	MÉDIO (%)
365	0	0	13	2.539,3	7,22	150,43	54.059.400	84,6%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência GEMET

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Catucinzenta


MUNICÍPIO: Aquiraz

B. HIDROGRÁFICA: Metropolitanas

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
27.130.000	5.628.603	45,00	39,22	50	0	63	2002

ANO: ano de construção do açude

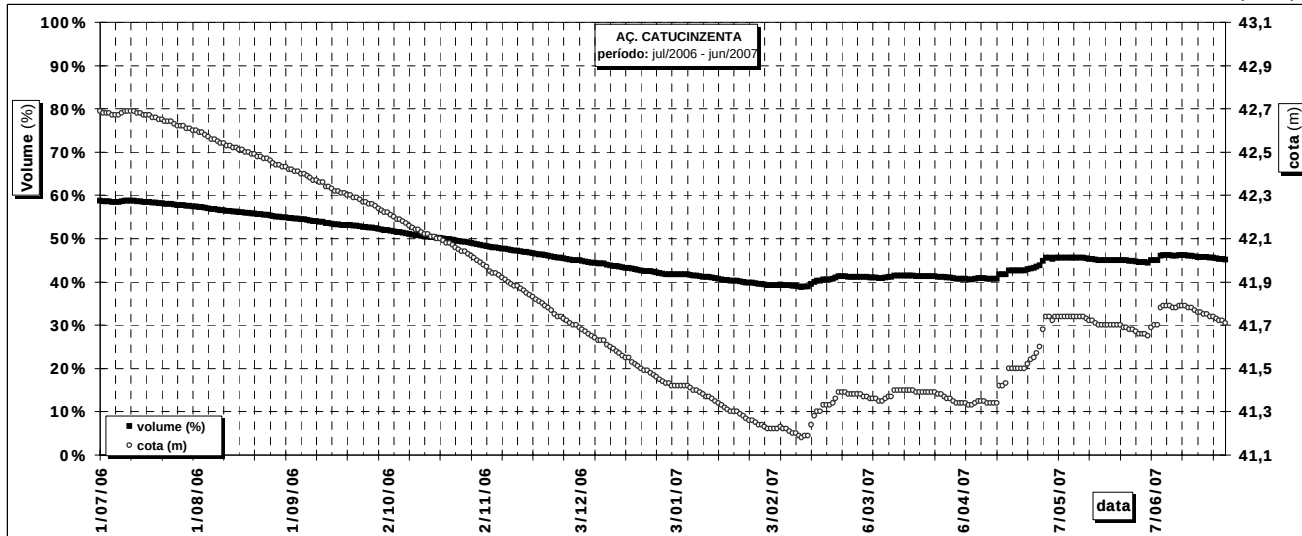

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	12/2/2007	226	42,69	41,19	1,50	0,66	15.932.395	10.551.296	5.381.099	275	199	76

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
13/2/2007	13/2/2007	14/6/2007	98	41,18	41,79	2.779.507	414.720	0	432.025	3.626.252

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
141.329	0	0	0	0	0	0	1.008.101	259.841	1.178.437	603.998	666.423	3.858.129

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	42,69	15.932.395	58,7%	-356.401	-11.497	-0,09	-0,29
01/08/2006	42,60	15.575.994	57,4%	-712.801	-22.994	-0,18	-0,58
01/09/2006	42,42	14.863.193	54,8%	-791.988	-26.400	-0,20	-0,67
01/10/2006	42,22	14.071.205	51,9%	-903.900	-29.158	-0,23	-0,74
01/11/2006	41,99	13.167.305	48,5%	-948.303	-31.610	-0,29	-0,97
01/12/2006	41,70	12.219.002	45,0%	-882.901	-28.481	-0,27	-0,87
01/01/2007	41,43	11.336.101	41,8%	-654.002	-21.097	-0,20	-0,65
01/02/2007	41,23	10.682.099	39,4%	490.504	17.518	0,15	0,54
01/03/2007	41,38	11.172.603	41,2%	-65.401	-2.110	-0,02	-0,06
01/04/2007	41,36	11.107.202	40,9%	784.793	26.160	0,24	0,80
01/05/2007	41,60	11.891.995	43,8%	228.899	7.384	0,07	0,23
01/06/2007	41,67	12.120.894	44,7%	130.803	4.360	0,04	0,13
01/07/2007	41,71	12.251.697	45,2%				
TOTAL ANUAL				-3.680.698		-0,98	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						5.181.170	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	8	2.566,6	3,62	41,83	12.723.970	46,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência GEMET

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Cauhipe


MUNICÍPIO: Caucaia

B. HIDROGRÁFICA: Metropolitanas

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
12.000.000	874.576	36,89	31,50	120	0	93	1999

ANO: ano de construção do açude

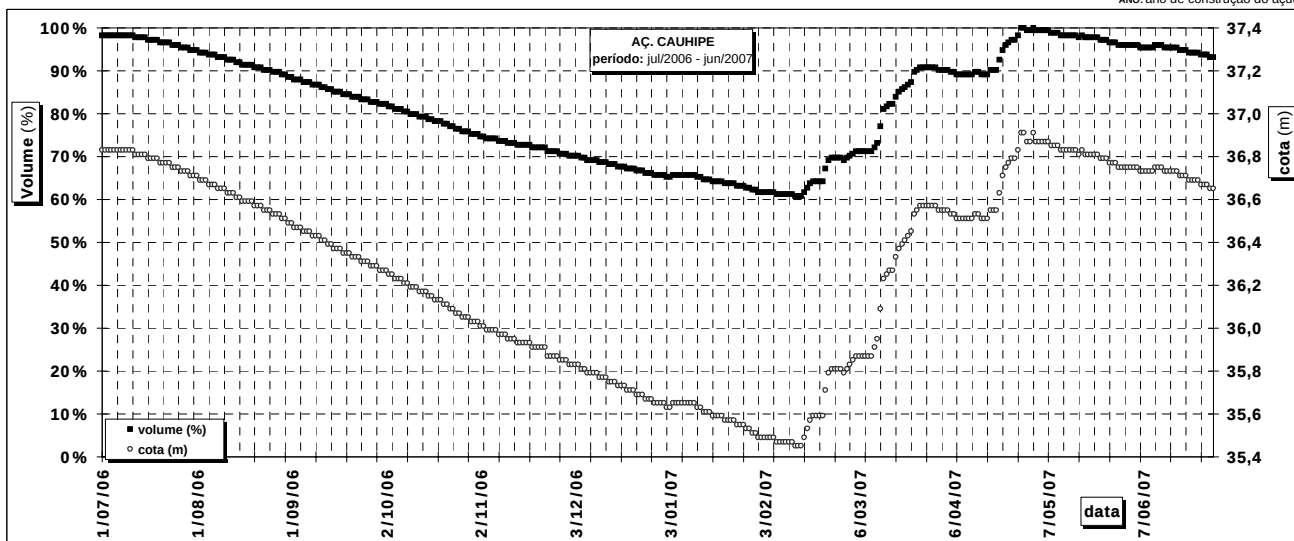

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	1/1/2007	184	36,83	35,65	1,18	0,64	11.792.903	7.880.404	3.912.499	246	196	50

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
2/1/2007	15/2/2007	10/6/2007	134	35,45	36,91	5.321.188	0	80.784	559.011	5.960.983

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	95.836	1.192.525	2.781.913	1.610.729	186.916	105.116	5.973.035

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	36,83	11.792.903	98,3%	-414.216	-13.362	-0,12	-0,39
01/08/2006	36,71	11.378.687	94,8%	-759.369	-24.496	-0,22	-0,71
01/09/2006	36,49	10.619.318	88,5%	-759.382	-25.313	-0,22	-0,73
01/10/2006	36,27	9.859.936	82,2%	-828.419	-26.723	-0,24	-0,77
01/11/2006	36,03	9.031.517	75,3%	-612.362	-20.412	-0,20	-0,67
01/12/2006	35,83	8.419.155	70,2%	-538.751	-17.379	-0,18	-0,58
01/01/2007	35,65	7.880.404	65,7%	-478.889	-15.448	-0,16	-0,52
01/02/2007	35,49	7.401.515	61,7%	897.916	32.068	0,30	1,07
01/03/2007	35,79	8.299.431	69,2%	2.526.982	81.516	0,76	2,45
01/04/2007	36,55	10.826.413	90,2%	1.104.549	36.818	0,32	1,07
01/05/2007	36,87	11.930.962	99,4%	-414.203	-13.361	-0,12	-0,39
01/06/2007	36,75	11.516.759	96,0%	-345.166	-11.506	-0,10	-0,33
01/07/2007	36,65	11.171.593	93,1%				
TOTAL ANUAL				-621.310		-0,18	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						5.075.127	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	3	14	733,3	2,80	36,26	9.888.000	82,4%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência GEMET

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Caxitoré


MUNICÍPIO: Umirim

B. HIDROGRÁFICA: Curu

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
202.000.000	7.000.000	73,00	55,00	152	393	1.253	1962

ANO: ano de construção do açude

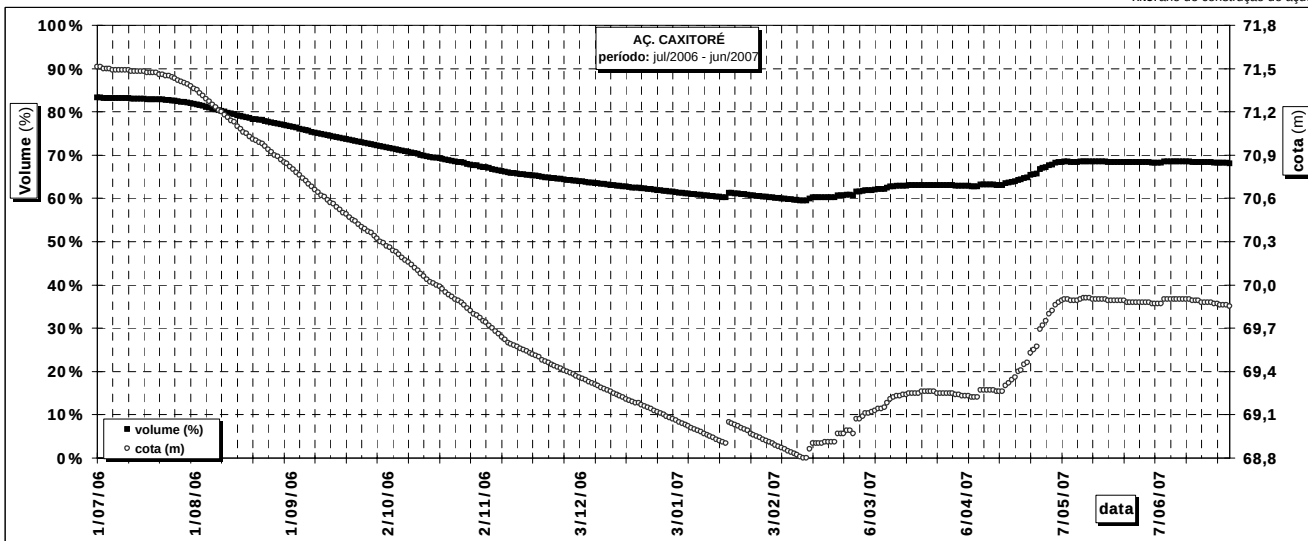

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	19/1/2007	202	71,51	68,81	2,70	1,19	168.200.048	120.149.960	48.050.088	2.460	1.292	1.168

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
20/1/2007	13/2/2007	8/6/2007	104	68,80	69,91	20.299.920	1.369.440	0	3.553.664	25.223.024

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	2.523.872	4.482.288	6.203.574	9.744.037	4.132.943	735.439	27.822.153

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	71,51	168.200.048	83,3%	-3.000.032	-96.775	-0,15	-0,48
01/08/2006	71,36	165.200.016	81,8%	-10.440.016	-336.775	-0,54	-1,74
01/09/2006	70,82	154.760.000	76,6%	-9.539.984	-317.999	-0,53	-1,77
01/10/2006	70,29	145.220.016	71,9%	-9.130.080	-294.519	-0,52	-1,68
01/11/2006	69,77	136.089.936	67,4%	-6.629.984	-220.999	-0,39	-1,30
01/12/2006	69,38	129.459.952	64,1%	-5.099.920	-164.514	-0,30	-0,97
01/01/2007	69,08	124.360.032	61,6%	-2.560.056	-82.582	-0,16	-0,52
01/02/2007	68,92	121.799.976	60,3%	750.040	26.787	0,05	0,18
01/03/2007	68,97	122.550.016	60,7%	4.699.984	151.612	0,28	0,90
01/04/2007	69,25	127.250.000	63,0%	7.990.016	266.334	0,47	1,57
01/05/2007	69,72	135.240.016	67,0%	2.719.936	87.740	0,16	0,52
01/06/2007	69,88	137.959.952	68,3%	-849.920	-28.331	-0,05	-0,17
01/07/2007	69,83	137.110.032	67,9%				
TOTAL ANUAL				-31.090.016		-1,68	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						33.161.034	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	12	2.650,0	7,74	69,85	137.764.000	68,2%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Cedro


MUNICÍPIO: Quixadá

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
126.000.000	990.000	114,50	100,50	91	0	215	1906

ANO: ano de construção do açude

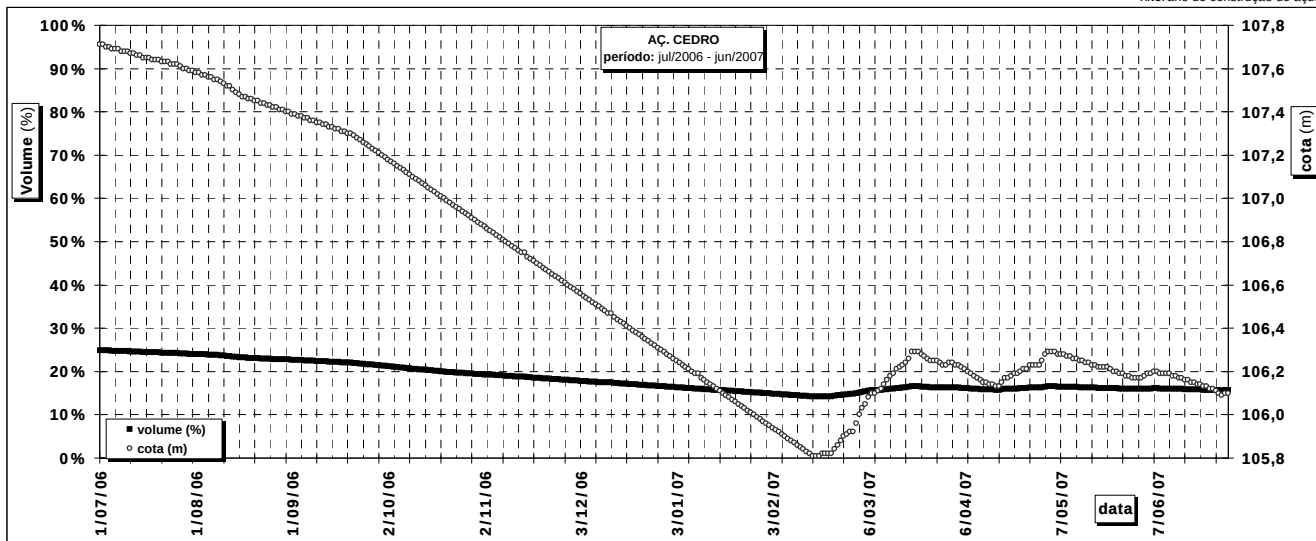

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	15/2/2007	229	107,71	105,82	1,89	0,83	31.329.592	17.972.798	13.356.794	675	575	100

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
16/2/2007		28/6/2007	92	105,81	106,29	4.172.616	75.168	0	1.323.386	5.571.170

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	999.578	2.788.461	1.050.717	297.284	435.639	5.571.679

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	107,71	31.329.592	24,9%	-1.138.776	-36.735	-0,13	-0,42
01/08/2006	107,58	30.190.816	24,0%	-1.664.422	-53.691	-0,19	-0,61
01/09/2006	107,39	28.526.394	22,6%	-1.751.972	-58.399	-0,20	-0,67
01/10/2006	107,19	26.774.422	21,2%	-2.390.438	-77.111	-0,31	-1,00
01/11/2006	106,88	24.383.984	19,4%	-1.814.972	-60.499	-0,30	-1,00
01/12/2006	106,58	22.569.012	17,9%	-1.875.532	-60.501	-0,31	-1,00
01/01/2007	106,27	20.693.480	16,4%	-1.875.086	-60.487	-0,31	-1,00
01/02/2007	105,96	18.818.394	14,9%	-241.606	-8.629	-0,04	-0,14
01/03/2007	105,92	18.576.788	14,7%	1.935.200	62.426	0,32	1,03
01/04/2007	106,24	20.511.988	16,3%	60.512	2.017	0,01	0,03
01/05/2007	106,25	20.572.500	16,3%	-484.012	-15.613	-0,08	-0,26
01/06/2007	106,17	20.088.488	15,9%	-423.498	-14.117	-0,07	-0,23
01/07/2007	106,10	19.664.990	15,6%				
TOTAL ANUAL				-11.664.602		-1,61	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)				14.828.141			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	4	8.254,2	3,31	106,62	23.184.000	18,4%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Quixeramobim

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Cipoadá


MUNICÍPIO: Morada Nova

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
86.090.000	4.527.993	103,00	92,20	150	0	352	1992

ANO: ano de construção do açude

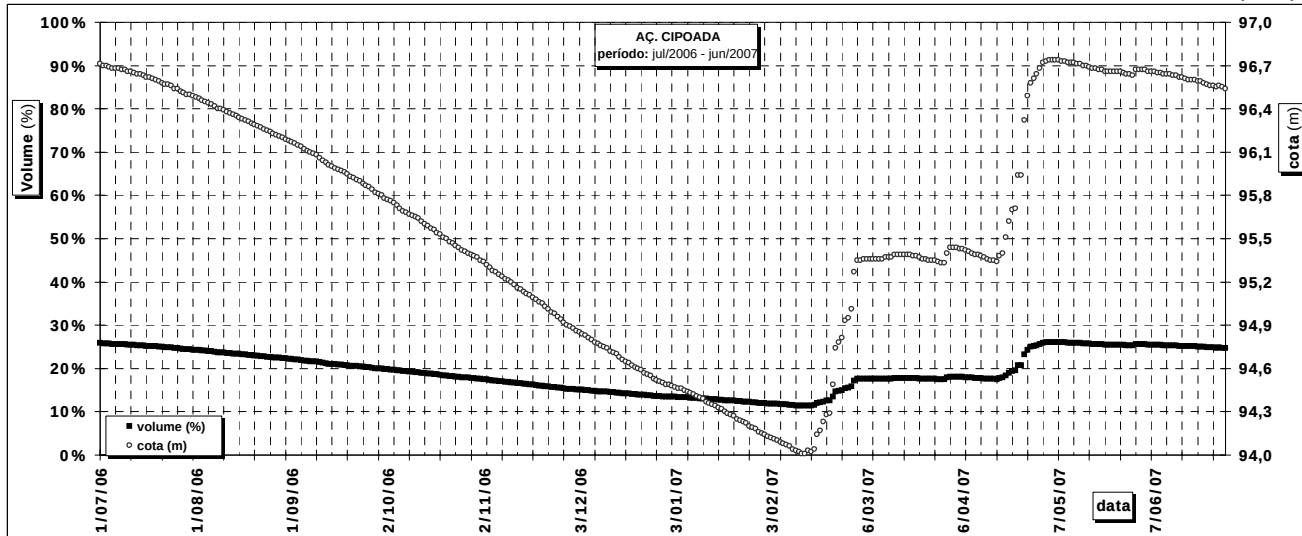

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	15/2/2007	229	96,71	94,03	2,68	1,17	22.237.694	9.863.695	12.373.999	625	403	222

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
16/2/2007	16/2/2007	27/6/2007	92	94,02	96,74	13.606.292	301.536	0	799.126	14.706.954

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	4.297.040	2.244.213	7.497.206	700.594	86.777	14.825.830

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	96,71	22.237.694	25,8%	-1.350.074	-43.551	-0,23	-0,74
01/08/2006	96,48	20.887.620	24,3%	-1.819.730	-58.701	-0,31	-1,00
01/09/2006	96,17	19.067.890	22,1%	-1.994.496	-66.483	-0,39	-1,30
01/10/2006	95,78	17.073.394	19,8%	-1.947.901	-62.836	-0,43	-1,39
01/11/2006	95,35	15.125.493	17,6%	-2.040.303	-68.010	-0,47	-1,57
01/12/2006	94,88	13.085.190	15,2%	-1.478.098	-47.681	-0,39	-1,26
01/01/2007	94,49	11.607.092	13,5%	-1.326.494	-42.790	-0,35	-1,13
01/02/2007	94,14	10.280.598	11,9%	-3.304.712	-118.025	0,87	3,11
01/03/2007	95,01	13.585.310	15,8%	1.766.697	56.990	0,39	1,26
01/04/2007	95,40	15.352.007	17,8%	6.709.595	223.653	1,28	4,27
01/05/2007	96,68	22.061.602	25,6%	-58.712	-1.894	-0,01	-0,03
01/06/2007	96,67	22.002.890	25,6%	-763.084	-25.436	-0,13	-0,43
01/07/2007	96,54	21.239.806	24,7%				
TOTAL ANUAL				-997.888		-0,17	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						10.465.113	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	38	2.119,5	3,40	95,61	16.701.460	19,4%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Colina


MUNICÍPIO: Quiterianópolis

B. HIDROGRÁFICA: Parnaíba

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
3.250.000	480.000	98,00	94,00	73	0	363	1988

ANO: ano de construção do açude

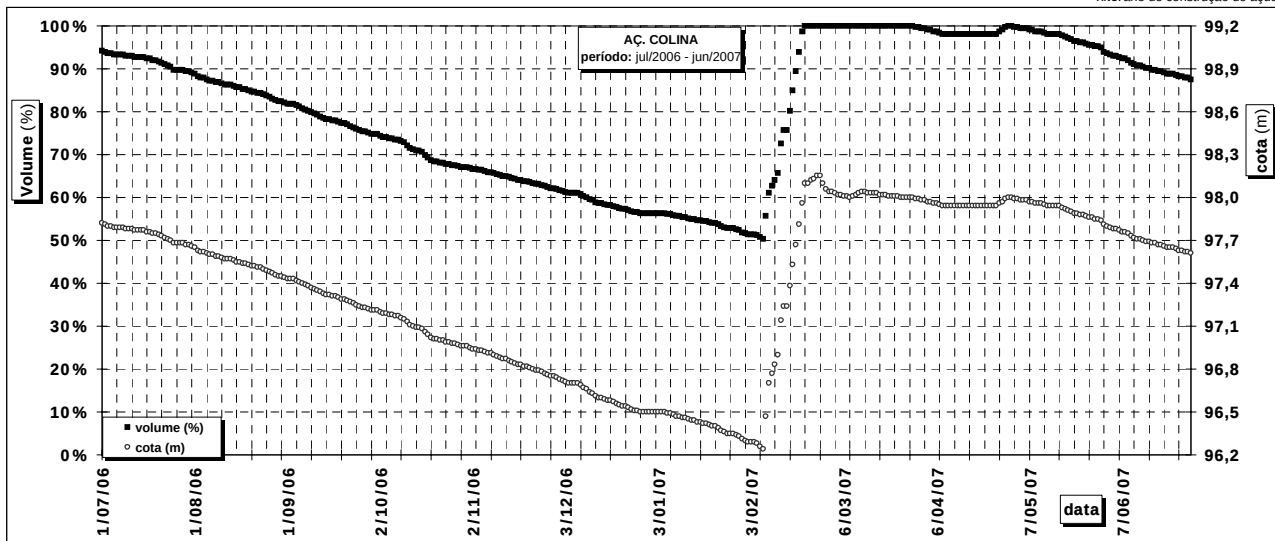

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	6/2/2007	220	97,82	96,26	1,56	0,71	3.062.800	1.647.602	1.415.198	74	74	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
7/2/2007	7/2/2007	30/4/2007	54	96,24	98,15	1.679.999	0	4.122.822	428.190	6.231.011

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	4.963.287	1.013.576	105.540	0	0	6.082.403

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	97,82	3.062.800	94,2%	-176.798	-5.703	-0,17	-0,55
01/08/2006	97,65	2.886.002	88,8%	-228.802	-7.381	-0,22	-0,71
01/09/2006	97,43	2.657.200	81,8%	-228.801	-7.627	-0,22	-0,73
01/10/2006	97,21	2.428.399	74,7%	-256.401	-8.271	-0,26	-0,84
01/11/2006	96,95	2.171.998	66,8%	-167.195	-5.573	-0,22	-0,73
01/12/2006	96,73	2.004.803	61,7%	-174.803	-5.639	-0,23	-0,74
01/01/2007	96,50	1.830.000	56,3%	-151.998	-4.903	-0,20	-0,65
01/02/2007	96,30	1.678.002	51,6%	1.571.998	56.143	1,74	6,21
01/03/2007	98,04	3.250.000	100,0%	-20.796	-671	-0,06	-0,19
01/04/2007	97,98	3.229.204	99,4%	20.796	693	0,02	0,07
01/05/2007	98,00	3.250.000	100,0%	-197.602	-6.374	-0,19	-0,61
01/06/2007	97,81	3.052.398	93,9%	-218.399	-7.280	-0,21	-0,70
01/07/2007	97,60	2.833.999	87,2%				
TOTAL ANUAL				-228.801		-0,22	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						4.017.693	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
100	0	31	24	195,0	1,60	97,37	2.619.500	80,6%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Cupim


MUNICÍPIO: Independência

B. HIDROGRÁFICA: Parnaíba

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
4.550.000		98,00		102	0	223	1970

ANO: ano de construção do açude

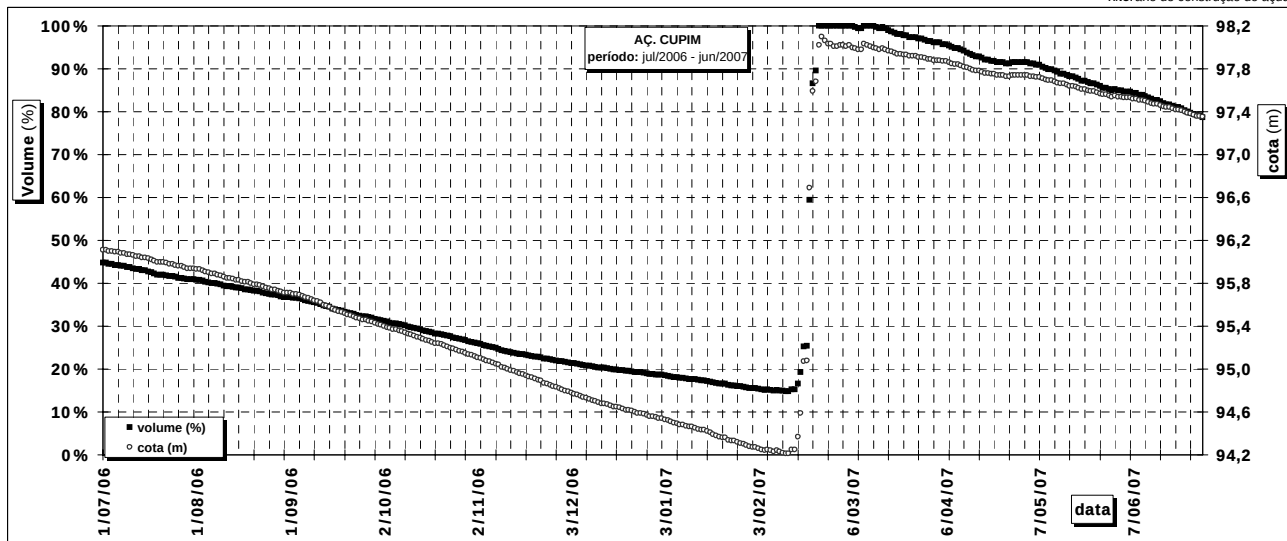

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	96,11	94,22	1,89	0,84	2.036.501	676.601	1.359.900	69	69	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	31/5/2007	53	94,21	98,10	3.953.183	0	1.097.154	189.209	5.239.546

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	4.833.704	354.970	32.941	19.565	0	5.241.180

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	96,11	2.036.501	44,8%	-183.901	-5.932	-0,18	-0,58
01/08/2006	95,93	1.852.600	40,7%	-180.401	-5.819	-0,22	-0,71
01/09/2006	95,71	1.672.199	36,8%	-245.996	-8.200	-0,30	-1,00
01/10/2006	95,41	1.426.203	31,3%	-237.801	-7.671	-0,29	-0,94
01/11/2006	95,12	1.188.402	26,1%	-204.400	-6.813	-0,32	-1,07
01/12/2006	94,80	984.002	21,6%	-137.801	-4.445	-0,26	-0,84
01/01/2007	94,54	846.201	18,6%	-143.103	-4.616	-0,27	-0,87
01/02/2007	94,27	703.098	15,5%	3.846.902	137.389	3,74	13,36
01/03/2007	98,01	4.550.000	100,0%	-163.901	-5.287	-0,12	-0,39
01/04/2007	97,89	4.386.099	96,4%	-223.502	-7.450	-0,15	-0,50
01/05/2007	97,74	4.162.597	91,5%	-283.092	-9.132	-0,19	-0,61
01/06/2007	97,55	3.879.505	85,3%	-312.910	-10.430	-0,21	-0,70
01/07/2007	97,34	3.566.595	78,4%				
TOTAL ANUAL				1.530.094		1,23	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						2.588.899	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³) (%)
333	0	14	161	316,9	2,06	96,09	2.311.400 50,8%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCratéus

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Desterro


MUNICÍPIO: Caridade

B. HIDROGRÁFICA: Curu

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
5.010.000		998,70		73	0	42	1956

ANO: ano de construção do açude

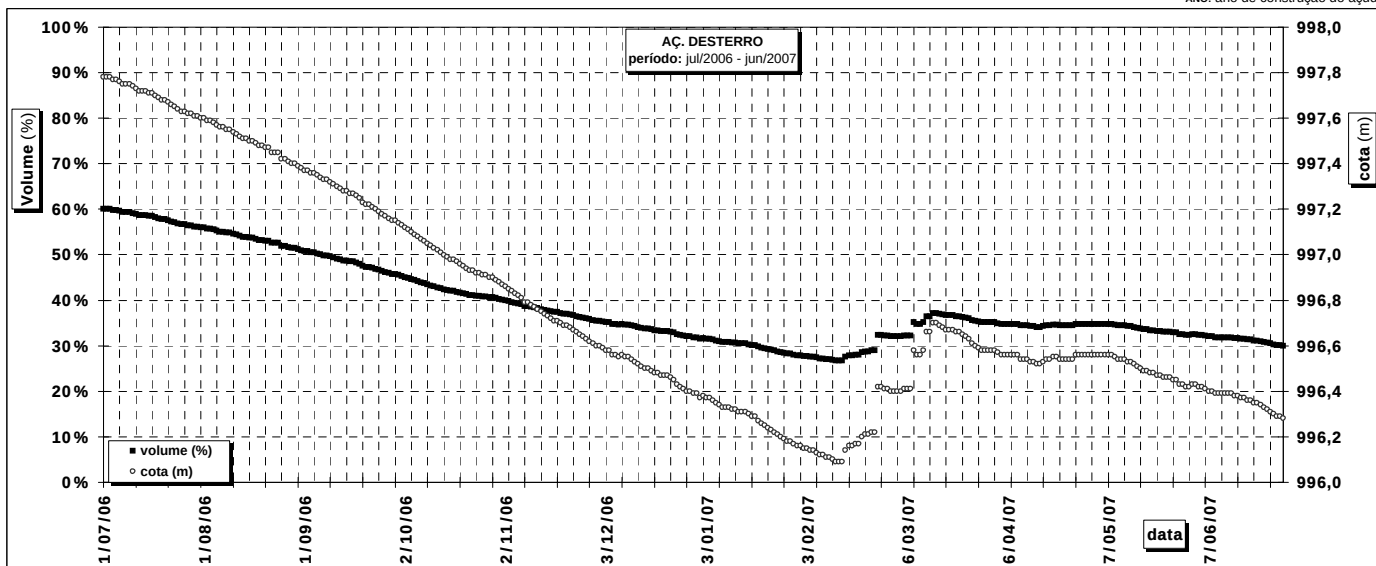

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	997,78	996,10	1,68	0,75	3.007.893	1.345.179	1.662.714	85	71	14

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	1/6/2007	76	996,09	996,70	611.988	0	0	100.164	712.152

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	14.436	13.028	329.247	302.961	66.125	0	14.485	740.282

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	997,78	3.007.893	60,0%	-204.721	-6.604	-0,18	-0,58
01/08/2006	997,60	2.803.172	56,0%	-261.487	-8.435	-0,23	-0,74
01/09/2006	997,37	2.541.685	50,7%	-272.869	-9.096	-0,24	-0,80
01/10/2006	997,13	2.268.816	45,3%	-259.880	-8.383	-0,26	-0,84
01/11/2006	996,87	2.008.936	40,1%	-232.757	-7.759	-0,27	-0,90
01/12/2006	996,60	1.776.179	35,5%	-198.243	-6.395	-0,23	-0,74
01/01/2007	996,37	1.577.936	31,5%	-181.039	-5.840	-0,21	-0,68
01/02/2007	996,16	1.396.897	27,9%	-206.924	-7.390	0,24	0,86
01/03/2007	996,40	1.603.821	32,0%	-155.154	-5.005	0,18	0,58
01/04/2007	996,58	1.758.975	35,1%	-17.257	-575	-0,02	-0,07
01/05/2007	996,56	1.741.718	34,8%	-120.693	-3.893	-0,14	-0,45
01/06/2007	996,42	1.621.025	32,4%	-129.268	-4.309	-0,15	-0,50
01/07/2007	996,27	1.491.757	29,8%				
TOTAL ANUAL				-1.516.136		-1,51	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.764.649	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	20	2.470,2	2,07	996,77	1.953.900	39,0%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência: Pentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Diamante


MUNICÍPIO: Coreaú

B. HIDROGRÁFICA: Coreaú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
13.200.000		98,00		40	0	32	1988

ANO: ano de construção do açude

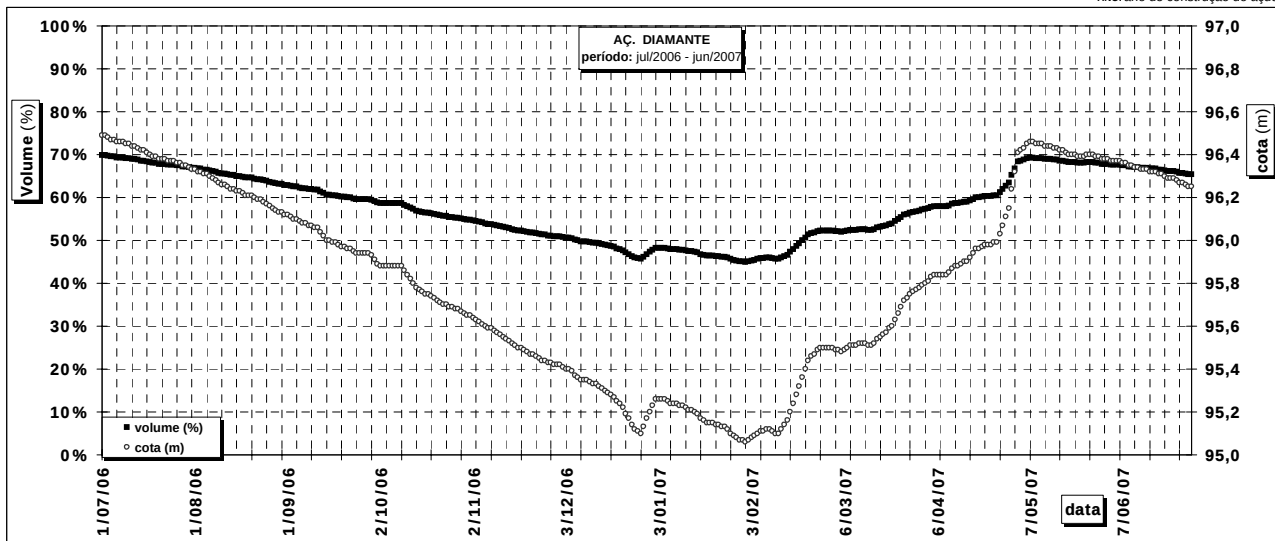

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	96,49	95,20	1,29	0,70	9.224.995	6.239.994	2.985.001	188	187	1

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	2/2/2007	24/5/2007	84	95,06	96,46	3.393.989	0	0	576.292	3.970.281

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	336.616	85.603	1.194.741	850.596	1.214.904	202.981	0	3.885.441

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	96,49	9.224.995	69,9%	-399.990	-12.903	-0,16	-0,52
01/08/2006	96,33	8.825.005	66,9%	-524.998	-16.935	-0,21	-0,68
01/09/2006	96,12	8.300.007	62,9%	-542.008	-18.067	-0,23	-0,77
01/10/2006	95,89	7.757.999	58,8%	-527.995	-17.032	-0,24	-0,77
01/11/2006	95,65	7.230.004	54,8%	-506.008	-16.867	-0,23	-0,77
01/12/2006	95,42	6.723.996	50,9%	-417.988	-13.483	-0,19	-0,61
01/01/2007	95,23	6.306.008	47,8%	-374.013	-12.065	-0,17	-0,55
01/02/2007	95,06	5.931.995	44,9%	968.005	34.572	0,44	1,57
01/03/2007	95,50	6.900.000	52,3%	638.002	20.581	0,29	0,94
01/04/2007	95,79	7.538.002	57,1%	1.061.993	35.400	0,45	1,50
01/05/2007	96,24	8.599.995	65,2%	349.998	11.290	0,14	0,45
01/06/2007	96,38	8.949.993	67,8%	-349.998	-11.667	-0,14	-0,47
01/07/2007	96,24	8.599.995	65,2%				
TOTAL ANUAL				-625.000		-0,25	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						4.197.208	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
103	0	0	9	1.240,0	3,58	95,83	7.656.000	58,0%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Do Coronel


MUNICÍPIO: Antonina do Norte

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
1.770.000	5.000	334,00	323,00	24	0	26	1946

ANO: ano de construção do açude

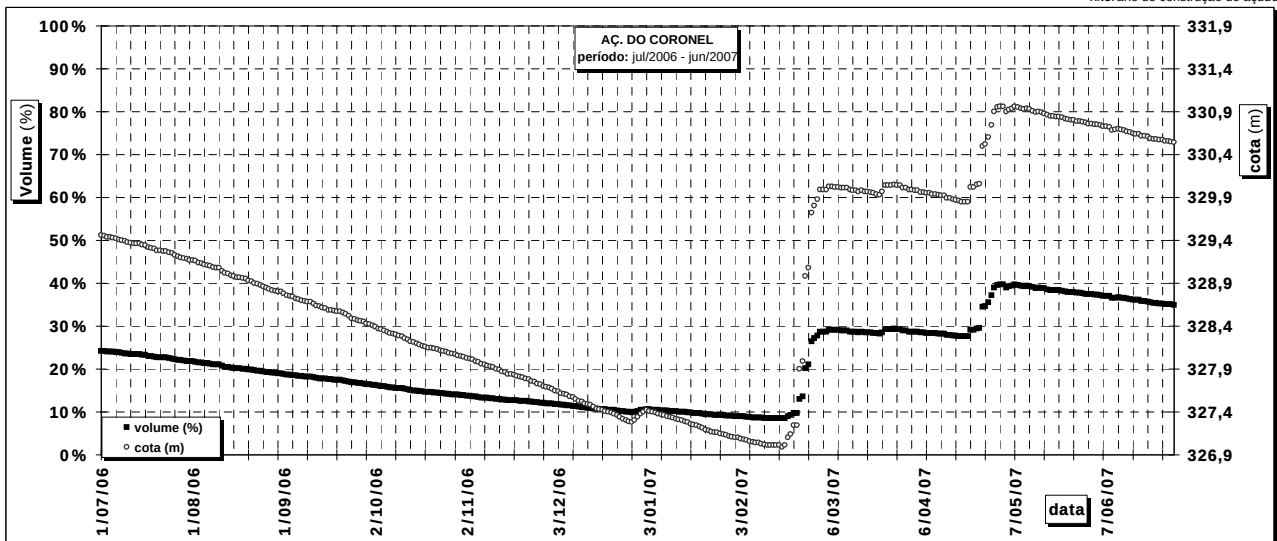

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	29/12/2006	181	329,46	327,01	2,45	1,07	428.999	150.901	278.098	13	10	3

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
30/12/2006	17/2/2007	10/6/2007	64	326,99	330,96	623.199	0	0	25.763	648.962

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	13.359	2.265	347.904	52.140	219.397	23.021	6.500	664.586

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	329,46	428.999	24,2%	-43.497	-1.403	-0,29	-0,94
01/08/2006	329,17	385.502	21,8%	-51.902	-1.674	-0,39	-1,26
01/09/2006	328,78	333.600	18,8%	-44.400	-1.480	-0,37	-1,23
01/10/2006	328,41	289.200	16,3%	-44.399	-1.432	-0,37	-1,19
01/11/2006	328,04	244.801	13,8%	-34.500	-1.150	-0,37	-1,23
01/12/2006	327,67	210.301	11,9%	-24.302	-784	-0,27	-0,87
01/01/2007	327,40	185.999	10,5%	-26.998	-871	-0,30	-0,97
01/02/2007	327,10	159.001	9,0%	333.000	11.893	2,78	9,93
01/03/2007	329,88	492.001	27,8%	16.498	532	0,11	0,35
01/04/2007	329,99	508.499	28,7%	191.503	6.383	0,96	3,20
01/05/2007	330,95	700.002	39,5%	-38.000	-1.226	-0,19	-0,61
01/06/2007	330,76	662.002	37,4%	-46.002	-1.533	-0,23	-0,77
01/07/2007	330,53	616.000	34,8%				
TOTAL ANUAL				187.001		1,07	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						304.980	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
334	0	0	99	972,1	2,69	328,90	375.240	21,2%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência/guatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Edson Queiroz


MUNICÍPIO: Santa Quitéria

B. HIDROGRÁFICA: Acaraú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
254.000.000	32.510.586	201,00	185,67	250	0	1.778	1987

ANO: ano de construção do açude

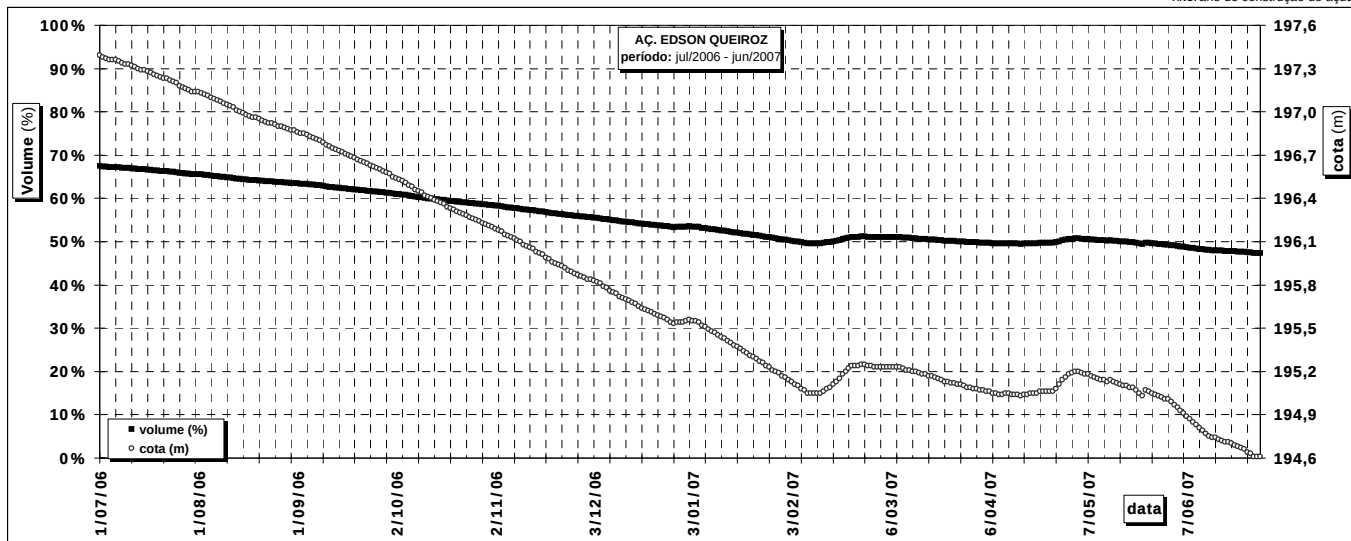

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	29/12/2006	181	197,39	195,07	2,32	1,05	171.318.192	126.356.744	44.961.448	2.354	1.424	930

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
9/2/2007		24/5/2007	51	195,03	195,25	8.333.560	1.149.120	0	2.025.507	11.508.187

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	1.095.690	496.870	5.826.259	0	4.024.758	1.657.170	0	13.100.747

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	197,39	171.318.192	67,4%	-4.845.008	-156.291	-0,25	-0,81
01/08/2006	197,14	166.473.184	65,5%	-5.426.368	-175.044	-0,28	-0,90
01/09/2006	196,86	161.046.816	63,4%	-6.007.760	-200.259	-0,31	-1,03
01/10/2006	196,55	155.039.056	61,0%	-6.783.120	-218.810	-0,35	-1,13
01/11/2006	196,20	148.255.936	58,4%	-6.976.800	-232.560	-0,36	-1,20
01/12/2006	195,84	141.279.136	55,6%	-5.620.080	-181.293	-0,29	-0,94
01/01/2007	195,55	135.659.056	53,4%	-7.558.184	-243.812	-0,39	-1,26
01/02/2007	195,16	128.100.872	50,4%	-1.356.448	-48.445	0,07	0,25
01/03/2007	195,23	129.457.320	51,0%	-2.906.888	-93.771	-0,15	-0,48
01/04/2007	195,08	126.550.432	49,8%	-1.937.824	-64.594	0,10	0,33
01/05/2007	195,18	128.488.256	50,6%	-3.294.560	-106.276	-0,17	-0,55
01/06/2007	195,01	125.193.696	49,3%	-5.105.624	-170.187	-0,41	-1,37
01/07/2007	194,60	120.088.072	47,3%				
TOTAL ANUAL				-51.230.120		-2,79	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						32.436.250	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
156	0	0	4	7.076,7	8,40	195,82	140.970.000	55,5%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaSobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Ema


MUNICÍPIO: Iracema

B. HIDROGRÁFICA: Médio Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
10.390.000	530.000	23,50	16,00	70	0	82	1932

ANO: ano de construção do açude

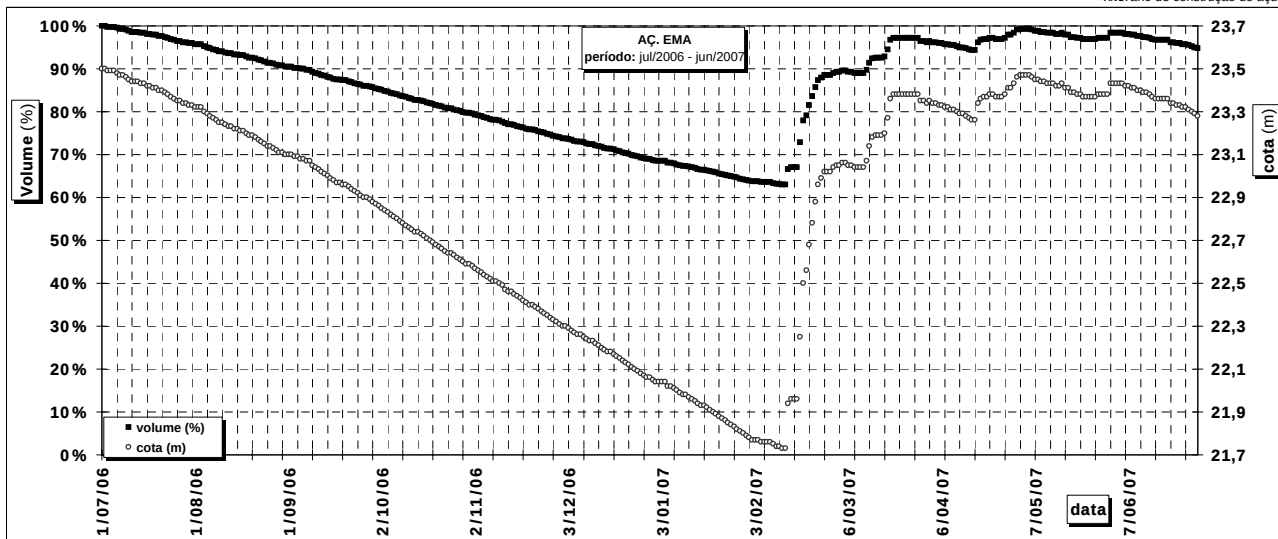

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	23,50	21,74	1,76	0,78	10.390.000	6.564.600	3.825.400	196	176	20

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	31/5/2007	85	21,73	23,47	4.339.290	48.384	0	545.539	4.933.213

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	2.916.038	1.048.416	690.207	278.552	0	4.933.213

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	23,50	10.390.000	100,0%	-446.401	-14.400	-0,18	-0,58
01/08/2006	23,32	9.943.599	95,7%	-545.598	-17.600	-0,22	-0,71
01/09/2006	23,10	9.398.001	90,5%	-544.800	-18.160	-0,24	-0,80
01/10/2006	22,86	8.853.201	85,2%	-593.601	-19.148	-0,28	-0,90
01/11/2006	22,58	8.259.600	79,5%	-593.601	-19.787	-0,28	-0,93
01/12/2006	22,30	7.665.999	73,8%	-551.197	-17.781	-0,26	-0,84
01/01/2007	22,04	7.114.802	68,5%	-478.601	-15.439	-0,26	-0,84
01/02/2007	21,78	6.636.201	63,9%	2.613.001	93.321	1,26	4,50
01/03/2007	23,04	9.249.202	89,0%	743.998	24.000	0,30	0,97
01/04/2007	23,34	9.993.200	96,2%	297.598	9.920	0,12	0,40
01/05/2007	23,46	10.290.798	99,0%	-74.397	-2.400	-0,03	-0,10
01/06/2007	23,43	10.216.401	98,3%	-396.800	-13.227	-0,16	-0,53
01/07/2007	23,27	9.819.601	94,5%				
TOTAL ANUAL				-570.399		-0,23	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						4.768.343	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
362	0	0	29	768,7	3,95	22,87	8.945.790	86,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Estrema


MUNICÍPIO: Lavras da Mangabeira

B. HIDROGRÁFICA: Salgado

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
2.900.000	10.000	100,00	87,00	0	0	26	1984

ANO: ano de construção do açude

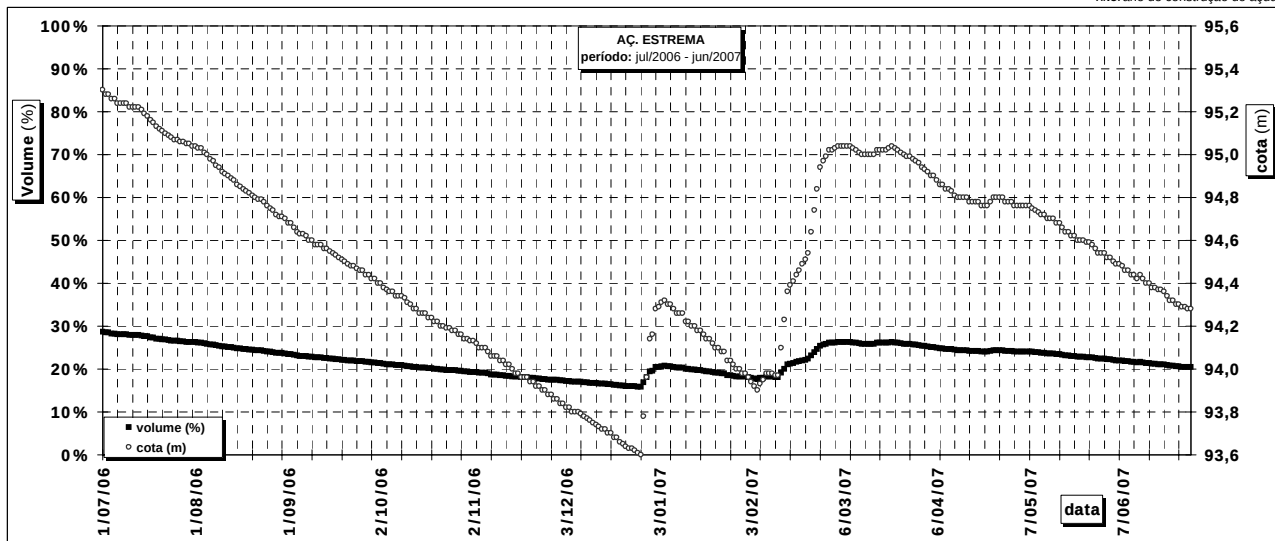

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	95,30	94,14	1,16	0,63	831.001	560.800	270.201	17	17	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	5/2/2007	12/6/2007	78	93,90	95,04	309.801	0	0	37.498	347.299

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	111.910	39.238	265.083	25.421	12.053	0	5.504	459.209

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	95,30	831.001	28,7%	-70.201	-2.265	-0,26	-0,84
01/08/2006	95,04	760.800	26,2%	-81.200	-2.619	-0,36	-1,16
01/09/2006	94,68	679.600	23,4%	-61.600	-2.053	-0,28	-0,93
01/10/2006	94,40	618.000	21,3%	-59.401	-1.916	-0,27	-0,87
01/11/2006	94,13	558.599	19,3%	-57.400	-1.913	-0,29	-0,97
01/12/2006	93,84	501.199	17,3%	-64.002	-2.065	0,32	1,03
01/01/2007	94,16	565.201	19,5%	-38.800	-1.252	-0,18	-0,58
01/02/2007	93,98	526.401	18,2%	-228.998	8.179	1,04	3,71
01/03/2007	95,02	755.399	26,0%	-18.598	-600	-0,08	-0,26
01/04/2007	94,94	736.801	25,4%	-35.201	-1.173	-0,16	-0,53
01/05/2007	94,78	701.600	24,2%	-52.800	-1.703	-0,24	-0,77
01/06/2007	94,54	648.800	22,4%	-61.599	-2.053	-0,28	-0,93
01/07/2007	94,26	587.201	20,2%				
TOTAL ANUAL				-243.800		-1,04	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						467.454	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
254	0	0	13	2.305,1	3,06	94,50	640.900	22,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrato

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Faé


MUNICÍPIO: Quixelô

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
23.400.000		241,00		80	0	309	2004

ANO: ano de construção do açude

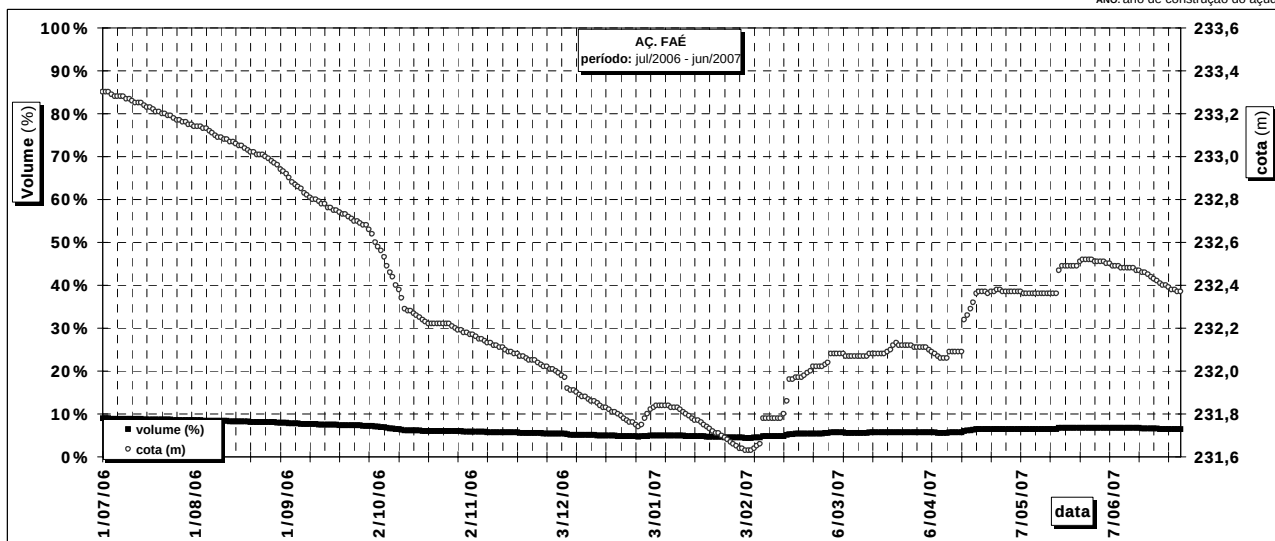

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	233,30	231,78	1,52	0,83	2.079.002	1.121.399	957.603	60	51	9

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	6/2/2007	27/5/2007	114	231,63	232,51	655.196	0	0	88.276	743.472

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	45.933	33.625	277.151	90.973	229.170	112.250	0	789.102

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	233,30	2.079.002	8,9%	-100.802	-3.252	-0,16	-0,52
01/08/2006	233,14	1.978.200	8,5%	-138.601	-4.471	-0,22	-0,71
01/09/2006	232,92	1.839.599	7,9%	-201.595	-6.720	-0,32	-1,07
01/10/2006	232,60	1.638.004	7,0%	-264.609	-8.536	-0,42	-1,35
01/11/2006	232,18	1.373.395	5,9%	-113.395	-3.780	-0,18	-0,60
01/12/2006	232,00	1.260.000	5,4%	-125.998	-4.064	-0,20	-0,65
01/01/2007	231,80	1.134.002	4,8%	-100.802	-3.252	-0,16	-0,52
01/02/2007	231,64	1.033.200	4,4%	239.403	8.550	0,38	1,36
01/03/2007	232,02	1.272.603	5,4%	56.697	1.829	0,09	0,29
01/04/2007	232,11	1.329.300	5,7%	163.797	5.460	0,26	0,87
01/05/2007	232,37	1.493.097	6,4%	88.200	2.845	0,14	0,45
01/06/2007	232,51	1.581.297	6,8%	-94.497	-3.150	-0,15	-0,50
01/07/2007	232,36	1.486.800	6,4%				
TOTAL ANUAL				-592.202		-0,94	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						992.322	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	67	0	15	10.823,7	2,97	232,34	1.474.200	6,3%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Igatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Farias de Sousa


MUNICÍPIO: Nova Russas

B. HIDROGRÁFICA: Acaraú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
12.230.000	1.085.000	98,00	89,50	80	0	43	1983

ANO: ano de construção do açude

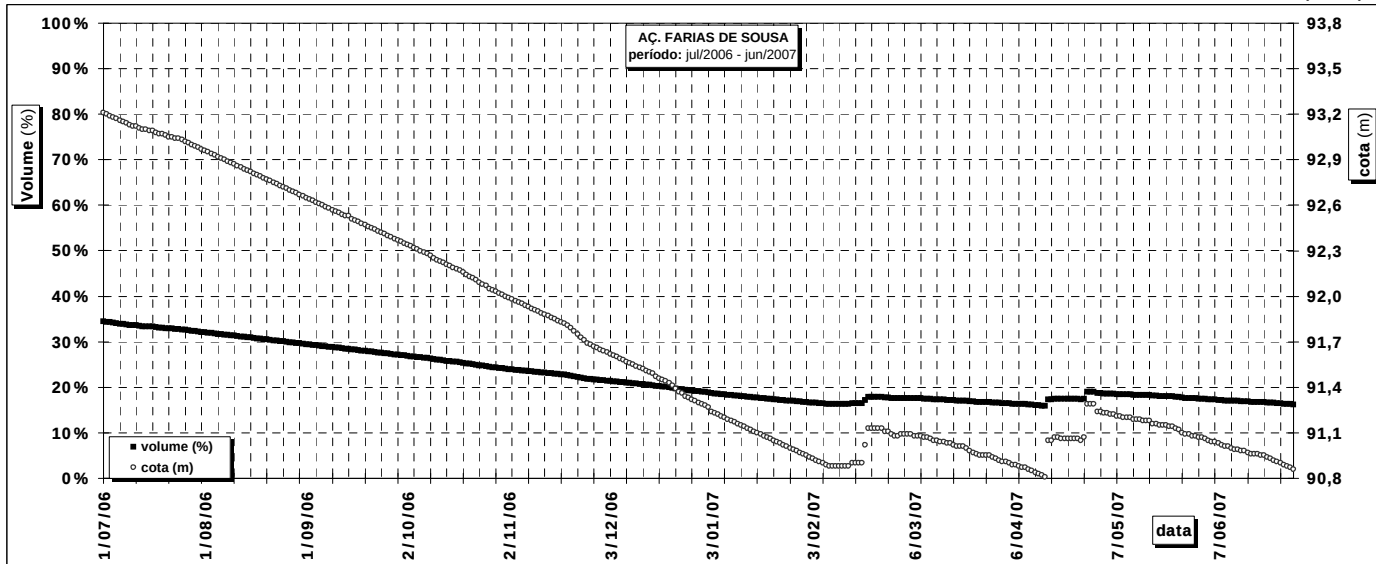

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	7/2/2007	221	93,21	90,89	2,32	1,05	4.214.099	2.001.900	2.212.199	115	113	2

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
8/2/2007		27/4/2007	45	90,81	91,13	607.095	0	0	56.836	663.931

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	225.686	14.493	422.720	0	0	662.899

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	93,21	4.214.099	34,5%	-294.900	-9.513	-0,25	-0,81
01/08/2006	92,96	3.919.199	32,0%	-316.197	-10.200	-0,31	-1,00
01/09/2006	92,65	3.603.002	29,5%	-306.003	-10.200	-0,30	-1,00
01/10/2006	92,35	3.296.999	27,0%	-356.999	-11.516	-0,35	-1,13
01/11/2006	92,00	2.940.000	24,0%	-309.600	-10.320	-0,36	-1,20
01/12/2006	91,64	2.630.400	21,5%	-309.601	-9.987	-0,36	-1,16
01/01/2007	91,28	2.320.799	19,0%	-276.301	-8.913	-0,33	-1,06
01/02/2007	90,95	2.044.498	16,7%	104.304	3.725	0,13	0,46
01/03/2007	91,08	2.148.802	17,6%	-125.603	-4.052	-0,16	-0,52
01/04/2007	90,92	2.023.199	16,5%	263.199	8.773	0,32	1,07
01/05/2007	91,24	2.286.398	18,7%	-146.198	-4.716	-0,17	-0,55
01/06/2007	91,07	2.140.200	17,5%	-166.701	-5.557	-0,22	-0,73
01/07/2007	90,85	1.973.499	16,1%				
TOTAL ANUAL				-2.240.600		-2,36	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)				2.680.723			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO	
							(m³)	(%)
331	0	0	24	6.734,0	2,99	91,69	2.702.830	22,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência: Crateús

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇÚDE: Favelas


MUNICÍPIO: Tauá

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
30.100.000	2.400.000	436,00	428,00	200	0	659	1988

ANO: ano de construção do açude

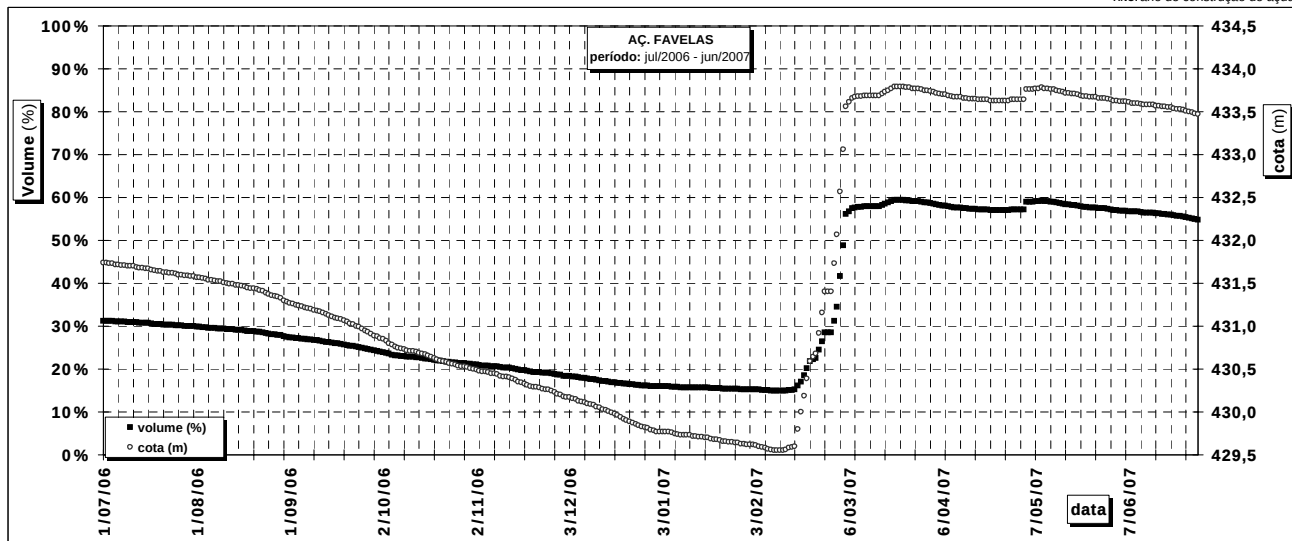

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	8/2/2007	222	431,74	429,56	2,18	0,98	9.406.476	4.505.997	4.900.479	255	225	30

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
9/2/2007	9/2/2007	8/5/2007	59	429,55	433,79	14.045.026	0	0	715.384	14.760.410

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	5.140.939	7.813.582	97.687	746.449	0	13.798.657

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	431,74	9.406.476	31,3%	-420.708	-13.571	-0,17	-0,55
01/08/2006	431,57	8.985.768	29,9%	-742.545	-23.953	-0,30	-0,97
01/09/2006	431,27	8.243.223	27,4%	-1.014.759	-33.825	-0,41	-1,37
01/10/2006	430,86	7.228.464	24,0%	-890.964	-28.741	-0,36	-1,16
01/11/2006	430,50	6.337.500	21,1%	-792.018	-26.401	-0,32	-1,07
01/12/2006	430,18	5.545.482	18,4%	-755.997	-24.387	-0,41	-1,32
01/01/2007	429,77	4.789.485	15,9%	-202.491	-6.532	-0,15	-0,48
01/02/2007	429,62	4.586.994	15,2%	4.794.783	171.242	2,11	7,54
01/03/2007	431,73	9.381.777	31,2%	8.324.473	268.531	2,02	6,52
01/04/2007	433,75	17.706.250	58,8%	-481.186	-16.040	-0,11	-0,37
01/05/2007	433,64	17.225.064	57,2%	0	0	0,00	0,00
01/06/2007	433,64	17.225.064	57,2%	-743.809	-24.794	-0,17	-0,57
01/07/2007	433,47	16.481.255	54,8%				
TOTAL ANUAL				7.074.779		1,73	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						7.186.203	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
159	0	0	50	796,2	3,14	431,63	10.234.000	34,0%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência/guatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Flor do campo


MUNICÍPIO: Novo Oriente

B. HIDROGRÁFICA: Parnaíba

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
111.300.000	7.250.000	351,00	340,50	80	363	663	1999

ANO: ano de construção do açude

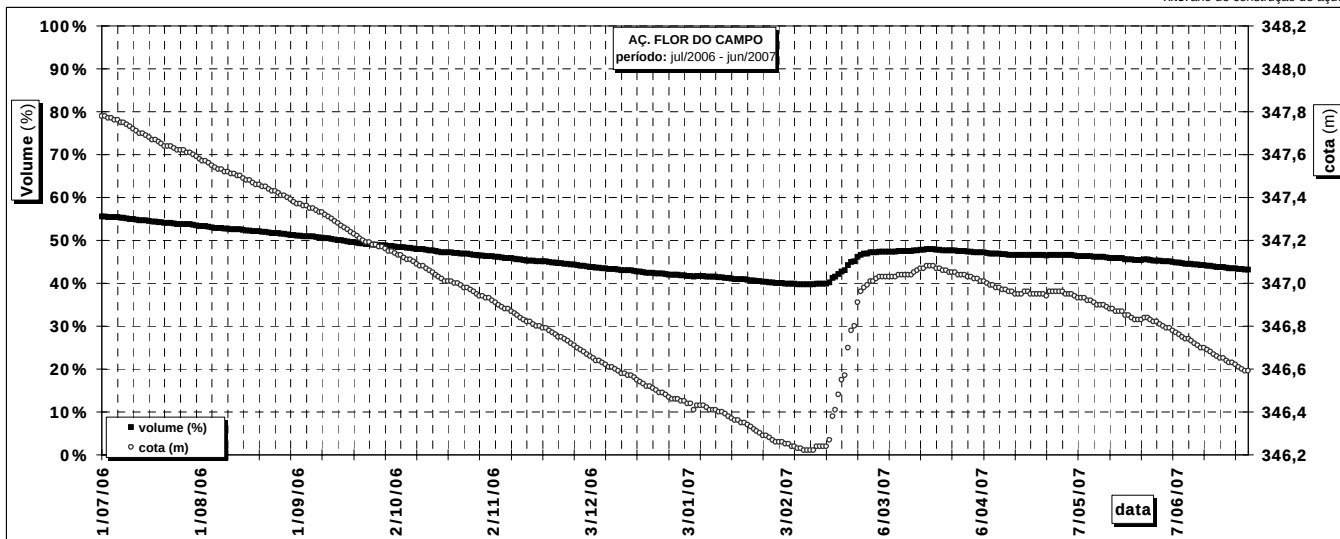

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	347,78	346,44	1,34	0,72	61.815.984	46.420.024	15.395.960	952	952	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	27/5/2007	76	346,22	347,08	9.795.480	0	0	2.014.528	11.810.008

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	353.175	9.038.377	1.714.475	530.221	208.138	0	11.844.386

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	347,78	61.815.984	55,5%	-2.440.148	-78.714	-0,20	-0,65
01/08/2006	347,58	59.375.836	53,3%	-2.561.896	-82.642	-0,21	-0,68
01/09/2006	347,37	56.813.940	51,0%	-2.684.016	-89.467	-0,22	-0,73
01/10/2006	347,15	54.129.924	48,6%	-2.565.000	-82.742	-0,22	-0,71
01/11/2006	346,93	51.564.924	46,3%	-2.625.000	-87.500	-0,25	-0,83
01/12/2006	346,68	48.939.924	44,0%	-2.414.796	-77.897	-0,23	-0,74
01/01/2007	346,45	46.525.128	41,8%	-1.995.024	-64.356	-0,19	-0,61
01/02/2007	346,26	44.530.104	40,0%	7.664.792	273.743	0,73	2,61
01/03/2007	346,99	52.194.896	46,9%	593.208	19.136	0,05	0,16
01/04/2007	347,04	52.788.104	47,4%	-908.192	-30.273	-0,08	-0,27
01/05/2007	346,96	51.879.912	46,6%	-1.469.836	-47.414	-0,14	-0,45
01/06/2007	346,82	50.410.076	45,3%	-2.520.216	-84.007	-0,24	-0,80
01/07/2007	346,58	47.889.860	43,0%				
TOTAL ANUAL				-13.926.124		-1,20	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						32.712.286	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
347	0	0	13	3.429,9	4,61	346,94	51.865.800	46,6%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrateús

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Fogareiro


MUNICÍPIO: Quixeramobim

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
118.820.000	2.008.840	236,20	219,61	150	475	5.106	1996

ANO: ano de construção do açude

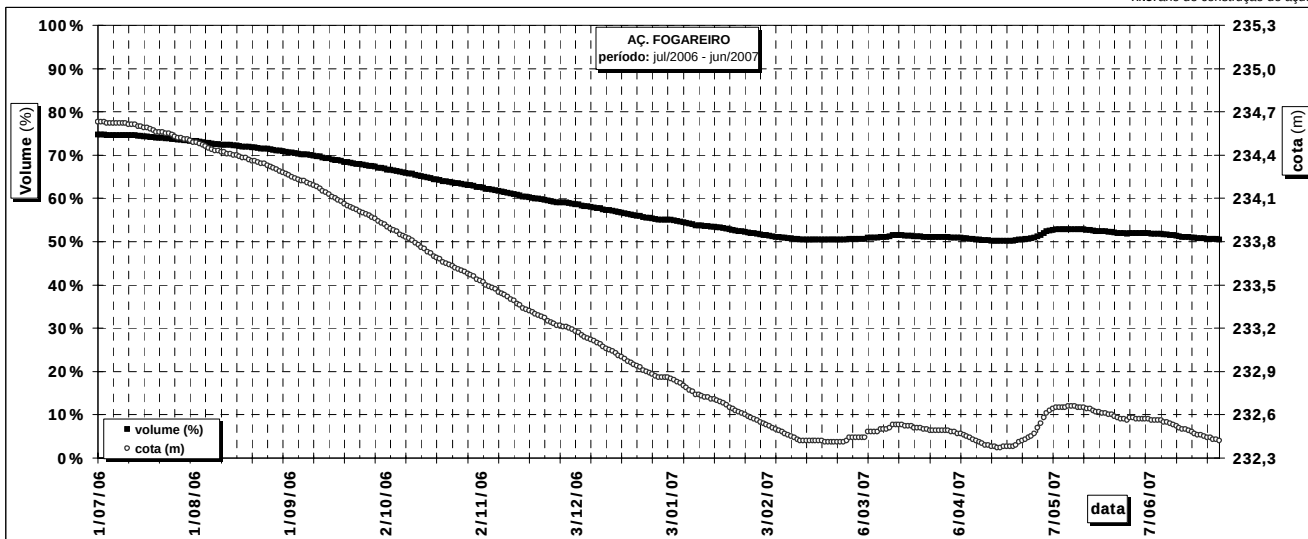

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	15/2/2007	229	234,63	232,42	2,21	0,94	88.764.944	59.969.424	28.795.520	1.418	1.065	353

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
16/2/2007		31/5/2007	72	232,37	232,66	4.776.100	754.965	0	1.277.042	6.808.107

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	237.146	1.804.466	1.534.184	3.232.311	0	6.808.107

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	234,63	88.764.944	74,7%	-1.844.632	-59.504	-0,14	-0,45
01/08/2006	234,49	86.920.312	73,2%	-3.030.624	-97.762	-0,23	-0,74
01/09/2006	234,26	83.889.688	70,6%	-4.348.104	-144.937	-0,33	-1,10
01/10/2006	233,93	79.541.584	66,9%	-5.138.632	-165.762	-0,39	-1,26
01/11/2006	233,54	74.402.952	62,6%	-4.479.792	-149.326	-0,34	-1,13
01/12/2006	233,20	69.923.160	58,8%	-4.479.792	-144.509	-0,34	-1,10
01/01/2007	232,86	65.443.368	55,1%	-4.084.528	-131.759	-0,31	-1,00
01/02/2007	232,55	61.358.840	51,6%	-1.389.416	-49.622	-0,13	-0,46
01/03/2007	232,42	59.969.424	50,5%	639.308	20.623	0,07	0,23
01/04/2007	232,49	60.608.732	51,0%	-182.680	-6.089	-0,02	-0,07
01/05/2007	232,47	60.426.052	50,9%	1.328.052	42.840	0,11	0,35
01/06/2007	232,58	61.754.104	52,0%	-1.875.952	-62.532	-0,17	-0,57
01/07/2007	232,41	59.878.152	50,4%				
TOTAL ANUAL				-28.886.792		-2,22	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						25.979.220	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	4	6.370,2	5,76	233,21	70.103.800	59,0%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Quixeramobim

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Forquilha


MUNICÍPIO: Forquilha

B. HIDROGRÁFICA: Acaraú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
50.130.000	8.825.995	112,00	105,60	50	0	191	1921

ANO: ano de construção do açude

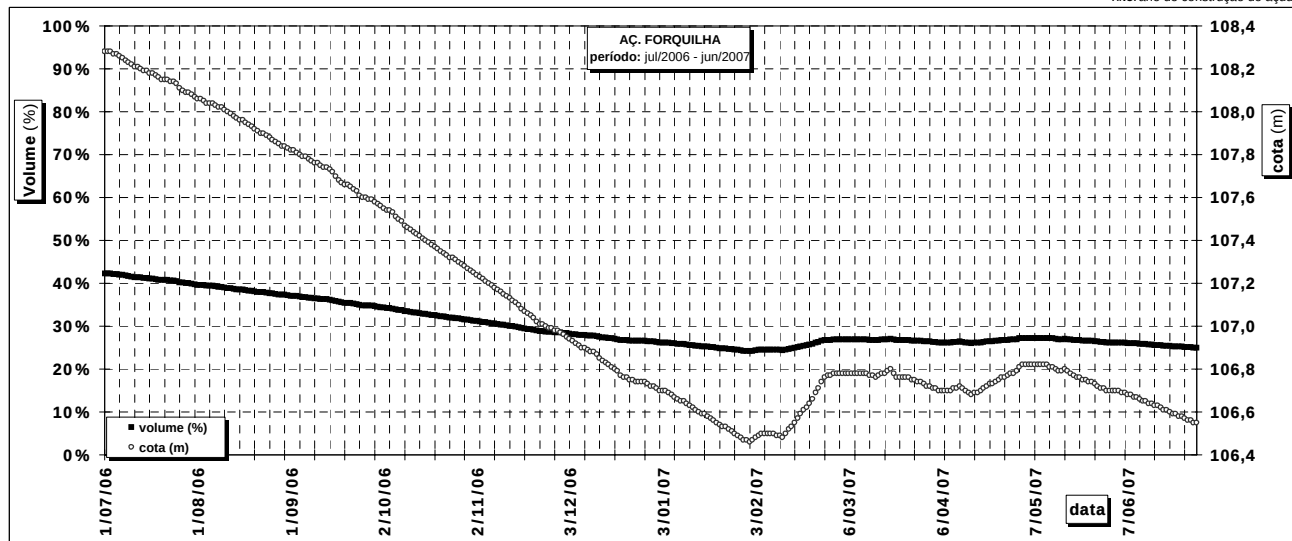

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/1/2007	214	108,28	106,47	1,81	0,85	21.178.392	12.153.405	9.024.987	488	370	118

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/2/2007		16/5/2007	75	106,46	106,82	2.321.014	319.862	0	815.449	3.456.325

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	maí/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	2.030.427	259.489	899.293	61.374	0	3.250.583

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	108,28	21.178.392	42,2%	-1.326.606	-42.794	-0,22	-0,71
01/08/2006	108,06	19.851.786	39,6%	-1.279.788	-41.283	-0,24	-0,77
01/09/2006	107,82	18.571.998	37,0%	-1.326.010	-44.200	-0,26	-0,87
01/10/2006	107,56	17.245.988	34,4%	-1.580.988	-51.000	-0,31	-1,00
01/11/2006	107,25	15.665.000	31,2%	-1.443.804	-48.127	-0,29	-0,97
01/12/2006	106,96	14.221.196	28,4%	-1.055.000	-34.032	-0,25	-0,81
01/01/2007	106,71	13.166.196	26,3%	-1.055.000	-34.032	-0,25	-0,81
01/02/2007	106,46	12.111.196	24,2%	1.350.399	48.229	0,32	1,14
01/03/2007	106,78	13.461.595	26,9%	-253.190	-8.167	-0,06	-0,19
01/04/2007	106,72	13.208.405	26,3%	295.399	9.847	0,07	0,23
01/05/2007	106,79	13.503.804	26,9%	-379.817	-12.252	-0,09	-0,29
01/06/2007	106,70	13.123.987	26,2%	-675.183	-22.506	-0,16	-0,53
01/07/2007	106,54	12.448.804	24,8%				
TOTAL ANUAL				-8.729.588		-1,74	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						9.083.272	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
93	0	0	2	5.629,0	3,20	107,11	15.089.130	30,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Forquilha ii


MUNICÍPIO: Tauá

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
3.400.000	315.000	98,00	91,50	40	0	43	1988

ANO: ano de construção do açude

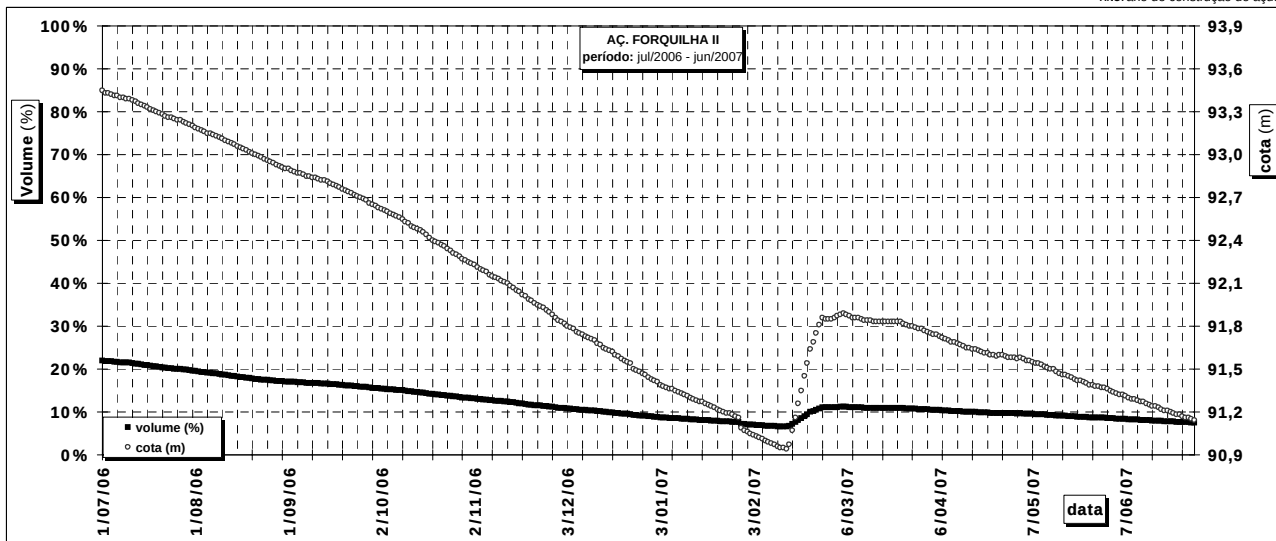

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	13/2/2007	227	93,45	90,95	2,50	1,10	748.499	224.500	523.999	26	19	7

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
14/2/2007	14/2/2007	2/5/2007	37	90,94	91,89	163.001	0	0	14.769	177.770

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	162.682	9.444	2.318	2.343	0	176.787

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	93,45	748.499	22,0%	-85.798	-2.768	-0,26	-0,84
01/08/2006	93,19	662.701	19,5%	-82.701	-2.668	-0,29	-0,94
01/09/2006	92,90	580.000	17,1%	-54.001	-1.800	-0,27	-0,90
01/10/2006	92,63	525.999	15,5%	-77.999	-2.516	-0,39	-1,26
01/11/2006	92,24	448.000	13,2%	-76.900	-2.563	-0,41	-1,37
01/12/2006	91,83	371.100	10,9%	-69.700	-2.248	-0,41	-1,32
01/01/2007	91,42	301.400	8,9%	-61.200	-1.974	-0,36	-1,16
01/02/2007	91,06	240.200	7,1%	-134.300	4.796	0,79	2,82
01/03/2007	91,85	374.500	11,0%	-13.601	-439	-0,08	-0,26
01/04/2007	91,77	360.899	10,6%	-32.299	-1.077	-0,19	-0,63
01/05/2007	91,58	328.600	9,7%	-37.400	-1.206	-0,22	-0,71
01/06/2007	91,36	291.200	8,6%	-37.400	-1.247	-0,22	-0,73
01/07/2007	91,14	253.800	7,5%				
TOTAL ANUAL				-494.699		-2,31	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						496.353	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)
211	0	0	10	7.019,7	2,17	92,01	414.800

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrateús

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Frios


MUNICÍPIO: Umirim

B. HIDROGRÁFICA: Curu

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
33.020.000	1.210.000	50,00	39,00	100	0	274	1988

ANO: ano de construção do açude

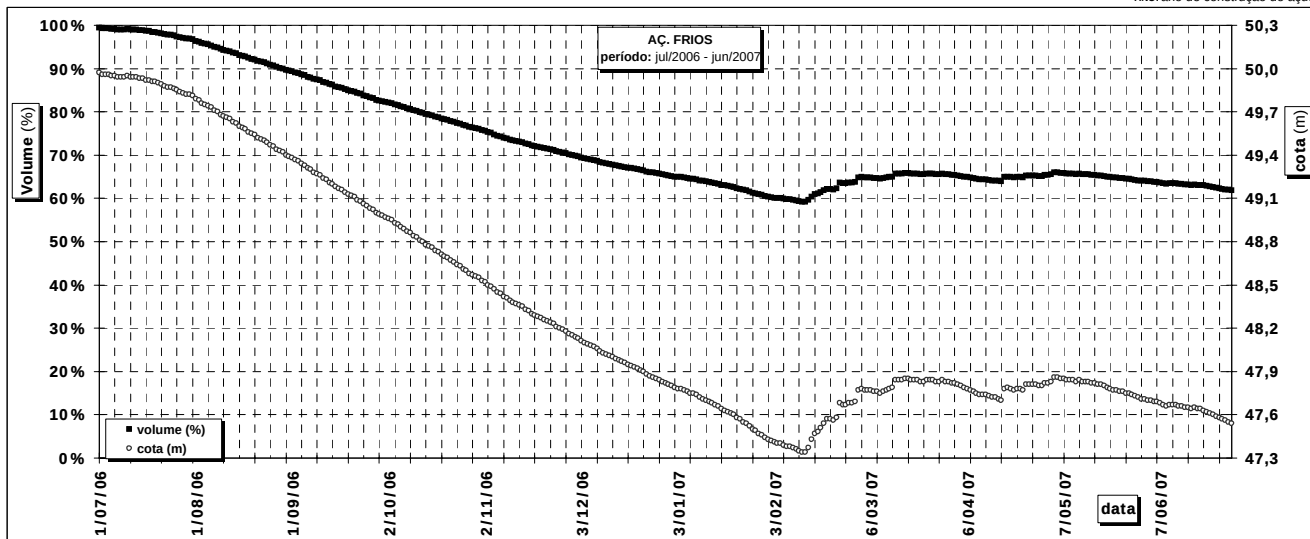

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	49,97	47,35	2,62	1,16	32.849.006	19.597.494	13.251.512	681	367	314

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FİRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007		17/6/2007	75	47,34	47,86	3.442.468	812.160	0	698.426	4.953.054

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
122.092	0	0	0	0	0	0	2.116.932	1.371.704	922.563	359.439	182.416	5.075.146

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	49,97	32.849.006	99,5%	-1.026.000	-33.097	-0,18	-0,58
01/08/2006	49,79	31.823.006	96,4%	-2.337.000	-75.387	-0,41	-1,32
01/09/2006	49,38	29.486.006	89,3%	-2.314.800	-77.160	-0,41	-1,37
01/10/2006	48,97	27.171.206	82,3%	-2.182.412	-70.400	-0,44	-1,42
01/11/2006	48,53	24.988.794	75,7%	-1.934.398	-64.480	-0,39	-1,30
01/12/2006	48,14	23.054.396	69,8%	-1.544.400	-49.819	-0,34	-1,10
01/01/2007	47,80	21.509.996	65,1%	-1.572.494	-50.726	-0,37	-1,19
01/02/2007	47,43	19.937.502	60,4%	1.104.992	39.464	0,26	0,93
01/03/2007	47,69	21.042.494	63,7%	552.504	17.823	0,13	0,42
01/04/2007	47,82	21.594.998	65,4%	0	0	0,00	0,00
01/05/2007	47,82	21.594.998	65,4%	-467.502	-15.081	-0,11	-0,35
01/06/2007	47,71	21.127.496	64,0%	-765.002	-25.500	-0,18	-0,60
01/07/2007	47,53	20.362.494	61,7%				
TOTAL ANUAL				-12.486.512		-2,44	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						9.160.068	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	10	2.374,8	4,98	48,33	24.236.680	73,4%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇÚDE: Gangorra


MUNICÍPIO: Granja

B. HIDROGRÁFICA: Coreaú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
62.500.000	4.661.002	38,00	29,70	40	0	105	1999

ANO: ano de construção do açude

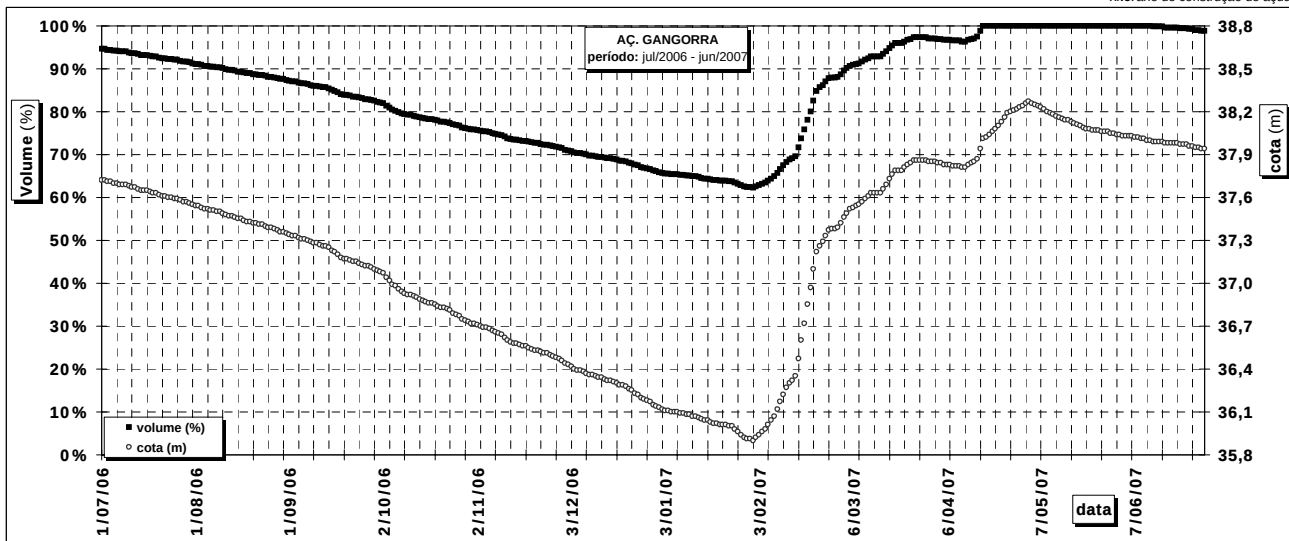

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/1/2007	214	37,72	35,91	1,81	0,85	59.095.216	39.000.900	20.094.316	1.086	821	265

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/2/2007	1/2/2007	11/6/2007	113	35,90	38,27	24.196.980	0	14.320.306	5.006.211	43.523.497

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	17.502.348	6.661.093	6.248.457	10.185.693	514.079	41.111.670

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	37,72	59.095.216	94,6%	-2.188.804	-70.607	-0,18	-0,58
01/08/2006	37,54	56.906.412	91,1%	-2.432.012	-78.452	-0,20	-0,65
01/09/2006	37,34	54.474.400	87,2%	-3.161.576	-105.386	-0,26	-0,87
01/10/2006	37,08	51.312.824	82,1%	-3.921.212	-126.491	-0,36	-1,16
01/11/2006	36,72	47.391.612	75,8%	-2.948.428	-98.281	-0,28	-0,93
01/12/2006	36,44	44.443.184	71,1%	-3.264.272	-105.299	-0,31	-1,00
01/01/2007	36,13	41.178.912	65,9%	-2.267.900	-73.158	-0,23	-0,74
01/02/2007	35,90	38.911.012	62,3%	16.171.380	577.549	1,49	5,32
01/03/2007	37,39	55.082.392	88,1%	5.593.588	180.438	0,46	1,48
01/04/2007	37,85	60.675.980	97,1%	1.824.020	60.801	0,39	1,30
01/05/2007	38,24	62.500.000	100,0%	0	0	-0,20	-0,65
01/06/2007	38,04	62.500.000	100,0%	-729.616	-24.321	-0,10	-0,33
01/07/2007	37,94	61.770.384	98,8%				
TOTAL ANUAL				2.675.168		0,22	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						21.930.124	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMZ. MÉDIO	
104	0	54	12	554,9	4,53	37,21	53.000.000	84,8%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Gavião


MUNICÍPIO: Pacatuba

B. HIDROGRÁFICA: Metropolitanas

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
32.900.000	21.230.000	36,00	34,00	20	0	97	1974

ANO: ano de construção do açude

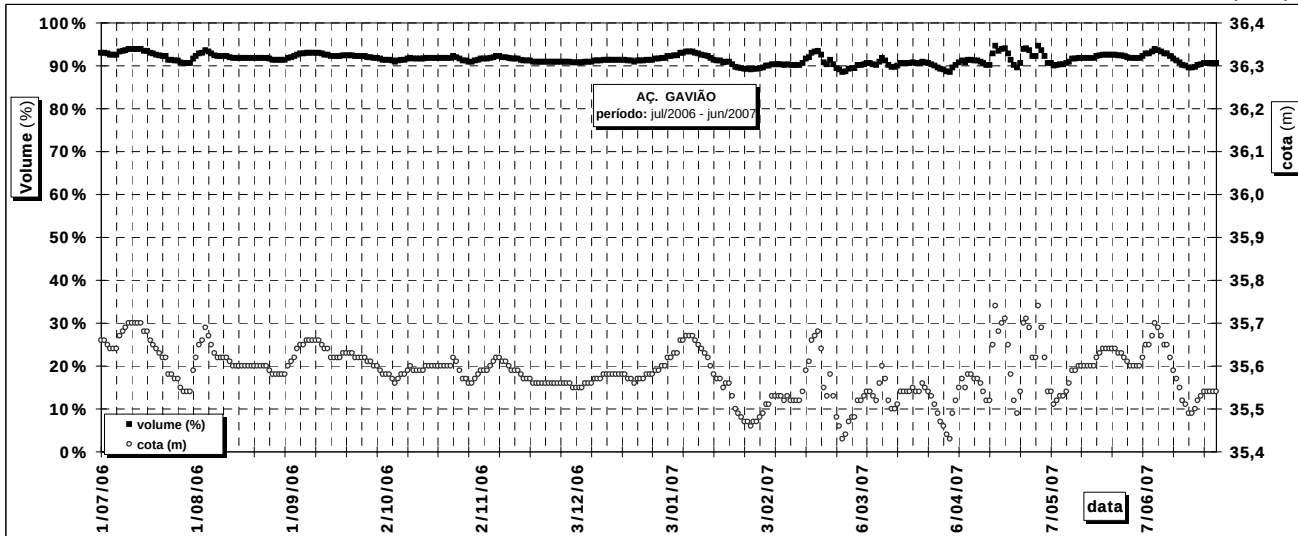

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
6.592.755	4.478.217	6.146.620	8.898.455	4.735.002	14.161.273	9.937.140	12.528.957	14.314.422	14.118.305	12.955.848	9.520.451	118.387.445

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	35,66	30.601.598	93,0%	-270.406	-8.723	-0,04	-0,13
01/08/2006	35,62	30.331.192	92,2%	-67.588	-2.180	-0,01	-0,03
01/09/2006	35,61	30.263.604	92,0%	-202.792	-6.760	-0,03	-0,10
01/10/2006	35,58	30.060.812	91,4%	0	0	0,00	0,00
01/11/2006	35,58	30.060.812	91,4%	-135.202	-4.507	-0,02	-0,07
01/12/2006	35,56	29.925.610	91,0%	270.380	8.722	0,04	0,13
01/01/2007	35,60	30.195.990	91,8%	-790.392	-25.497	-0,12	-0,39
01/02/2007	35,48	29.405.598	89,4%	-228.806	-8.172	-0,04	-0,14
01/03/2007	35,44	29.176.792	88,7%	171.614	5.536	0,03	0,10
01/04/2007	35,47	29.348.406	89,2%	982.786	32.760	0,15	0,50
01/05/2007	35,62	30.331.192	92,2%	-67.588	-2.180	-0,01	-0,03
01/06/2007	35,61	30.263.604	92,0%	-540.812	-18.027	-0,08	-0,27
01/07/2007	35,53	29.722.792	90,3%				
TOTAL ANUAL				-878.806		-0,13	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)				8.574.200			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMZ. MÉDIO (m³)	(%)
363	0	0	16	101,4	5,12	35,59	30.103.500	91,5%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência GEMET

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: General Sampaio


MUNICÍPIO: General Sampaio

B. HIDROGRÁFICA: Curu

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
322.200.000	13.156.393	124,50	104,20	150	0	1.582	1935

ANO: ano de construção do açude

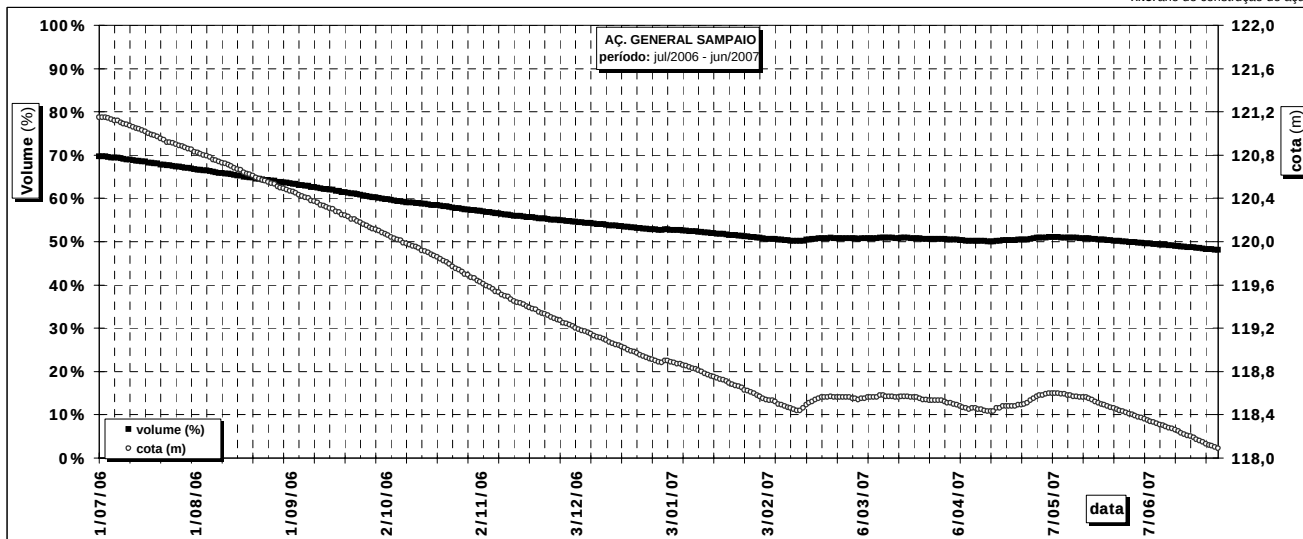

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	12/2/2007	226	121,15	118,45	2,70	1,19	224.313.040	161.551.344	62.761.696	3.214	1.671	1.543

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
13/2/2007		5/5/2007	61	118,43	118,59	6.772.320	1.866.240	0	2.738.578	11.377.138

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	665.362	0	4.213.091	1.791.434	4.020.753	1.434.261	0	12.124.901

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	121,15	224.313.040	69,6%	-9.350.384	-301.625	-0,32	-1,03
01/08/2006	120,83	214.962.656	66,7%	-10.519.216	-339.330	-0,36	-1,16
01/09/2006	120,47	204.443.440	63,5%	-11.395.792	-379.860	-0,39	-1,30
01/10/2006	120,08	193.047.648	59,9%	-9.109.984	-293.870	-0,44	-1,42
01/11/2006	119,64	183.937.664	57,1%	-7.712.848	-257.095	-0,41	-1,37
01/12/2006	119,23	176.224.816	54,7%	-6.207.984	-200.258	-0,33	-1,06
01/01/2007	118,90	170.016.832	52,8%	-6.208.000	-200.258	-0,33	-1,06
01/02/2007	118,57	163.808.832	50,8%	-188.160	-6.720	-0,01	-0,04
01/03/2007	118,56	163.620.672	50,8%	-564.336	-18.204	-0,03	-0,10
01/04/2007	118,53	163.056.336	50,6%	376.320	12.544	0,02	0,07
01/05/2007	118,55	163.432.656	50,7%	-2.633.664	-84.957	-0,14	-0,45
01/06/2007	118,41	160.798.992	49,9%	-6.208.000	-206.933	-0,33	-1,10
01/07/2007	118,08	154.590.992	48,0%				
TOTAL ANUAL				-69.722.048		-3,07	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						41.945.744	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	3	9.699,3	8,04	119,29	179.143.200	55,6%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Gomes


MUNICÍPIO: Mauriti

B. HIDROGRÁFICA: Salgado

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
2.390.000	58.000	425,00	407,00	20	0	31	1967

ANO: ano de construção do açude

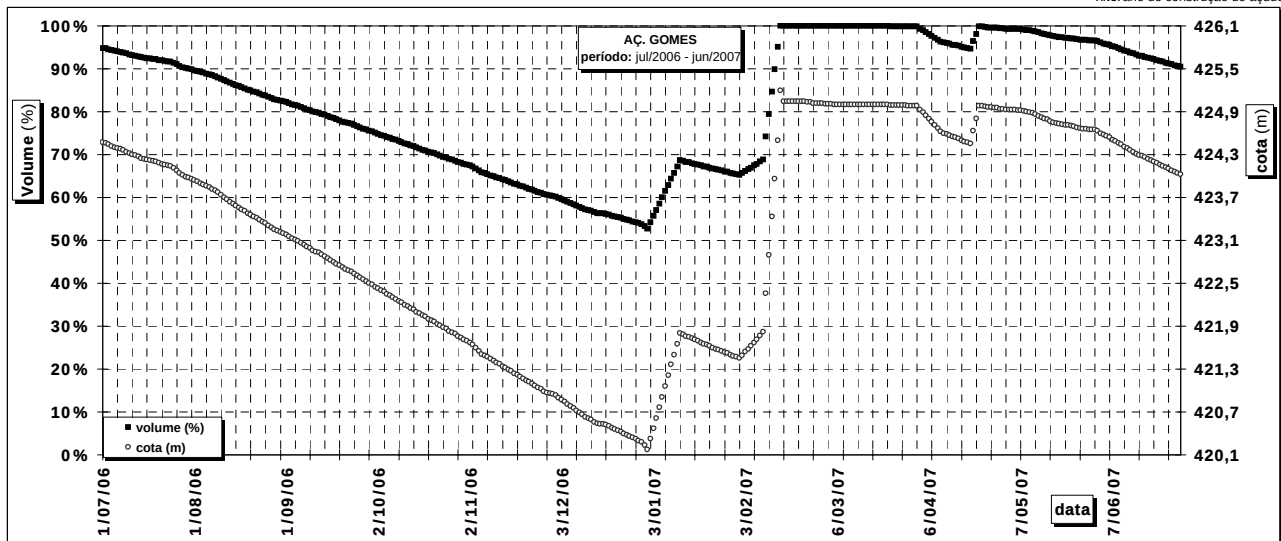

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	424,47	420,23	4,24	2,32	2.265.980	1.273.823	992.157	62	21	41

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	1/2/2007	20/4/2007	54	420,17	425,20	1.254.229	44.928	525.190	47.176	1.871.523

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	421.541	1.385.029	0	127.832	0	0	1.934.402

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	424,47	2.265.980	94,8%	-124.019	-4.001	-0,53	-1,71
01/08/2006	423,94	2.141.961	89,6%	-177.843	-5.737	-0,76	-2,45
01/09/2006	423,18	1.964.118	82,2%	-170.815	-5.694	-0,73	-2,43
01/10/2006	422,45	1.793.303	75,0%	-177.842	-5.737	-0,76	-2,45
01/11/2006	421,69	1.615.461	67,6%	-177.843	-5.928	-0,76	-2,53
01/12/2006	420,93	1.437.618	60,2%	-177.835	-5.737	-0,76	-2,45
01/01/2007	420,17	1.259.783	52,7%	299.520	9.662	1,28	4,13
01/02/2007	421,45	1.559.303	65,2%	830.697	29.668	3,57	12,75
01/03/2007	425,02	2.390.000	100,0%	-4.677	-151	-0,04	-0,13
01/04/2007	424,98	2.385.323	99,8%	-9.362	-312	-0,04	-0,13
01/05/2007	424,94	2.375.961	99,4%	-67.862	-2.189	-0,29	-0,94
01/06/2007	424,65	2.308.099	96,6%	-152.099	-5.070	-0,65	-2,17
01/07/2007	424,00	2.156.000	90,2%				
TOTAL ANUAL				-109.980		-0,47	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						533.171	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
68	0	18	70	451,0	8,09	423,20	1.969.360	82,4%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrato

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Itaúna


MUNICÍPIO: Chaval

B. HIDROGRÁFICA: Coreaú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
77.500.000	6.659.997	32,50	25,80	60	0	781	2001

ANO: ano de construção do açude

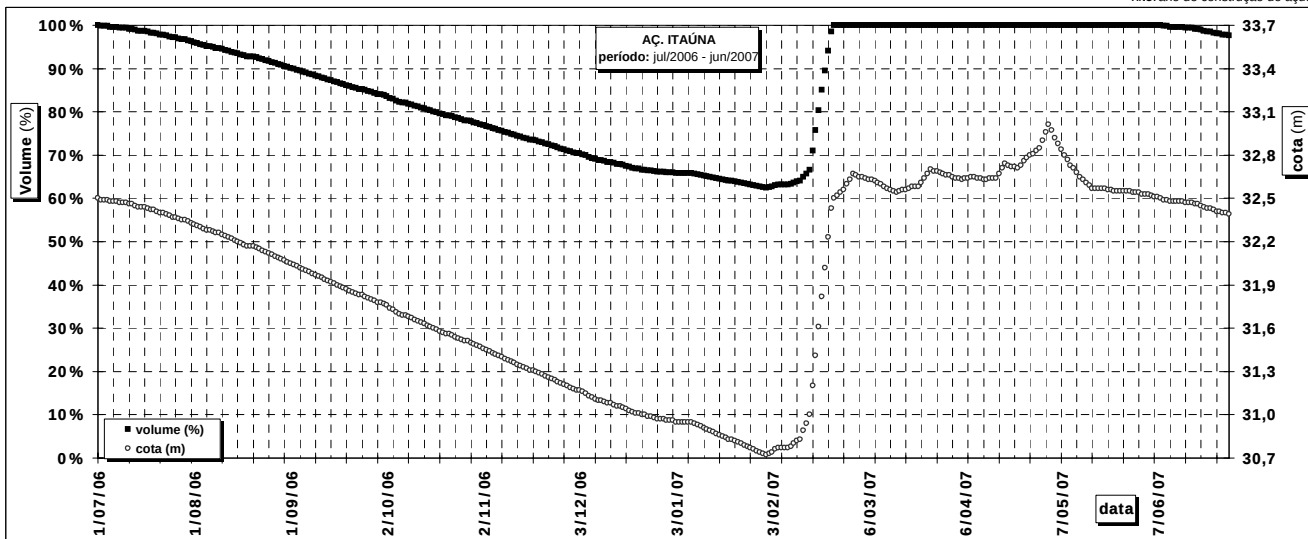

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/1/2007	214	32,50	30,73	1,77	0,83	77.500.000	48.467.996	29.032.004	1.570	1.242	328

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/2/2007	1/2/2007	8/6/2007	123	30,72	33,01	29.148.008	2.403.902	73.154.880	7.756.934	112.463.724

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	31.957.319	16.096.306	27.022.835	26.404.822	422.434	101.903.716

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	32,50	77.500.000	100,0%	-3.060.008	-98.710	-0,18	-0,58
01/08/2006	32,32	74.439.992	96,1%	-4.590.008	-148.065	-0,27	-0,87
01/09/2006	32,05	69.849.984	90,1%	-4.851.976	-161.733	-0,28	-0,93
01/10/2006	31,77	64.998.008	83,9%	-5.220.020	-168.388	-0,30	-0,97
01/11/2006	31,47	59.777.988	77,1%	-5.045.984	-168.199	-0,29	-0,97
01/12/2006	31,18	54.732.004	70,6%	-3.596.016	-116.001	-0,22	-0,71
01/01/2007	30,96	51.135.988	66,0%	-2.783.996	-89.806	-0,24	-0,77
01/02/2007	30,72	48.351.992	62,4%	29.148.008	1.041.000	1,95	6,96
01/03/2007	32,67	77.500.000	100,0%	0	0	-0,01	-0,03
01/04/2007	32,66	77.500.000	100,0%	0	0	0,24	0,80
01/05/2007	32,90	77.500.000	100,0%	0	0	-0,36	-1,16
01/06/2007	32,54	77.500.000	100,0%	-1.870.008	-62.334	-0,15	-0,50
01/07/2007	32,39	75.629.992	97,6%				
TOTAL ANUAL				-1.870.008		-0,11	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						31.171.178	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
103	0	104	20	277,6	4,05	31,94	67.270.000	86,8%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaSobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Jaburu I


MUNICÍPIO: Ubajara

B. HIDROGRÁFICA: Parnaíba

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
210.000.000	25.680.000	723,08	700,75	25	0	314	1983

ANO: ano de construção do açude

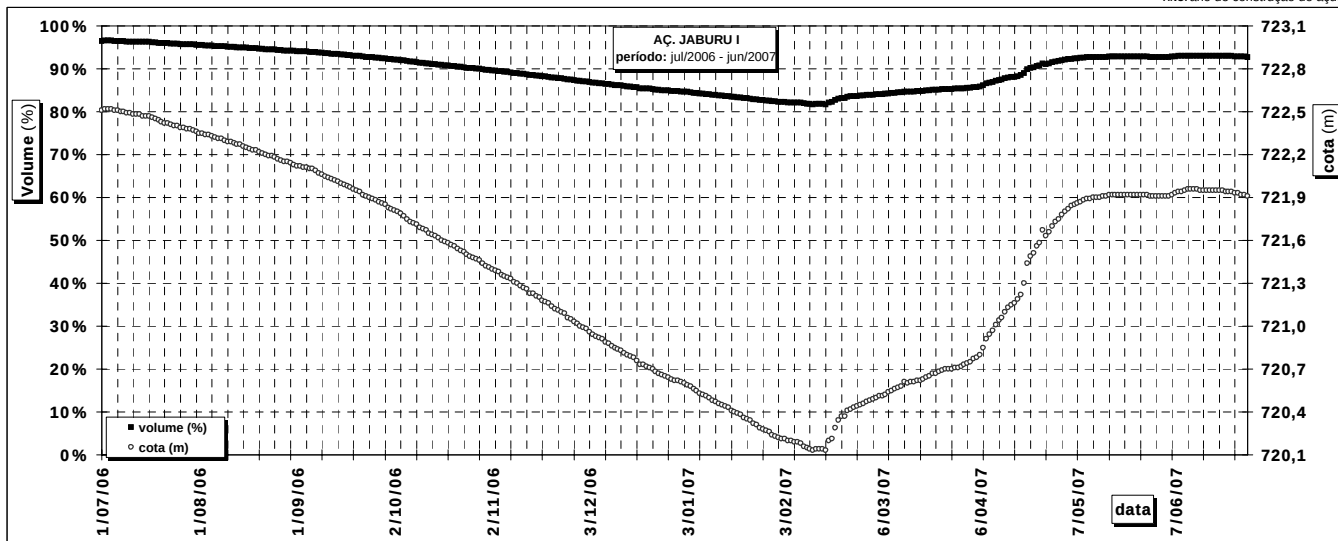

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	722,51	720,14	2,37	1,05	202.579.024	171.722.912	30.856.112	1.587	864	723

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	10/6/2007	111	720,13	721,95	24.737.312	538.290	0	3.064.927	28.340.529

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
265.541	0	0	0	0	0	0	5.303.526	4.458.611	14.775.272	2.823.080	1.027.057	28.653.087

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	722,51	202.579.024	96,5%	-2.083.568	-67.212	-0,16	-0,52
01/08/2006	722,35	200.495.456	95,5%	-2.994.224	-96.588	-0,23	-0,74
01/09/2006	722,12	197.501.232	94,0%	-3.905.680	-130.189	-0,30	-1,00
01/10/2006	721,82	193.595.552	92,2%	-5.338.432	-172.207	-0,41	-1,32
01/11/2006	721,41	188.257.120	89,6%	-5.467.968	-182.266	-0,42	-1,40
01/12/2006	720,99	182.789.152	87,0%	-4.947.456	-159.595	-0,38	-1,23
01/01/2007	720,61	177.841.696	84,7%	-5.077.792	-163.800	-0,39	-1,26
01/02/2007	720,22	172.763.904	82,3%	3.254.864	116.245	0,25	0,89
01/03/2007	720,47	176.018.768	83,8%	3.385.200	109.200	0,26	0,84
01/04/2007	720,73	179.403.968	85,4%	13.280.128	442.671	1,02	3,40
01/05/2007	721,75	192.684.096	91,8%	2.082.768	67.186	0,16	0,52
01/06/2007	721,91	194.766.864	92,7%	0	0	0,00	0,00
01/07/2007	721,91	194.766.864	92,7%				
TOTAL ANUAL				-7.812.160		-0,60	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)							21.455.516

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)
360	0	0	14	2.675,1	14,60	721,39	187.950.000

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Jaburu ii


MUNICÍPIO: Independência

B. HIDROGRÁFICA: Parnaíba

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
116.000.000	6.965.986	102,08	94,20	131	0	911	1984

ANO: ano de construção do açude

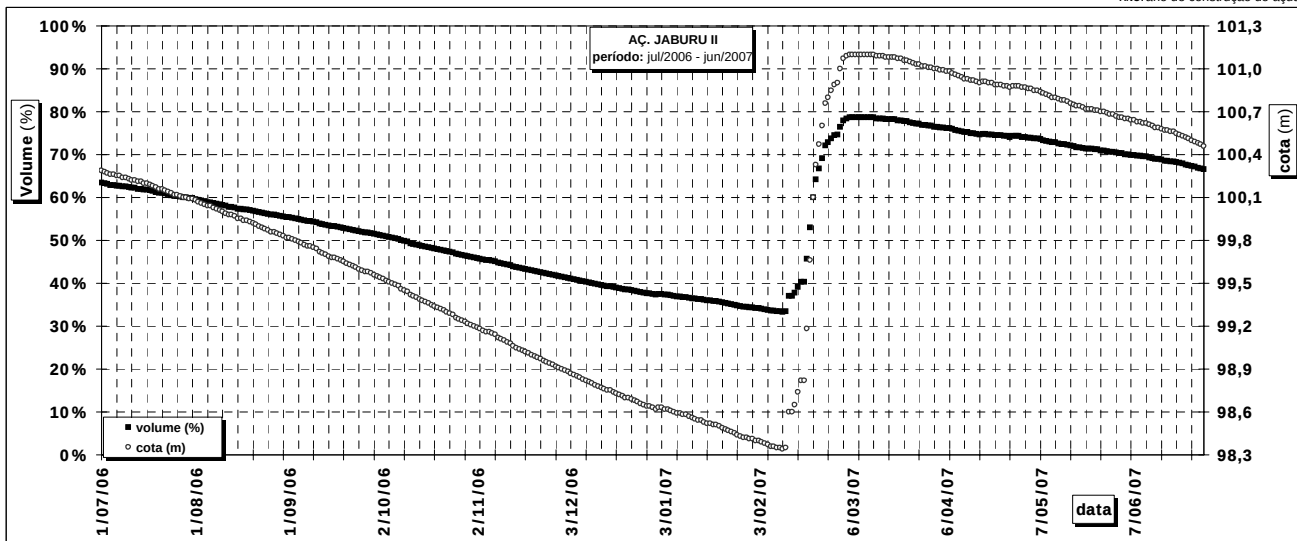

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	10/2/2007	224	100,29	98,35	1,94	0,87	73.602.520	38.756.976	34.845.544	1.800	1.800	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
11/2/2007	11/2/2007	27/4/2007	51	98,34	101,10	53.021.136	68.256	0	2.404.797	55.494.189

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	353.032	0	49.722.515	5.057.121	810.910	0	0	55.943.578

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	100,29	73.602.520	63,5%	-4.462.480	-143.951	-0,21	-0,68
01/08/2006	100,08	69.140.040	59,6%	-4.871.644	-157.150	-0,26	-0,84
01/09/2006	99,82	64.268.396	55,4%	-4.933.580	-164.453	-0,28	-0,93
01/10/2006	99,54	59.334.816	51,2%	-5.990.868	-193.254	-0,34	-1,10
01/11/2006	99,20	53.343.948	46,0%	-5.396.160	-179.872	-0,31	-1,03
01/12/2006	98,89	47.947.788	41,3%	-4.425.236	-142.750	-0,26	-0,84
01/01/2007	98,63	43.522.552	37,5%	-3.744.288	-120.783	-0,22	-0,71
01/02/2007	98,41	39.778.264	34,3%	-4.678.768	-155.792	-0,29	-0,94
01/03/2007	100,90	86.565.032	74,6%	2.374.320	76.591	0,11	0,35
01/04/2007	101,01	88.939.352	76,7%	-3.011.792	-100.393	-0,14	-0,47
01/05/2007	100,87	85.927.560	74,1%	-4.250.096	-137.100	-0,20	-0,65
01/06/2007	100,67	81.677.464	70,4%	-4.462.480	-148.749	-0,21	-0,70
01/07/2007	100,46	77.214.984	66,6%				
TOTAL ANUAL				3.612.464		0,17	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						52.160.636	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	48	756,8	3,44	99,84	65.772.000	56,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrateús

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Jatobá


MUNICÍPIO: Milhã

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
1.070.000	167.000	214,00	209,30	32	0	20	1997

ANO: ano de construção do açude

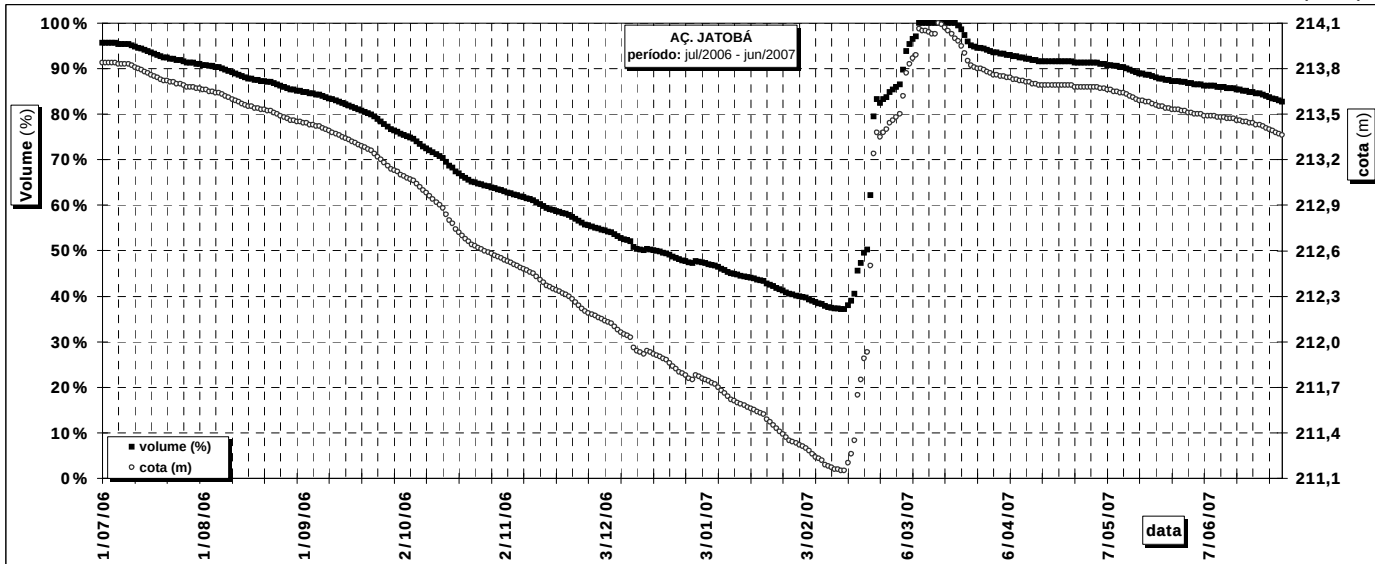

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	13/2/2007	227	213,84	211,16	2,68	1,18	1.023.599	398.801	624.798	31	19	12

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
14/2/2007	14/2/2007	21/3/2007	33	211,15	214,10	681.700	0	647.339	33.730	1.362.769

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	12.017	0	533.512	829.257	0	0	0	1.374.786

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	213,84	1.023.599	95,7%	-52.198	-1.684	-0,18	-0,58
01/08/2006	213,66	971.401	90,8%	-63.800	-2.058	-0,22	-0,71
01/09/2006	213,44	907.601	84,8%	-98.599	-3.287	-0,34	-1,13
01/10/2006	213,10	809.002	75,6%	-132.501	-4.274	-0,55	-1,77
01/11/2006	212,55	676.501	63,2%	-89.700	-2.990	-0,39	-1,30
01/12/2006	212,16	586.801	54,8%	-78.200	-2.523	-0,39	-1,26
01/01/2007	211,77	508.601	47,5%	-81.000	-2.613	-0,45	-1,45
01/02/2007	211,32	427.601	40,0%	-480.000	17.143	2,12	7,57
01/03/2007	213,44	907.601	84,8%	95.700	3.087	0,33	1,06
01/04/2007	213,77	1.003.301	93,8%	-26.103	-870	-0,09	-0,30
01/05/2007	213,68	977.198	91,3%	-49.300	-1.590	-0,17	-0,55
01/06/2007	213,51	927.898	86,7%	-43.498	-1.450	-0,15	-0,50
01/07/2007	213,36	884.400	82,7%				
TOTAL ANUAL				-139.199		-0,48	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)				507.143			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO	
							(m³)	(%)
365	0	11	74	284,1	3,15	212,98	801.430	74,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência: Quixeramobim

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Jenipapeiro


MUNICÍPIO: Dep. Irapuan Pinheiro

B. HIDROGRÁFICA: Médio Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
17.000.000	1.280.000	98,50	90,00	60	0	130	1997

ANO: ano de construção do açude

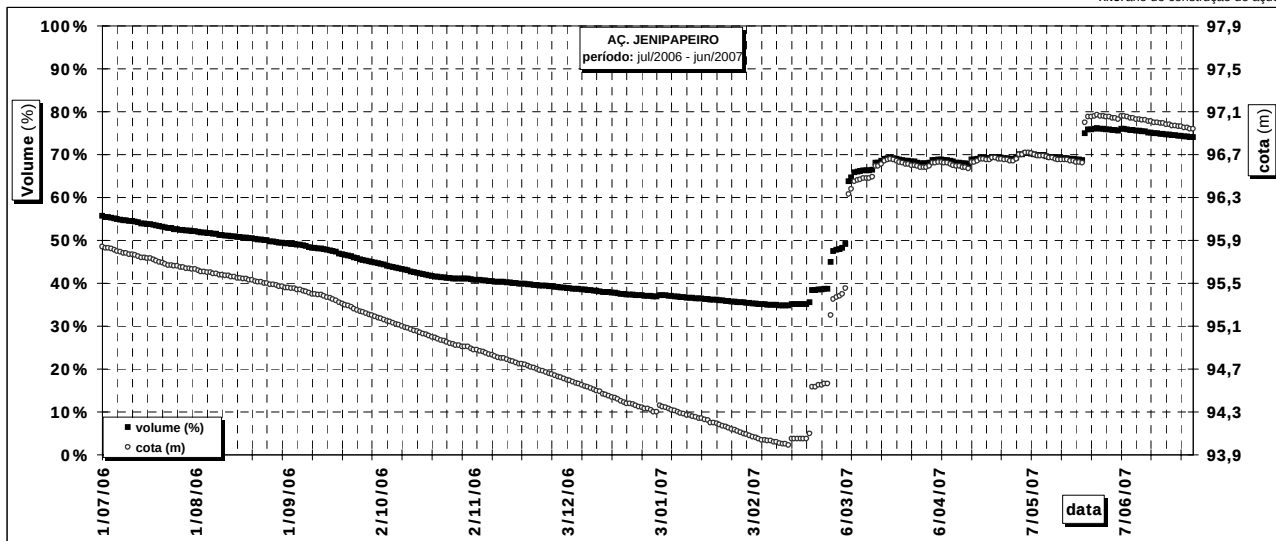

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	14/2/2007	228	95,84	94,00	1,84	0,81	9.453.190	5.912.000	3.541.190	179	145	34

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
15/2/2007	15/2/2007	5/6/2007	77	93,99	97,07	7.921.974	81.648	0	339.981	8.343.603

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	96.693	1.866.467	4.267.632	543.295	1.564.257	106.033	8.444.377

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	95,84	9.453.190	55,6%	-595.798	-19.219	-0,21	-0,68
01/08/2006	95,63	8.857.392	52,1%	-482.309	-15.558	-0,17	-0,55
01/09/2006	95,46	8.375.083	49,3%	-794.396	-26.480	-0,28	-0,93
01/10/2006	95,18	7.580.687	44,6%	-638.067	-20.583	-0,29	-0,94
01/11/2006	94,89	6.942.620	40,8%	-312.657	-10.422	-0,27	-0,90
01/12/2006	94,62	6.629.963	39,0%	-370.559	-11.954	-0,32	-1,03
01/01/2007	94,30	6.259.404	36,8%	-243.188	-7.845	-0,21	-0,68
01/02/2007	94,09	6.016.216	35,4%	1.621.204	57.900	1,11	3,96
01/03/2007	95,20	7.637.420	44,9%	3.915.271	126.299	1,38	4,45
01/04/2007	96,58	11.552.691	68,0%	170.221	5.674	0,06	0,20
01/05/2007	96,64	11.722.912	69,0%	1.163.239	37.524	0,41	1,32
01/06/2007	97,05	12.886.151	75,8%	-340.465	-11.349	-0,12	-0,40
01/07/2007	96,93	12.545.686	73,8%				
TOTAL ANUAL				3.092.496		1,09	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						3.583.013	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
364	0	0	88	734,8	4,75	95,50	8.823.000	51,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Jerimum


MUNICÍPIO: Iruçuaba

B. HIDROGRÁFICA: Curu

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
20.500.000	730.000	147,00	132,50	80	0	393	1996

ANO: ano de construção do açude

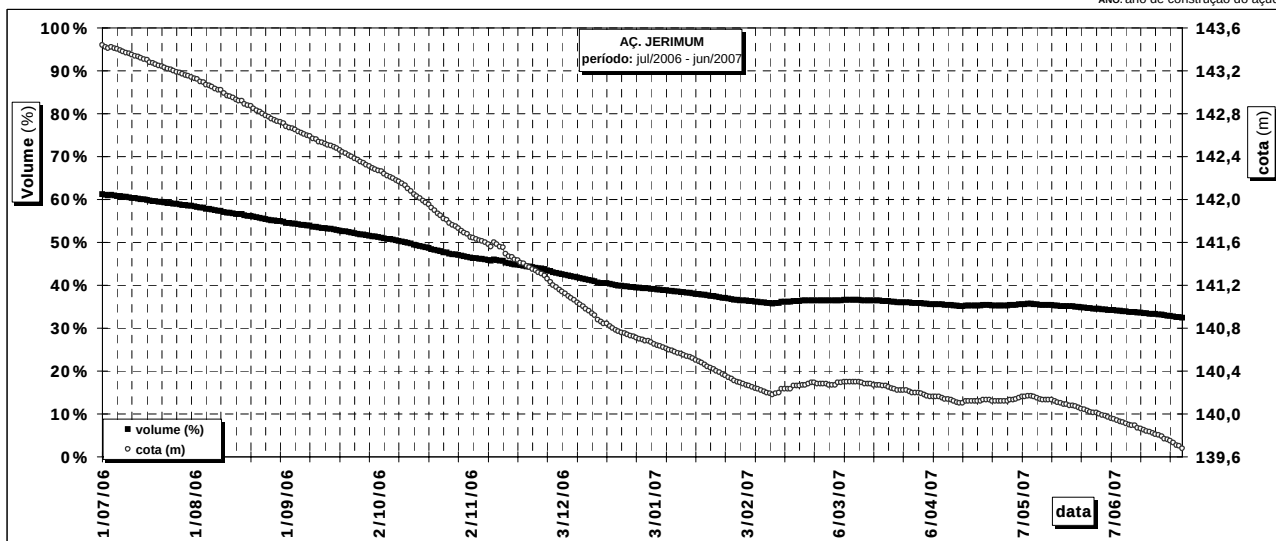

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	143,44	140,19	3,25	1,44	12.538.405	7.335.504	5.202.901	267	117	150

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007		8/5/2007	62	140,10	140,30	319.003	0	0	159.262	478.265

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
29.799	0	0	0	80.573	0	0	242.407	63.861	68.629	107.230	0	592.499

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	143,44	12.538.405	61,2%	-576.596	-18.600	-0,31	-1,00
01/08/2006	143,13	11.961.809	58,4%	-779.421	-25.143	-0,45	-1,45
01/09/2006	142,68	11.182.388	54,5%	-671.990	-22.400	-0,40	-1,33
01/10/2006	142,28	10.510.398	51,3%	-960.009	-30.968	-0,60	-1,94
01/11/2006	141,68	9.550.389	46,6%	-765.000	-25.500	-0,50	-1,67
01/12/2006	141,18	8.785.389	42,9%	-739.399	-23.852	-0,50	-1,61
01/01/2007	140,68	8.045.990	39,2%	-565.499	-18.242	-0,39	-1,26
01/02/2007	140,29	7.480.491	36,5%	-14.493	-518	-0,01	-0,04
01/03/2007	140,28	7.465.998	36,4%	-116.002	-3.742	-0,08	-0,26
01/04/2007	140,20	7.349.996	35,9%	-116.003	-3.867	-0,08	-0,27
01/05/2007	140,12	7.233.993	35,3%	-159.501	-5.145	-0,11	-0,35
01/06/2007	140,01	7.074.492	34,5%	-450.094	-15.003	-0,34	-1,13
01/07/2007	139,67	6.624.398	32,3%				
TOTAL ANUAL				-5.914.007		-3,77	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						2.891.240	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
364	0	0	3	12.628,7	5,73	141,19	8.876.500	43,3%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Joaquim Távora


MUNICÍPIO: Jaguaribe

B. HIDROGRÁFICA: Médio Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
26.772.800	1.980.000	114,45	106,00	50	0	121	1933

ANO: ano de construção do açude

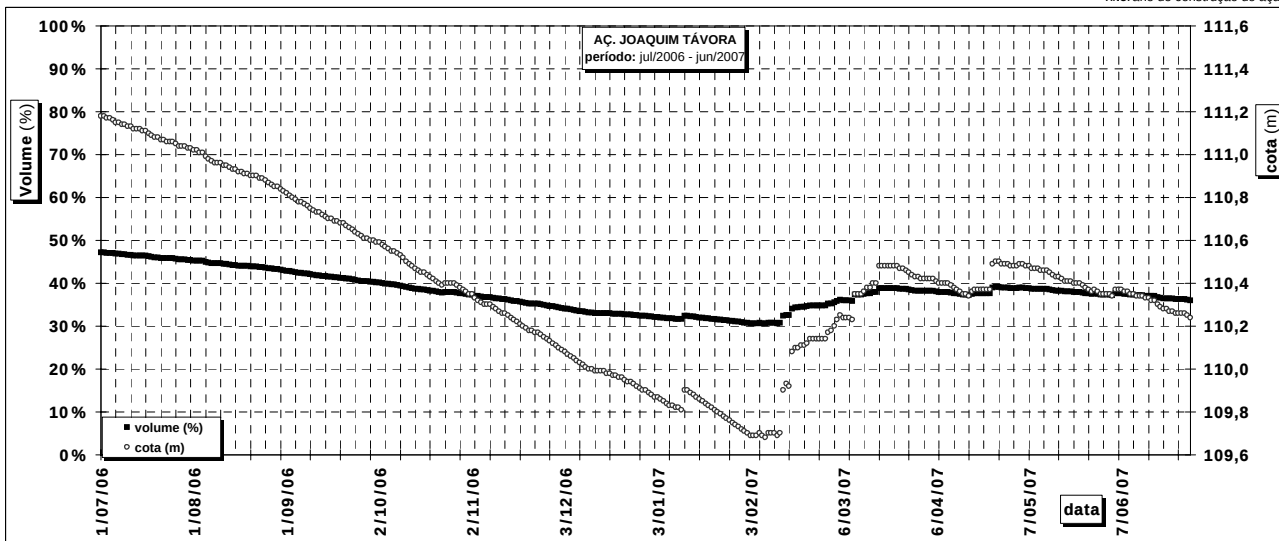

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	10/1/2007	193	111,18	109,82	1,36	0,70	12.634.201	8.484.799	4.149.402	248	244	4

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
11/1/2007	13/2/2007	4/6/2007	74	109,68	110,50	3.206.512	0	0	424.147	3.630.659

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	75.306	0	0	219.165	1.470.413	1.165.878	569.845	95.848	123.382	3.719.837

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	111,18	12.634.201	47,2%	-510.412	-16,465	-0,16	-0,52
01/08/2006	111,02	12.123.789	45,3%	-637.990	-20,580	-0,20	-0,65
01/09/2006	110,82	11.485.799	42,9%	-733.711	-24,457	-0,23	-0,77
01/10/2006	110,59	10.752.088	40,2%	-765.593	-24,697	-0,24	-0,77
01/11/2006	110,35	9.986.495	37,3%	-797.500	-26,583	-0,25	-0,83
01/12/2006	110,10	9.188.995	34,3%	-575.801	-18,574	-0,22	-0,71
01/01/2007	109,88	8.613.194	32,2%	-363.796	-11,735	-0,17	-0,55
01/02/2007	109,71	8.249.398	30,8%	1.162.896	41,532	0,46	1,64
01/03/2007	110,17	9.412.294	35,2%	797.500	25,726	0,25	0,81
01/04/2007	110,42	10.209.794	38,1%	191.417	6,381	0,06	0,20
01/05/2007	110,48	10.401.211	38,8%	-414.716	-13,378	-0,13	-0,42
01/06/2007	110,35	9.986.495	37,3%	-382.784	-12,759	-0,12	-0,40
01/07/2007	110,23	9.603.711	35,9%				
TOTAL ANUAL				-3.030.490		-0,95	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						5.654.562	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	20	2.627,0	3,56	110,39	10.146.891	37,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Lima Campos


MUNICÍPIO: Icó

B. HIDROGRÁFICA: Salgado

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
66.380.000	846.002	175,50	165,80	50	22	361	1924

ANO: ano de construção do açude

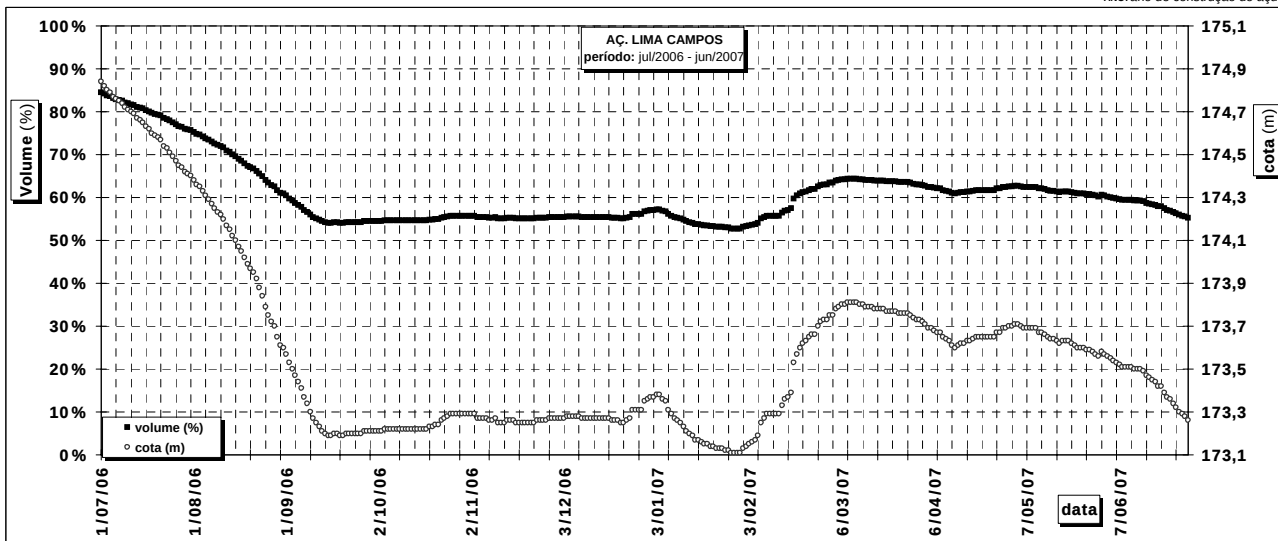

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INICIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
30/1/2007		31/5/2007	90	173,11	173,81	9.358.724	3.006.283	0	2.344.583	14.709.590

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	2.974.002	4.595.610	3.532.851	4.109.738	1.254.801	9.169.728	1.415.085	2.039.887	830.089	0	29.921.791

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	174,84	56.109.552	84,5%	-6.182.288	-199.429	-0,46	-1,48
01/08/2006	174,38	49.927.264	75,2%	-9.841.484	-317.467	-0,81	-2,61
01/09/2006	173,57	40.085.780	60,4%	-3.963.608	-132.120	-0,36	-1,20
01/10/2006	173,21	36.122.172	54,4%	880.656	28.408	0,08	0,26
01/11/2006	173,29	37.002.828	55,7%	-220.080	-7.336	-0,02	-0,07
01/12/2006	173,27	36.782.748	55,4%	1.100.900	35.513	0,10	0,32
01/01/2007	173,37	37.883.648	57,1%	-2.642.296	-85.235	-0,24	-0,77
01/02/2007	173,13	35.241.352	53,1%	6.605.900	235.925	0,60	2,14
01/03/2007	173,73	41.847.252	63,0%	0	0	0,00	0,00
01/04/2007	173,73	41.847.252	63,0%	-330.284	-11.009	-0,03	-0,10
01/05/2007	173,70	41.516.968	62,5%	-1.321.148	-42.618	-0,12	-0,39
01/06/2007	173,58	40.195.820	60,6%	-3.633.320	-121.111	-0,33	-1,10
01/07/2007	173,25	36.562.500	55,1%				
TOTAL ANUAL				#####		-1,59	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						22.071.298	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	14	809,7	3,59	173,58	40.292.660	60,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrato

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Madeiro


MUNICÍPIO: Pereiro

B. HIDROGRÁFICA: Médio Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
2.810.000		93,00		50	0	10	1999

ANO: ano de construção do açude

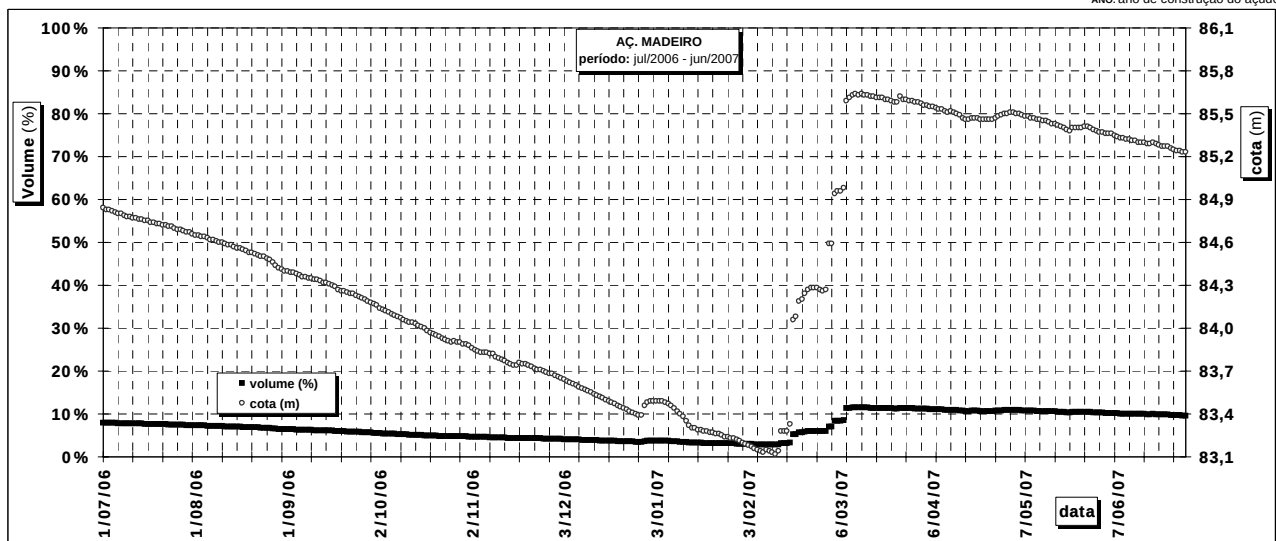

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	29/12/2006	181	84,84	83,39	1,45	0,80	224.000	97.300	126.700	8	7	1

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	18/6/2007	76	83,12	85,64	267.600	0	0	34.914	302.514

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	1.754	2.578	10.308	0	101.833	172.592	16.510	10.267	3.192	319.034

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	84,84	224.000	8,0%	-19.000	-613	-0,19	-0,61
01/08/2006	84,65	205.000	7,3%	-25.000	-806	-0,25	-0,81
01/09/2006	84,40	180.000	6,4%	-24.000	-800	-0,24	-0,80
01/10/2006	84,16	156.000	5,6%	-24.400	-787	-0,28	-0,90
01/11/2006	83,88	131.600	4,7%	-15.400	-513	-0,22	-0,73
01/12/2006	83,66	116.200	4,1%	-11.900	-384	-0,17	-0,55
01/01/2007	83,49	104.300	3,7%	-20.300	-655	-0,29	-0,94
01/02/2007	83,20	84.000	3,0%	83.000	2.964	1,07	3,82
01/03/2007	84,27	167.000	5,9%	148.400	4.787	1,31	4,23
01/04/2007	85,58	315.400	11,2%	-10.400	-347	-0,08	-0,27
01/05/2007	85,50	305.000	10,9%	-16.900	-545	-0,13	-0,42
01/06/2007	85,37	288.100	10,3%	-19.500	-650	-0,15	-0,50
01/07/2007	85,22	268.600	9,6%				
TOTAL ANUAL				44.600		0,38	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						321.748	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
358	0	0	73	3.214,9	1,17	84,46	193.890	6,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Malcozinhado


MUNICÍPIO: Cascavel

B. HIDROGRÁFICA: Metropolitanas

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
37.840.000	3.901.149	24,00	16,21	60	0	255	2003

ANO: ano de construção do açude

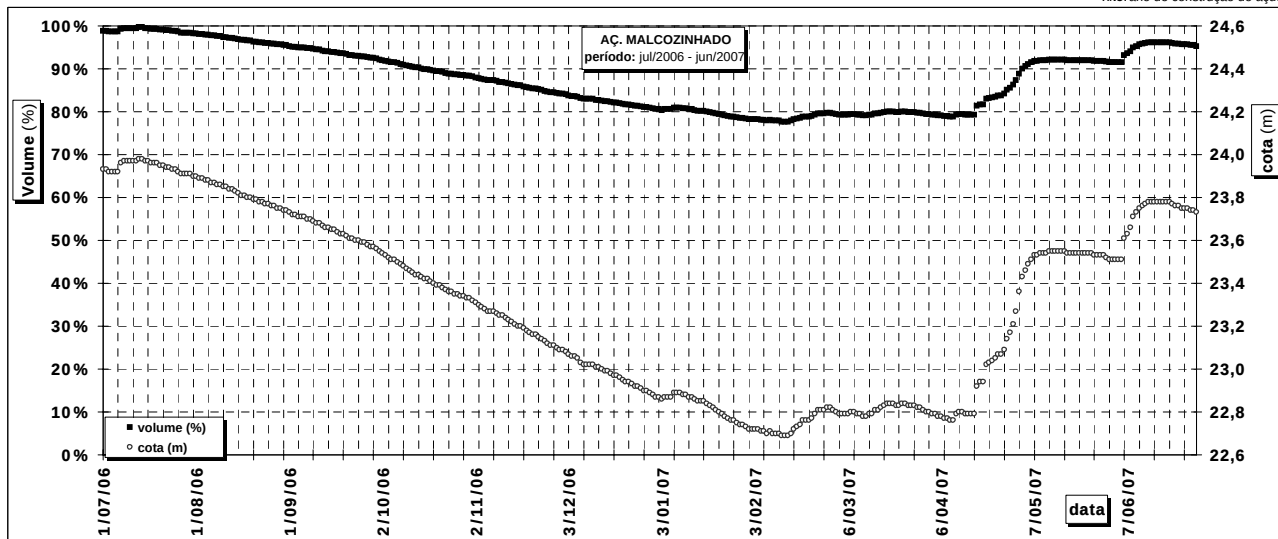

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	2/1/2007	185	23,93	22,87	1,06	0,57	37.377.544	30.470.218	6.907.326	432	384	48

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
3/1/2007	10/4/2007	13/6/2007	121	22,69	23,77	8.395.932	0	0	1.344.333	9.740.265

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
578.841	0	0	0	0	0	299.881	1.172.787	694.989	3.562.918	2.018.924	2.012.106	10.340.446

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	23,93	37.377.544	98,8%	-197.732	-6.378	-0,03	-0,10
01/08/2006	23,90	37.179.812	98,3%	-1.120.460	-36.144	-0,17	-0,55
01/09/2006	23,73	36.059.352	95,3%	-1.186.368	-39.546	-0,18	-0,60
01/10/2006	23,55	34.872.984	92,2%	-1.515.908	-48.900	-0,23	-0,74
01/11/2006	23,32	33.357.076	88,2%	-1.515.910	-50.530	-0,23	-0,77
01/12/2006	23,09	31.841.166	84,1%	-1.370.948	-44.224	-0,22	-0,71
01/01/2007	22,87	30.470.218	80,5%	-897.438	-28.950	-0,15	-0,48
01/02/2007	22,72	29.572.780	78,2%	538.458	19.231	0,09	0,32
01/03/2007	22,81	30.111.238	79,6%	-59.830	-1.930	-0,01	-0,03
01/04/2007	22,80	30.051.408	79,4%	2.976.128	99.204	0,47	1,57
01/05/2007	23,27	33.027.536	87,3%	1.581.820	51.026	0,24	0,77
01/06/2007	23,51	34.609.356	91,5%	1.449.996	48.333	0,22	0,73
01/07/2007	23,73	36.059.352	95,3%				
TOTAL ANUAL				-1.318.192		-0,20	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						9.460.082	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
353	0	0	13	1.335,7	5,13	23,30	33.261.360	87,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência GEMET

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Manoel Balbino


MUNICÍPIO: Juazeiro do Norte

B. HIDROGRÁFICA: Salgado

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
37.180.000	100.000	427,00	401,00	120	0	41	1985

ANO: ano de construção do açude

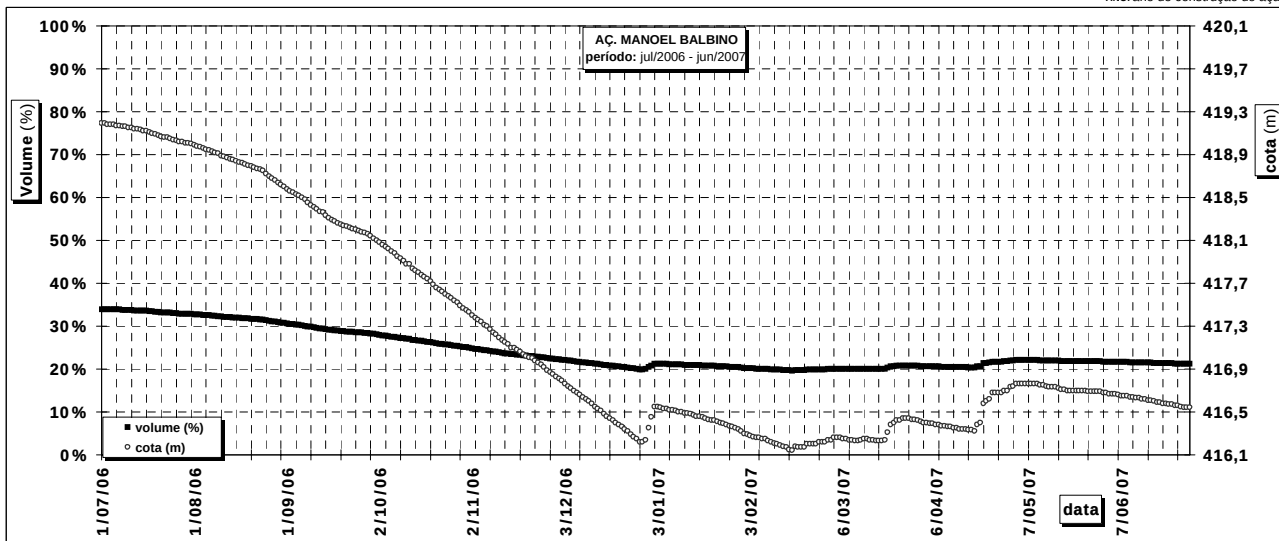

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	419,19	416,35	2,84	1,55	12.615.605	7.591.009	5.024.596	317	165	152

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007		2/5/2007	55	416,14	416,74	1.313.903	89.856	0	217.696	1.621.455

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	416.710	181.720	285.704	443.964	656.575	58.352	0	2.043.025

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA (m)	VOLUME (m³) (%)		VARIAÇÃO VOLUME (m³) (m³/dia)		VARIAÇÃO COTA (m) (cm/dia)	
01/07/2006	419,19	12.615.605	33,9%	-445.224	-14.362	-0,20	-0,65
01/08/2006	418,99	12.170.381	32,7%	-803.607	-25.923	-0,41	-1,32
01/09/2006	418,58	11.366.774	30,6%	-940.762	-31.359	-0,48	-1,60
01/10/2006	418,10	10.426.012	28,0%	-1.159.324	-37.398	-0,67	-2,16
01/11/2006	417,43	9.266.688	24,9%	-1.004.091	-33.470	-0,62	-2,07
01/12/2006	416,81	8.262.597	22,2%	-525.579	-16.954	-0,36	-1,16
01/01/2007	416,45	7.737.018	20,8%	-219.036	-7.066	-0,15	-0,48
01/02/2007	416,30	7.517.982	20,2%	-87.596	-3.128	-0,06	-0,21
01/03/2007	416,24	7.430.386	20,0%	248.220	8.007	0,17	0,55
01/04/2007	416,41	7.678.606	20,7%	467.210	15.574	0,32	1,07
01/05/2007	416,73	8.145.816	21,9%	-73.026	-2.356	-0,05	-0,16
01/06/2007	416,68	8.072.790	21,7%	-218.992	-7.300	-0,15	-0,50
01/07/2007	416,53	7.853.798	21,1%				
TOTAL ANUAL				-4.761.807		-2,66	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						3.821.279	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³) (%)
359	0	0	18	6.642,5	5,50	417,21	9.034.740 24,3%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrato

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Martinópolis


MUNICÍPIO: Martinópolis

B. HIDROGRÁFICA: Coreaú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
23.200.000	1.739.204	99,00	93,48	100	0	151	1984

ANO: ano de construção do açude

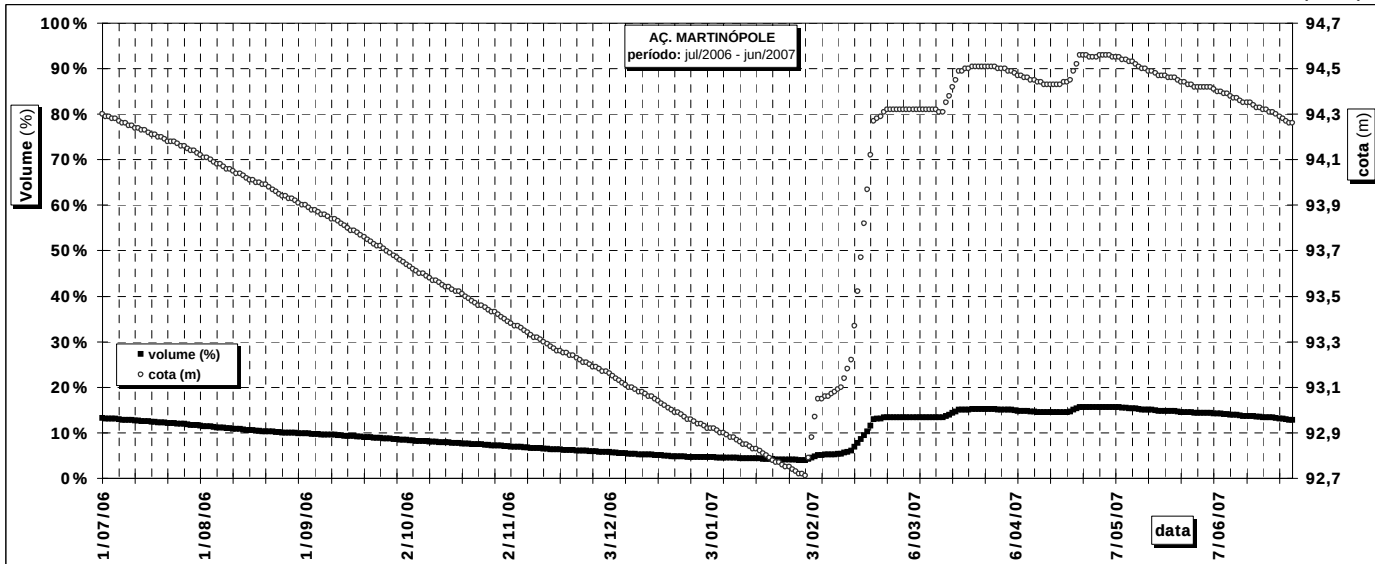

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/1/2007	214	94,30	92,72	1,58	0,74	3.064.007	926.801	2.137.206	115	99	16

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/2/2007	1/2/2007	30/4/2007	63	92,71	94,56	2.907.104	0	0	258.325	3.165.429

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	2.330.734	501.509	333.186	0	0	3.165.429

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	94,30	3.064.007	13,2%	-414.206	-13.361	-0,19	-0,61
01/08/2006	94,11	2.649.801	11,4%	-368.799	-11.897	-0,21	-0,68
01/09/2006	93,90	2.281.002	9,8%	-322.500	-10.750	-0,25	-0,83
01/10/2006	93,65	1.958.502	8,4%	-322.500	-10.403	-0,25	-0,81
01/11/2006	93,40	1.636.002	7,1%	-296.704	-9.890	-0,23	-0,77
01/12/2006	93,17	1.339.298	5,8%	-267.598	-8.632	-0,24	-0,77
01/01/2007	92,93	1.071.700	4,6%	-151.801	-4.897	-0,22	-0,71
01/02/2007	92,71	919.899	4,0%	2.187.700	78.132	1,61	5,75
01/03/2007	94,32	3.107.599	13,4%	392.401	12.658	0,18	0,58
01/04/2007	94,50	3.500.000	15,1%	109.007	3.634	0,05	0,17
01/05/2007	94,55	3.609.007	15,6%	-283.411	-9.142	-0,13	-0,42
01/06/2007	94,42	3.325.596	14,3%	-370.596	-12.353	-0,17	-0,57
01/07/2007	94,25	2.955.000	12,7%				
TOTAL ANUAL				-109.007		-0,05	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)				2.763.844			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
104	0	0	15	2.675,2	1,49	93,83	2.343.200	10,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência: Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Mons. Tabosa


MUNICÍPIO: Mons. Tabosa

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
12.100.000	1.227.409	655,00	643,65	50	0	80	1998

ANO: ano de construção do açude

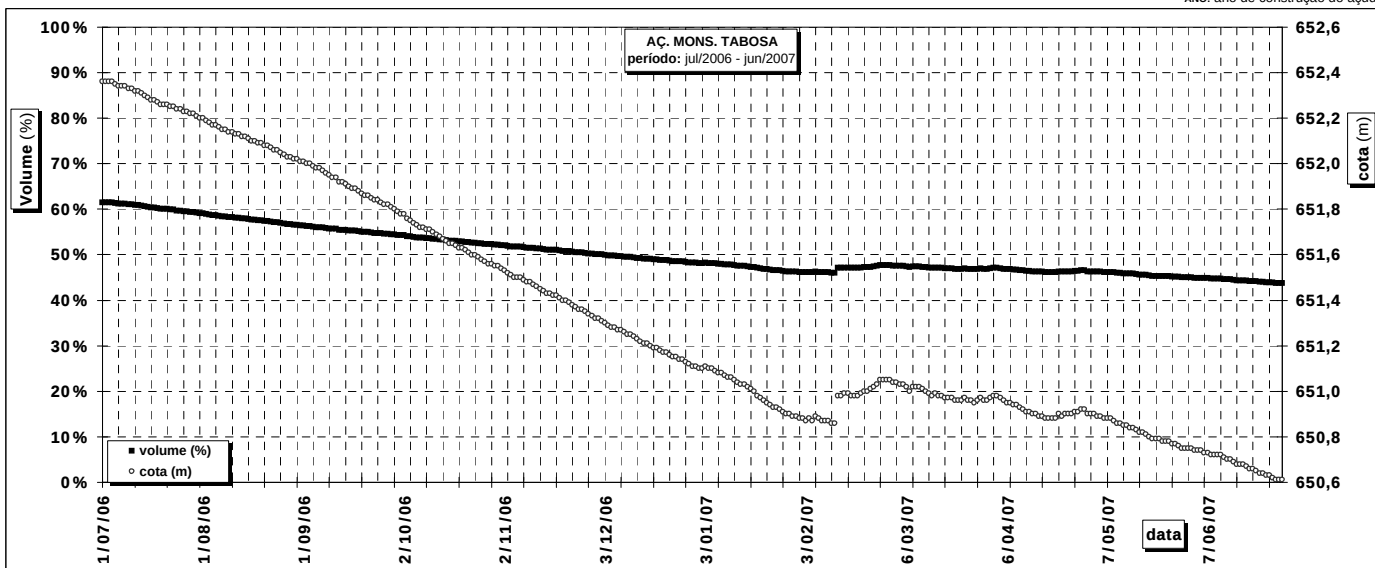

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	10/2/2007	224	652,36	650,87	1,49	0,67	7.435.974	5.573.945	1.862.029	96	96	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
11/2/2007		28/4/2007	43	650,86	651,05	357.937	0	0	143.050	500.987

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	24.292	334.048	108.104	105.493	0	0	571.937

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	652,36	7.435.974	61,5%	-282.619	-9.117	-0,16	-0,52
01/08/2006	652,20	7.153.355	59,1%	-335.671	-10.828	-0,19	-0,61
01/09/2006	652,01	6.817.684	56,3%	-256.352	-8.545	-0,23	-0,77
01/10/2006	651,78	6.561.332	54,2%	-260.456	-8.402	-0,24	-0,77
01/11/2006	651,54	6.300.876	52,1%	-238.668	-7.956	-0,22	-0,73
01/12/2006	651,32	6.062.208	50,1%	-238.734	-7.701	-0,22	-0,71
01/01/2007	651,10	5.823.474	48,1%	-238.668	-7.699	-0,22	-0,71
01/02/2007	650,88	5.584.806	46,2%	184.431	6.587	0,17	0,61
01/03/2007	651,05	5.769.237	47,7%	-86.819	-2.801	-0,08	-0,26
01/04/2007	650,97	5.682.418	47,0%	-75.891	-2.530	-0,07	-0,23
01/05/2007	650,90	5.606.527	46,3%	-162.777	-5.251	-0,15	-0,48
01/06/2007	650,75	5.443.750	45,0%	-162.776	-5.426	-0,15	-0,50
01/07/2007	650,60	5.280.974	43,6%				
TOTAL ANUAL				-2.155.000		-1,76	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						2.419.413	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO	
356	0	0	12	7.722,0	5,34	651,33	6.098.400	50,4%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência: Crateús

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Mundaú


MUNICÍPIO: Uruburetama

B. HIDROGRÁFICA: Litoral

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
21.300.000	147.960	166,38	138,00	54	0	36	1988

ANO: ano de construção do açude

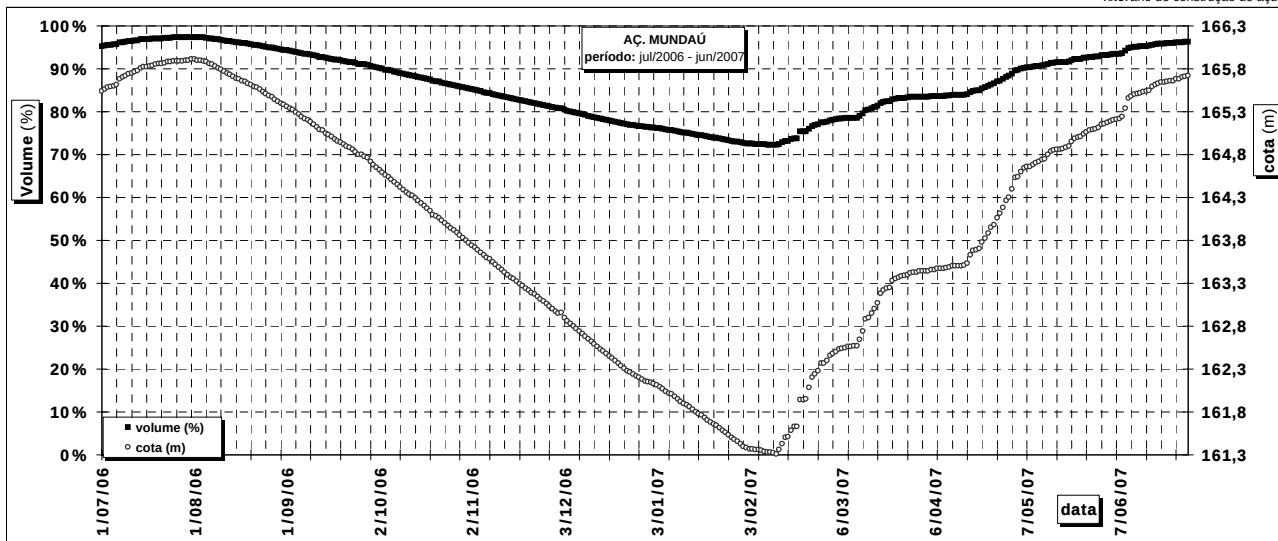

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	165,54	161,32	4,22	1,88	20.294.092	15.388.528	4.905.564	252	63	189

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	29/6/2007	137	161,31	165,71	5.131.715	300.672	0	419.592	5.851.979

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
660.111	0	0	0	0	43.644	0	1.309.171	1.389.345	1.152.699	1.152.793	848.998	6.556.761

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	165,54	20.294.092	95,3%	443.088	14.293	0,37	1,19
01/08/2006	165,91	20.737.180	97,4%	-658.630	-21.246	-0,55	-1,77
01/09/2006	165,36	20.078.550	94,3%	-850.232	-28.341	-0,71	-2,37
01/10/2006	164,65	19.228.318	90,3%	-1.053.788	-33.993	-0,88	-2,84
01/11/2006	163,77	18.174.530	85,3%	-981.958	-32.732	-0,82	-2,73
01/12/2006	162,95	17.192.572	80,7%	-936.493	-30.209	-0,81	-2,61
01/01/2007	162,14	16.256.079	76,3%	-782.925	-25.256	-0,74	-2,39
01/02/2007	161,40	15.473.154	72,6%	1.060.789	37.885	1,00	3,57
01/03/2007	162,40	16.533.943	77,6%	1.245.409	40.174	1,04	3,35
01/04/2007	163,44	17.779.352	83,5%	1.029.852	34.328	0,86	2,87
01/05/2007	164,30	18.809.204	88,3%	1.017.864	32.834	0,85	2,74
01/06/2007	165,15	19.827.068	93,1%	682.584	22.753	0,57	1,90
01/07/2007	165,72	20.509.652	96,3%				
TOTAL ANUAL				215.560		0,18	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.711.233	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	31	1.185,7	15,63	163,93	18.381.900	86,3%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Muquém


MUNICÍPIO: Cariús

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
47.643.000	5.099.710	267,00	252,80	110	0	296	2000

ANO: ano de construção do açude

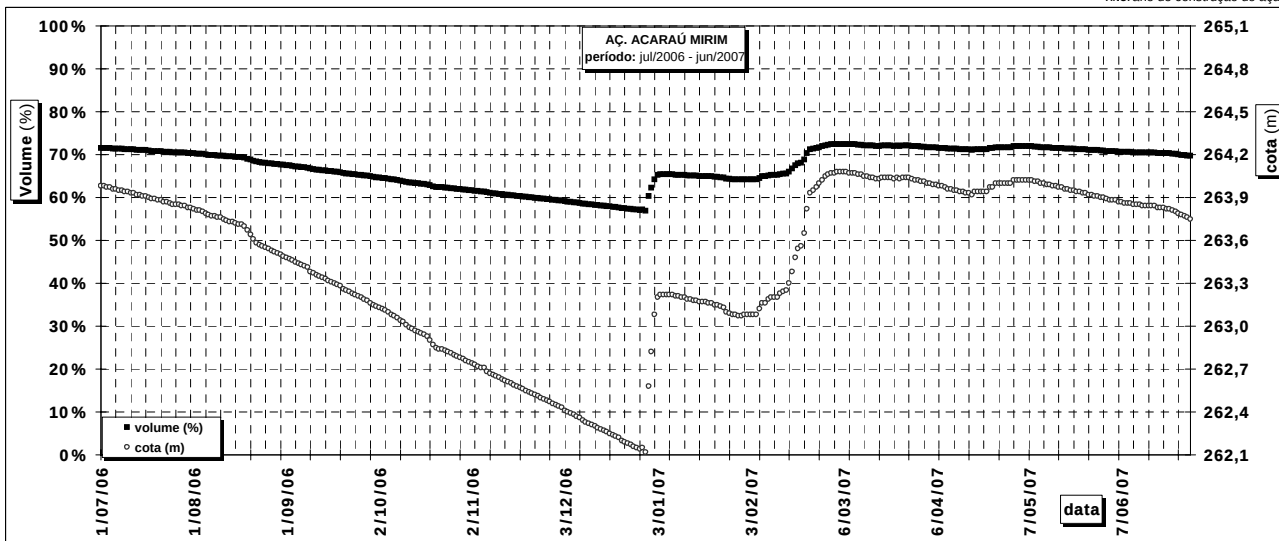

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	263,98	262,58	1,40	0,77	34.088.540	28.757.812	5.330.728	337	309	28

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	5/2/2007	1/5/2007	88	262,82	264,08	5.975.142	133.056	0	1.449.111	7.557.309

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	2.734.665	1.785.524	4.701.459	433.738	472.790	126.697	0	10.254.873

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	263,98	34.088.540	71,5%	-621.990	-20.064	-0,16	-0,52
01/08/2006	263,82	33.466.550	70,2%	-1.321.688	-42.635	-0,34	-1,10
01/09/2006	263,48	32.144.862	67,5%	-1.321.688	-44.056	-0,34	-1,13
01/10/2006	263,14	30.823.174	64,7%	-1.449.660	-46.763	-0,39	-1,26
01/11/2006	262,75	29.373.514	61,7%	-1.122.652	-37.422	-0,31	-1,03
01/12/2006	262,44	28.250.862	59,3%	1.376.184	44.393	0,38	1,23
01/01/2007	262,82	29.627.046	62,2%	962.778	31.057	0,26	0,84
01/02/2007	263,08	30.589.824	64,2%	3.826.524	136.662	0,98	3,50
01/03/2007	264,06	34.416.348	72,2%	-208.376	-6.722	-0,05	-0,16
01/04/2007	264,01	34.207.972	71,8%	-41.728	-1.391	-0,01	-0,03
01/05/2007	264,00	34.166.244	71,7%	-388.756	-12.541	-0,10	-0,32
01/06/2007	263,90	33.777.488	70,9%	-583.082	-19.436	-0,15	-0,50
01/07/2007	263,75	33.194.406	69,7%				
TOTAL ANUAL				-894.134		-0,23	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						14.643.017	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRESC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
358	0	0	26	1.695,7	4,27	263,43	31.968.453	67,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência/guatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Nova Floresta


MUNICÍPIO: Jaguaribe

B. HIDROGRÁFICA: Médio Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
7.610.000	240.000	111,00	104,00	98	0	160	1926

ANO: ano de construção do açude

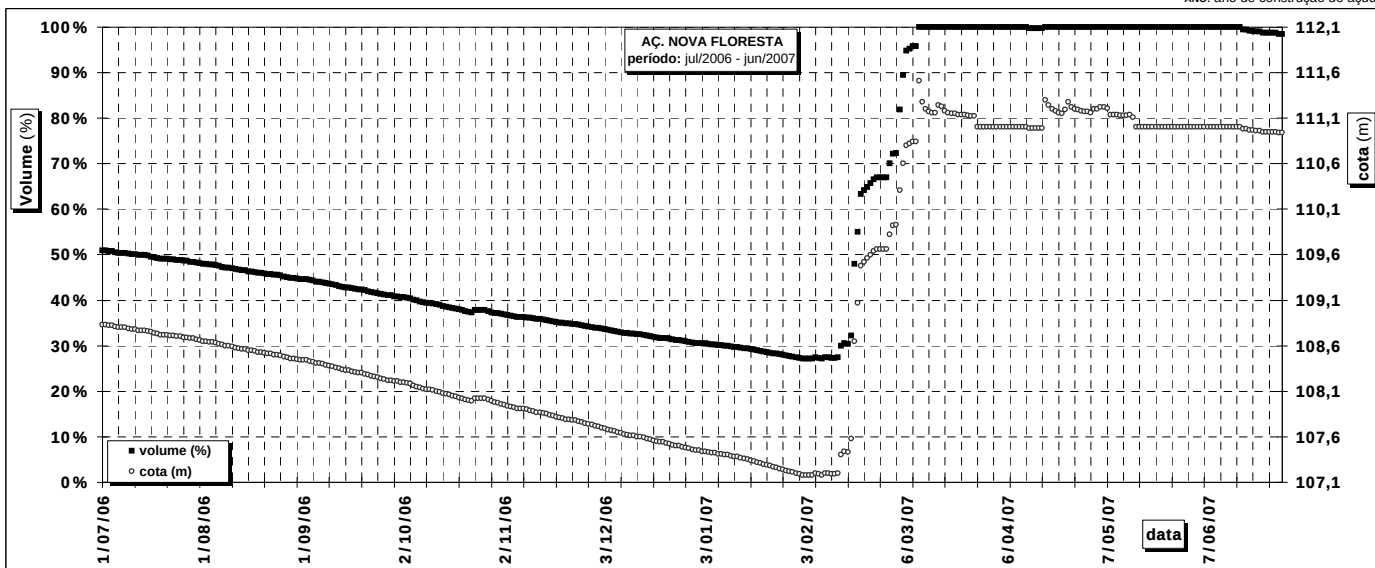

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	7/2/2007	221	108,83	107,19	1,64	0,74	3.870.902	2.080.502	1.790.400	93	84	9

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
8/2/2007	8/2/2007	17/6/2007	118	107,18	111,51	5.578.001	0	53.327.828	458.025	59.363.854

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	51.221	0	0	0	3.401.373	25.050.063	16.809.700	13.179.737	0	58.492.094

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	108,83	3.870.902	50,9%	-221.400	-7.142	-0,18	-0,58
01/08/2006	108,65	3.649.502	48,0%	-258.299	-8.332	-0,21	-0,68
01/09/2006	108,44	3.391.203	44,6%	-295.207	-9.840	-0,24	-0,80
01/10/2006	108,20	3.095.996	40,7%	-283.997	-9.161	-0,24	-0,77
01/11/2006	107,96	2.811.999	37,0%	-237.500	-7.917	-0,25	-0,83
01/12/2006	107,71	2.574.499	33,8%	-247.002	-7.968	-0,26	-0,84
01/01/2007	107,45	2.327.497	30,6%	-246.995	-7.968	-0,26	-0,84
01/02/2007	107,19	2.080.502	27,3%	3.254.098	116.218	2,63	9,39
01/03/2007	109,82	5.334.600	70,1%	2.275.400	73.400	1,18	3,81
01/04/2007	111,00	7.610.000	100,0%	0	0	0,17	0,57
01/05/2007	111,17	7.610.000	100,0%	0	0	-0,17	-0,55
01/06/2007	111,00	7.610.000	100,0%	-139.999	-4.667	-0,07	-0,23
01/07/2007	110,93	7.470.001	98,2%				
TOTAL ANUAL				3.599.099		2,10	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						2.690.762	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	46	107	47,5	2,91	109,06	4.512.730	59,3%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência: Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Olho d'Água


MUNICÍPIO: Várzea Alegre

B. HIDROGRÁFICA: Salgado

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
21.000.000	2.355.000	350,00	336,50	50	0	73	1998

ANO: ano de construção do açude

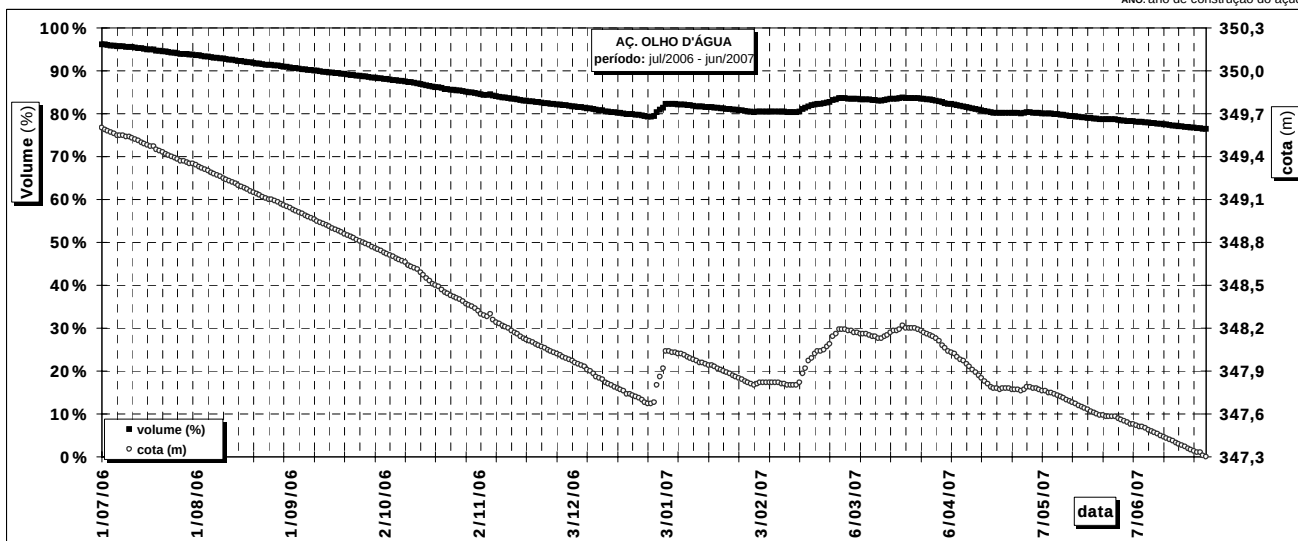

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	349,60	347,80	1,80	0,98	20.190.012	16.873.980	3.316.032	209	148	61

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007		1/5/2007	51	347,76	348,22	1.236.904	12.960	0	217.219	1.467.083

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	48.213	376.101	340.409	835.571	198.902	48.811	43.122	0	1.891.129

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	349,60	20.190.012	96,1%	-526.520	-16.985	-0,26	-0,84
01/08/2006	349,34	19.663.492	93,6%	-607.474	-19.596	-0,30	-0,97
01/09/2006	349,04	19.056.018	90,7%	-539.936	-17.998	-0,30	-1,00
01/10/2006	348,74	18.516.082	88,2%	-705.988	-22.774	-0,40	-1,29
01/11/2006	348,34	17.810.094	84,8%	-616.910	-20.564	-0,35	-1,17
01/12/2006	347,99	17.193.184	81,9%	-218.408	-7.045	-0,13	-0,42
01/01/2007	347,86	16.974.776	80,8%	-100.796	-3.251	-0,06	-0,19
01/02/2007	347,80	16.873.980	80,4%	671.374	23.978	0,39	1,39
01/03/2007	348,19	17.545.354	83,5%	-88.228	-2.846	-0,05	-0,16
01/04/2007	348,14	17.457.126	83,1%	-633.544	-21.118	-0,37	-1,23
01/05/2007	347,77	16.823.582	80,1%	-335.970	-10.838	-0,20	-0,65
01/06/2007	347,57	16.487.612	78,5%	-470.398	-15.680	-0,28	-0,93
01/07/2007	347,29	16.017.214	76,3%				
TOTAL ANUAL				-4.172.798		-2,31	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						3.472.932	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DÍAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	12	4.053,1	10,12	348,27	17.703.000	84,3%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrato

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Orós


MUNICÍPIO: Orós

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
1.940.000.000	16.870.000	199,50	169,00	180	11.579	25.696	1962

ANO: ano de construção do açude

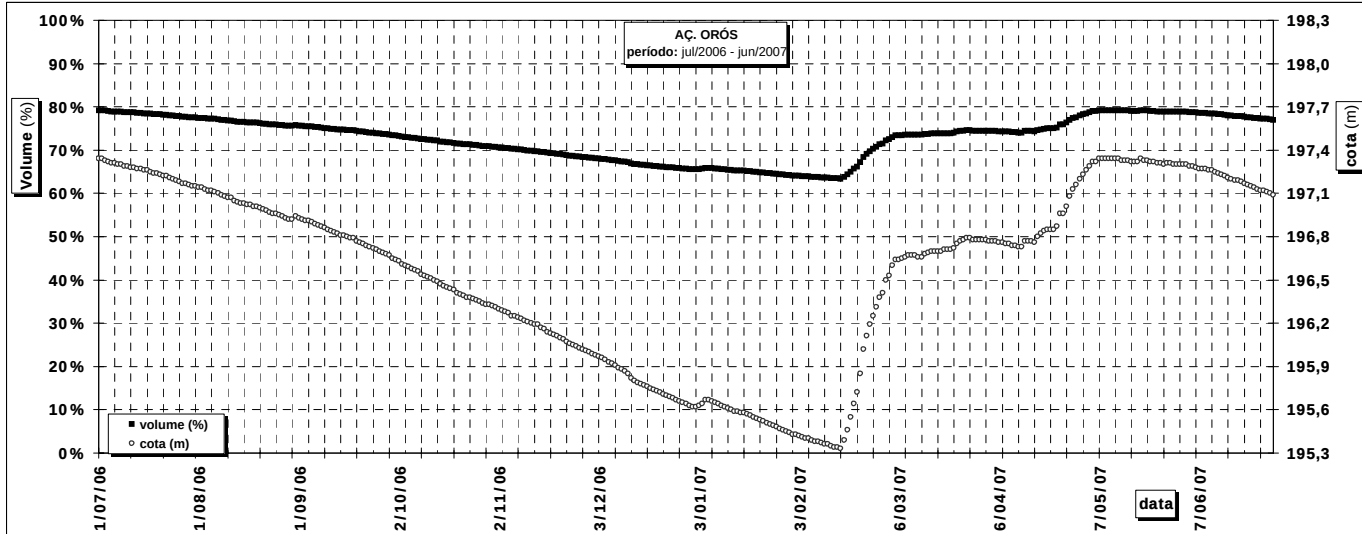

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	197,34	195,63	1,71	0,93	1.535.756.416	1.271.555.200	264.201.216	16.709	12.538	4.171

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	16/2/2007	27/5/2007	86	195,33	197,34	330.715.904	11.024.640	0	34.347.687	376.088.231

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	5.394.068	0	0	0	0	12.662.924	167.248.475	74.184.361	87.317.113	35.253.223	0	382.060.164

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	197,34	1.535.756.416	79,2%	-34.009.472	-1.097.080	-0,20	-0,65
01/08/2006	197,14	1.501.746.944	77,4%	-34.625.152	-1.116.940	-0,21	-0,68
01/09/2006	196,93	1.467.121.792	75,6%	-44.812.672	-1.493.756	-0,29	-0,97
01/10/2006	196,64	1.422.309.120	73,3%	-50.995.200	-1.645.006	-0,33	-1,06
01/11/2006	196,31	1.371.313.920	70,7%	-49.304.704	-1.643.490	-0,32	-1,07
01/12/2006	195,99	1.322.009.216	68,1%	-51.856.896	-1.672.803	-0,37	-1,19
01/01/2007	195,62	1.270.152.320	65,5%	-26.628.864	-858.996	-0,19	-0,61
01/02/2007	195,43	1.243.523.456	64,1%	143.244.416	5.115.872	0,98	3,50
01/03/2007	196,41	1.386.767.872	71,5%	57.175.296	1.844.364	0,37	1,19
01/04/2007	196,78	1.443.943.168	74,4%	68.006.272	2.266.876	0,42	1,40
01/05/2007	197,20	1.511.949.440	77,9%	17.006.080	548.583	0,10	0,32
01/06/2007	197,30	1.528.955.520	78,8%	-35.711.616	-1.190.387	-0,21	-0,70
01/07/2007	197,09	1.493.243.904	77,0%				
TOTAL ANUAL				-42.512.512		-0,25	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						300.781.536	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	17	1.853,4	9,25	196,57	1.412.320.000	72,8%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência/guatu


ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Pacajus	MUNICÍPIO: Pacajus	B. HIDROGRÁFICA: Metropolitanas
-----------------------	---------------------------	--

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
240.000.000	34.710.000	38,00	30,00	867	1.209	4.492	1960

ANO: ano de construção do açude

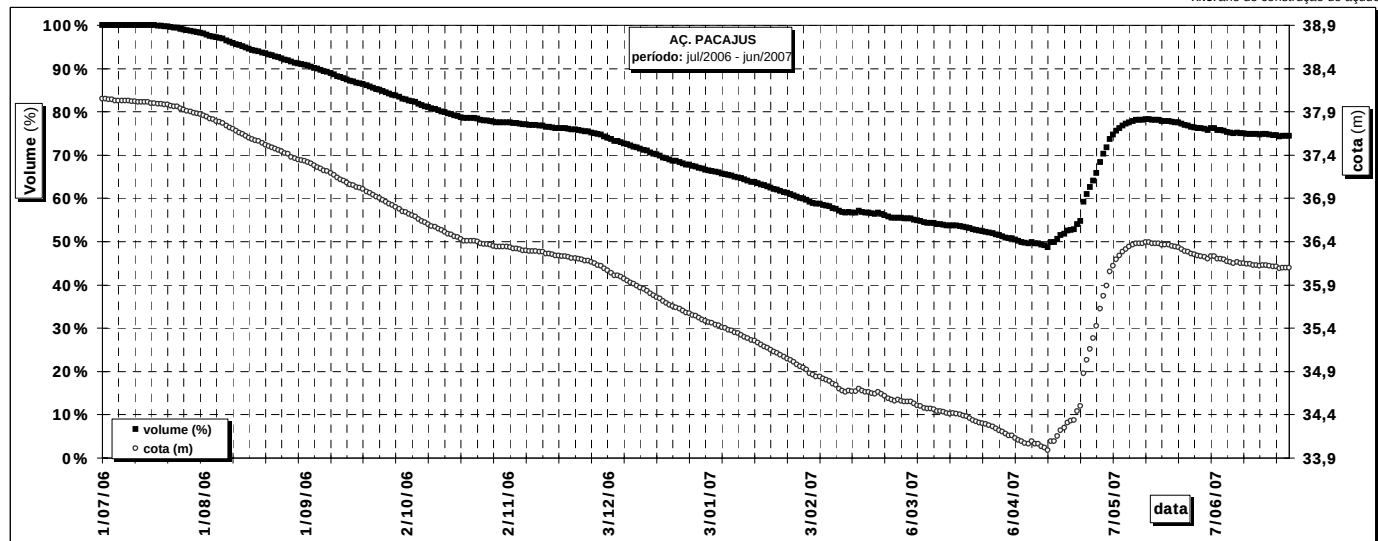

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

--

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	16/4/2007	289	38,05	34,02	4,03	1,39	240.000.000	117.793.016	122.206.984	4.894	1.507	3.387

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
17/4/2007	17/4/2007	27/6/2007	45	33,99	36,39	72.707.760	959.040	0	2.692.700	76.359.500

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
11.268.958	0	0	0	0	0	0	2.461.932	745.861	39.047.560	35.594.435	2.777.598	91.896.344

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	38,05	240.000.000	100,0%	-4.596.176	-148.264	-0,19	-0,61
01/08/2006	37,86	235.403.824	98,1%	-17.399.856	-561.286	-0,53	-1,71
01/09/2006	37,33	218.003.968	90,8%	-18.783.968	-626.132	-0,58	-1,93
01/10/2006	36,75	199.220.000	83,0%	-13.038.000	-420.581	-0,41	-1,32
01/11/2006	36,34	186.182.000	77,6%	-6.996.032	-233.201	-0,22	-0,73
01/12/2006	36,12	179.185.968	74,7%	-18.810.960	-606.805	-0,62	-2,00
01/01/2007	35,50	160.375.008	66,8%	-16.684.048	-538.195	-0,56	-1,81
01/02/2007	34,94	143.690.960	59,9%	-10.696.920	-382.033	-0,38	-1,36
01/03/2007	34,56	132.994.040	55,4%	-9.007.992	-290.580	-0,32	-1,03
01/04/2007	34,24	123.986.048	51,7%	29.791.120	993.037	1,04	3,47
01/05/2007	35,28	153.777.168	64,1%	29.542.832	952.995	0,97	3,13
01/06/2007	36,25	183.320.000	76,4%	-4.770.048	-159.002	-0,15	-0,50
01/07/2007	36,10	178.549.952	74,4%				
TOTAL ANUAL				-61.450.048		-1,95	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						45.827.760	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	38	953,2	5,66	36,03	177.600.000	74,0%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaGEMET

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Pacoti


MUNICÍPIO: Horizonte

B. HIDROGRÁFICA: Metropolitanas

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
380.000.000	21.740.000	45,00	31,00	790	218	1.080	1981

ANO: ano de construção do açude

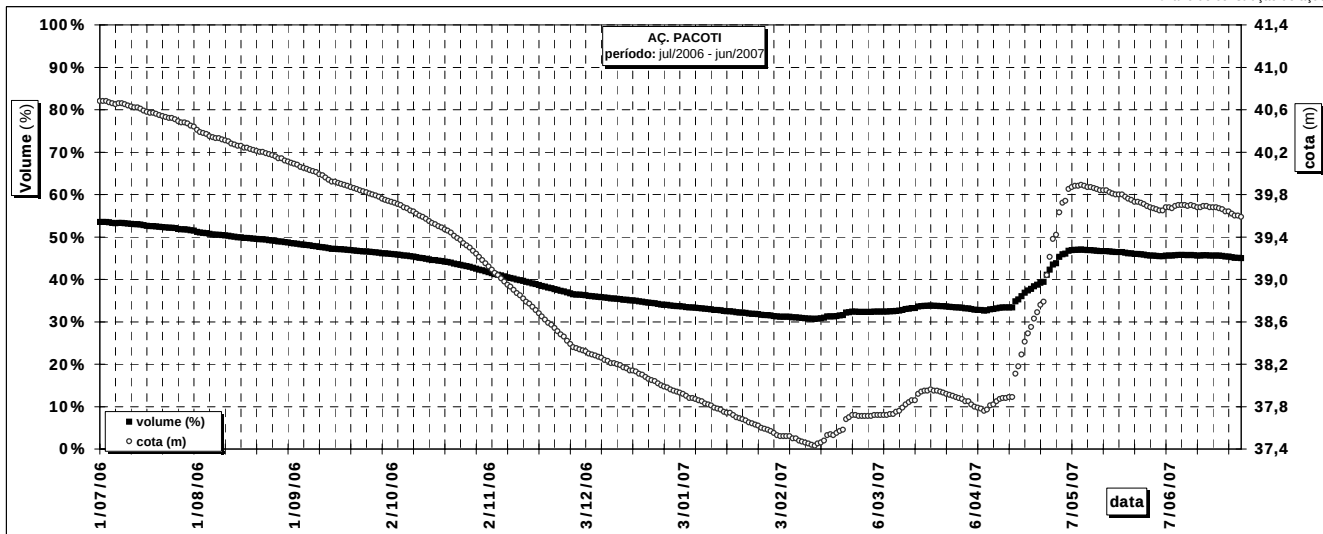

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO	COTA FIM	REDUÇÃO COTA	REDUÇÃO MÉDIA COTA	VOLUME INÍCIO	VOLUME FIM	REDUÇÃO VOLUME	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO	VAZÃO MÉDIA EVAPOR.	VAZÃO RESIDUAL
			(m)	(m)	(m)	(cm/dia)	(m³)	(m³)	(m³)	(L/s)	(L/s)	(L/s)
1/7/2006	13/2/2007	227	40,68	37,44	3,24	1,43	203.240.016	116.587.168	86.652.848	4.418	1.501	2.917

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA	COTA MÁXIMA	VOLUME ACRESC.	VOLUME LIBER.	VOLUME SANGR.	VOLUME EVAPOR.	APORTE D'ÁGUA TOTAL
				(m)	(m)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
14/2/2007	10/4/2007	17/6/2007	83	37,43	39,89	69.259.880	60.480	0	4.592.922	73.913.282

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
568.241	0	0	0	0	0	0	7.817.056	6.733.324	42.721.072	13.841.323	2.888.420	74.569.436

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	40,68	203.240.016	53,5%	-8.707.520	-280.888	-0,27	-0,87
01/08/2006	40,41	194.532.496	51,2%	-10.319.984	-332.903	-0,32	-1,03
01/09/2006	40,09	184.212.512	48,5%	-9.371.888	-312.396	-0,35	-1,17
01/10/2006	39,74	174.840.624	46,0%	-15.752.848	-508.156	-0,59	-1,90
01/11/2006	39,15	159.087.776	41,9%	-20.970.176	-699.006	-0,81	-2,70
01/12/2006	38,34	138.117.600	36,3%	-10.090.432	-325.498	-0,40	-1,29
01/01/2007	37,94	128.027.168	33,7%	-8.923.184	-287.845	-0,39	-1,26
01/02/2007	37,55	119.103.984	31,3%	3.660.792	130.743	0,16	0,57
01/03/2007	37,71	122.764.776	32,3%	3.889.648	125.473	0,17	0,55
01/04/2007	37,88	126.654.424	33,3%	38.639.848	1.287.995	1,50	5,00
01/05/2007	39,38	165.294.272	43,5%	8.053.376	259.786	0,30	0,97
01/06/2007	39,68	173.347.648	45,6%	-2.656.384	-88.546	-0,10	-0,33
01/07/2007	39,58	170.691.264	44,9%				
TOTAL ANUAL				-32.548.752		-1,10	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						39.232.496	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC.	TEMPO DE RESID.	PROFUND. MÉDIA	COTA MÉDIA	V. ARMAZ. MÉDIO	
			(cm/dia)	(dias)	(m)	(m)	(m³)	(%)
365	0	0	25	1.860,0	5,80	39,00	156.180.000	41,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência: GEMET

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Parambu


MUNICÍPIO: Parambu

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
8.530.000	718.000	484,50	476,00	67	0	118	1992

ANO: ano de construção do açude

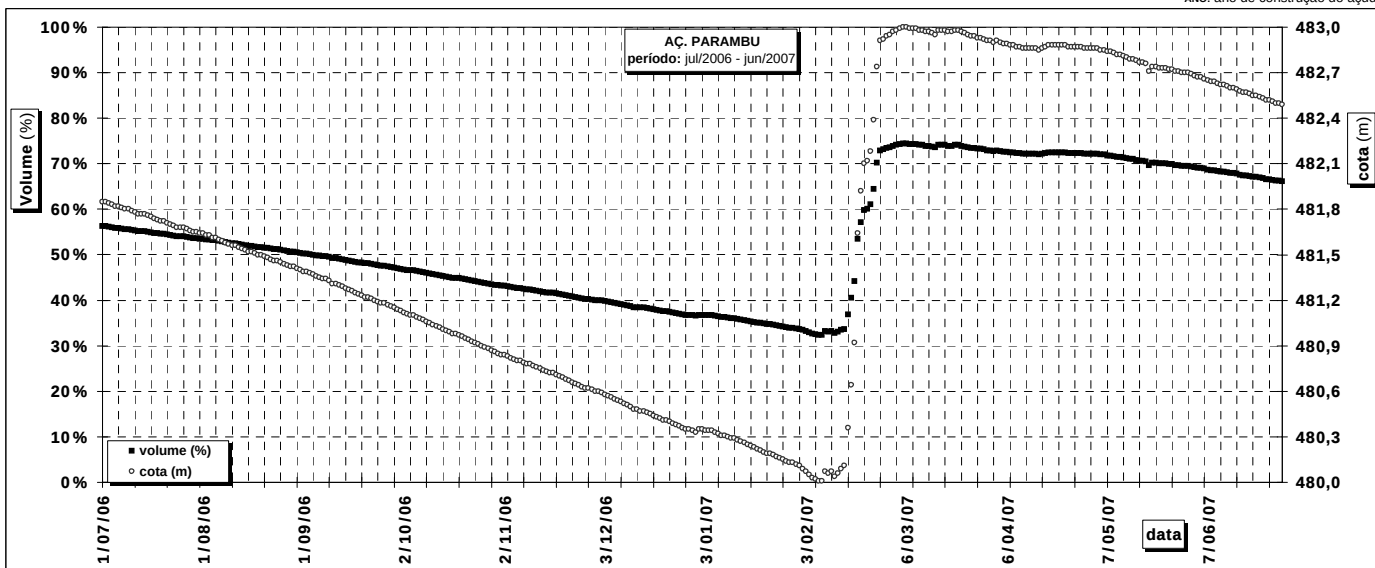

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	481,85	480,07	1,78	0,79	4.794.257	2.827.358	1.966.899	101	101	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	20/5/2007	64	480,04	483,00	3.703.161	0	0	200.328	3.903.489

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	31.064	0	3.690.293	177.567	82.471	52.731	0	4.034.126

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	481,85	4.794.257	56,2%	-232.041	-7.485	-0,21	-0,68
01/08/2006	481,64	4.562.216	53,5%	-276.250	-8.911	-0,25	-0,81
01/09/2006	481,39	4.285.966	50,2%	-287.310	-9.577	-0,26	-0,87
01/10/2006	481,13	3.998.656	46,9%	-320.460	-10.337	-0,29	-0,94
01/11/2006	480,84	3.678.196	43,1%	-265.189	-8.840	-0,24	-0,80
01/12/2006	480,60	3.413.007	40,0%	-276.250	-8.911	-0,25	-0,81
01/01/2007	480,35	3.136.757	36,8%	-265.223	-8.556	-0,24	-0,77
01/02/2007	480,11	2.871.534	33,7%	-3.404.233	121.580	2,84	10,14
01/03/2007	482,95	6.275.767	73,6%	-55.412	-1.787	-0,04	-0,13
01/04/2007	482,91	6.220.355	72,9%	-69.275	-2.309	-0,05	-0,17
01/05/2007	482,86	6.151.080	72,1%	-221.563	-7.147	-0,16	-0,52
01/06/2007	482,70	5.929.517	69,5%	-304.702	-10.157	-0,22	-0,73
01/07/2007	482,48	5.624.815	65,9%				
TOTAL ANUAL				830.558		0,63	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)				2.917.606			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO	
353	0	0	72	771,8	3,81	481,60	4.589.140	53,8%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência: Iguatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Patos


MUNICÍPIO: Sobral

B. HIDROGRÁFICA: Litoral

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
7.550.000	911.999	106,00	100,60	180	627	969	1956

ANO: ano de construção do açude

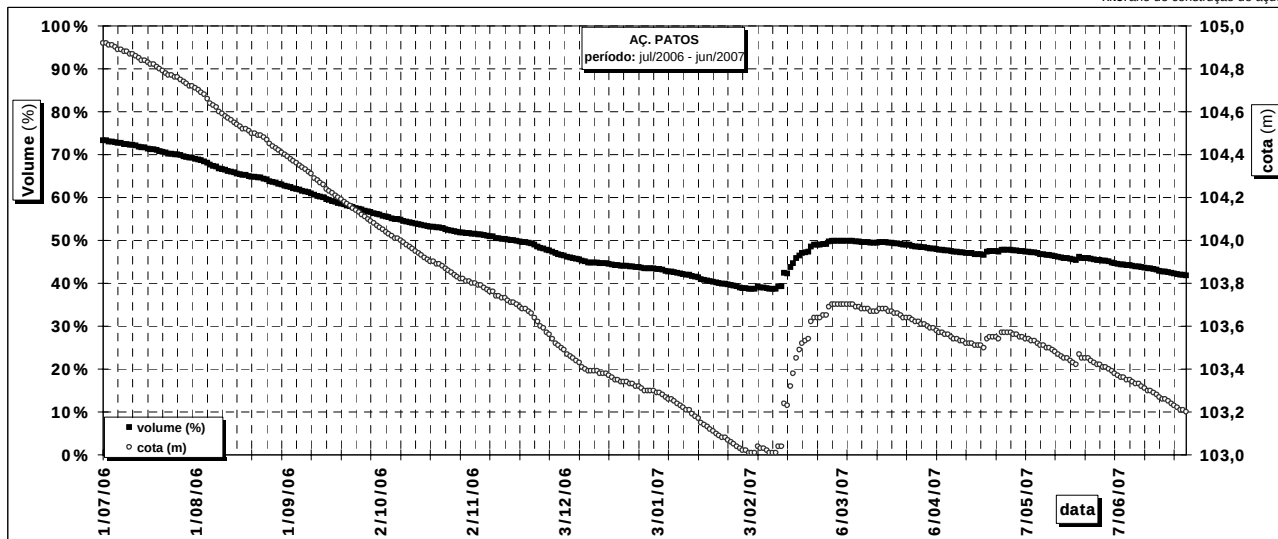

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	2/2/2007	216	104,92	103,02	1,90	0,88	5.528.397	2.934.396	2.594.001	138	100	38

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
3/2/2007	3/5/2007	24/5/2007	60	103,01	103,70	1.061.394	41.472	0	145.760	1.248.626

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	970.689	96.190	116.845	64.902	0	1.248.626

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	104,92	5.528.397	73,2%	-319.198	-10.297	-0,21	-0,68
01/08/2006	104,71	5.209.199	69,0%	-486.400	-15.690	-0,32	-1,03
01/09/2006	104,39	4.722.799	62,6%	-486.399	-16.213	-0,32	-1,07
01/10/2006	104,07	4.236.400	56,1%	-338.203	-10.910	-0,26	-0,84
01/11/2006	103,81	3.898.197	51,6%	-365.994	-12.200	-0,30	-1,00
01/12/2006	103,51	3.532.203	46,8%	-256.199	-8.264	-0,21	-0,68
01/01/2007	103,30	3.276.004	43,4%	-341.608	-11.020	-0,28	-0,90
01/02/2007	103,02	2.934.396	38,9%	768.606	27.450	0,63	2,25
01/03/2007	103,65	3.703.002	49,0%	-36.599	-1.181	-0,03	-0,10
01/04/2007	103,62	3.666.403	48,6%	-61.003	-2.033	-0,05	-0,17
01/05/2007	103,57	3.605.400	47,8%	-183.002	-5.903	-0,15	-0,48
01/06/2007	103,42	3.422.398	45,3%	-268.402	-8.947	-0,22	-0,73
01/07/2007	103,20	3.153.996	41,8%				
TOTAL ANUAL				-2.374.401		-1,72	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						2.496.878	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
362	0	0	20	2.207,0	2,98	103,76	3.880.700	51,4%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÜDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇÜDE: PATU


MUNICÍPIO: Senador Pompeu

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
71.829.000	3.409.096	130,00	112,09	90	128	1.028	1988

ANO: ano de construção do açüde

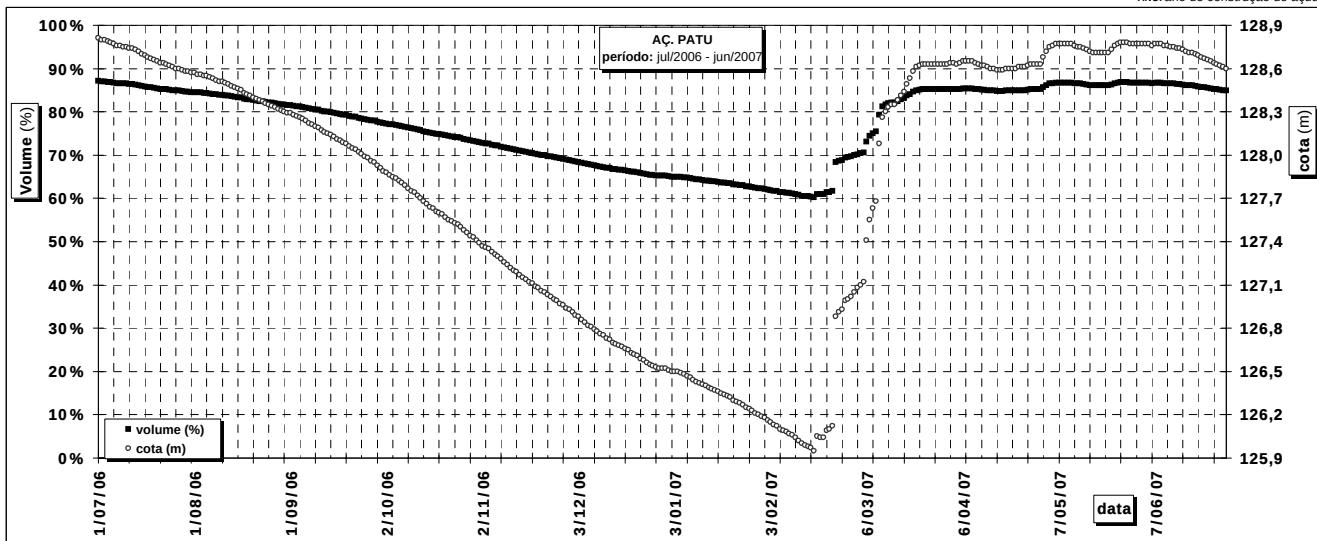

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	18/2/2007	232	128,81	126,05	2,76	1,19	62.577.300	43.819.520	18.757.780	935	550	385

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIM APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
19/2/2007	19/2/2007	6/6/2007	92	126,04	128,78	19.676.892	1.249.510	0	1.558.326	22.484.728

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	7.413.254	12.186.545	1.187.104	2.078.974	167.031	23.032.908

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	128,81	62.577.300	87,1%	-1.865.796	-60.187	-0,24	-0,77
01/08/2006	128,57	60.711.504	84,5%	-2.176.960	-70.225	-0,28	-0,90
01/09/2006	128,29	58.534.544	81,5%	-2.957.448	-98.582	-0,40	-1,33
01/10/2006	127,89	55.577.096	77,4%	-3.195.000	-103.065	-0,50	-1,61
01/11/2006	127,39	52.382.096	72,9%	-3.067.172	-102.239	-0,48	-1,60
01/12/2006	126,91	49.314.924	68,7%	-2.556.012	-82.452	-0,40	-1,29
01/01/2007	126,51	46.758.912	65,1%	-2.108.712	-68.023	-0,33	-1,06
01/02/2007	126,18	44.650.200	62,2%	5.367.580	191.699	0,84	3,00
01/03/2007	127,02	50.017.780	69,6%	11.160.172	360.006	1,61	5,19
01/04/2007	128,63	61.177.952	85,2%	0	0	0,00	0,00
01/05/2007	128,63	61.177.952	85,2%	1.088.420	35.110	0,14	0,45
01/06/2007	128,77	62.266.372	86,7%	-1.399.464	-46.649	-0,18	-0,60
01/07/2007	128,59	60.866.908	84,7%				
TOTAL ANUAL				-1.710.392		-0,22	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						14.226.239	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	76	1.138,3	7,99	127,80	55.451.988	77,2%

O monitoramento deste açüde é realizado pela gerência Quixeramobim

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Pau Preto


MUNICÍPIO: Potengi

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
1.770.000		998,09		36	0	805	1958

ANO: ano de construção do açude

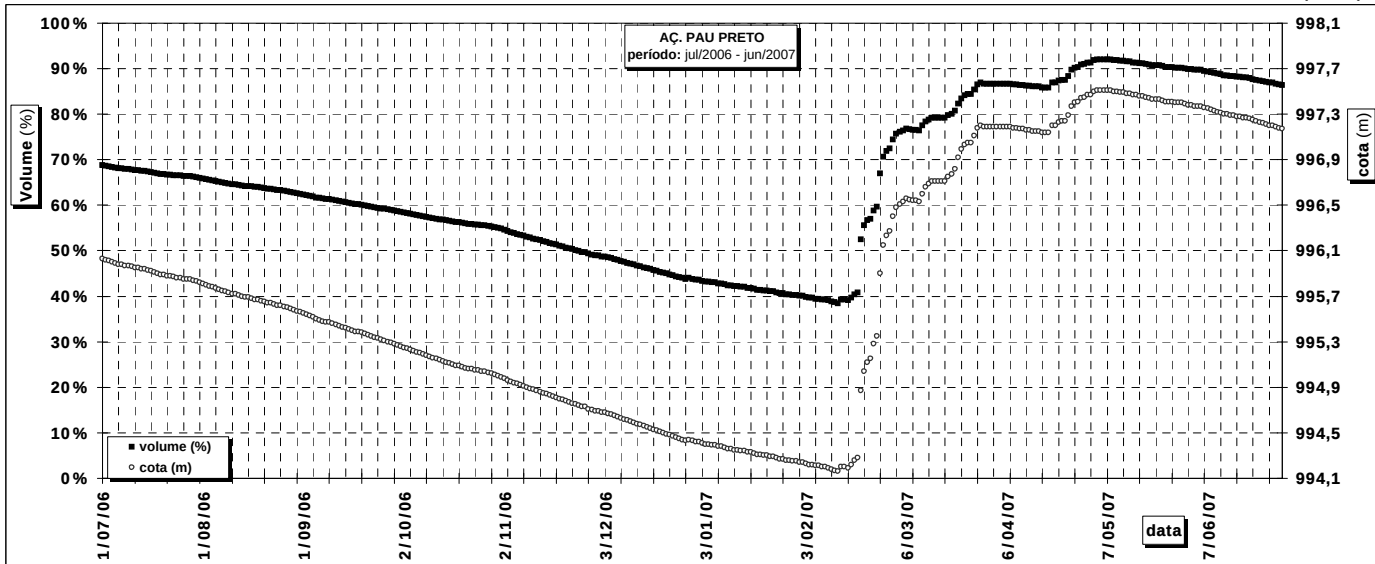

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	12/2/2007	226	996,03	994,17	1,86	0,82	1.217.351	683.934	533.417	27	27	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
13/2/2007	13/2/2007	3/5/2007	67	994,16	997,50	977.304	0	0	108.676	1.085.980

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	6.257	0	630.647	308.398	127.893	21.484	0	1.094.679

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	996,03	1.217.351	68,8%	-52.794	-1.703	-0,22	-0,71
01/08/2006	995,81	1.164.557	65,8%	-61.175	-1.973	-0,26	-0,84
01/09/2006	995,55	1.103.382	62,3%	-68.227	-2.274	-0,29	-0,97
01/10/2006	995,26	1.035.155	58,5%	-64.673	-2.086	-0,27	-0,87
01/11/2006	994,99	970.482	54,8%	-104.829	-3.494	-0,30	-1,00
01/12/2006	994,69	865.653	48,9%	-94.358	-3.044	-0,27	-0,87
01/01/2007	994,42	771.295	43,6%	-62.897	-2.029	-0,18	-0,58
01/02/2007	994,24	708.398	40,0%	573.606	20.486	2,03	7,25
01/03/2007	996,27	1.282.004	72,4%	252.492	8.145	0,92	2,97
01/04/2007	997,19	1.534.496	86,7%	82.276	2.743	0,28	0,93
01/05/2007	997,47	1.616.772	91,3%	-26.439	-853	-0,09	-0,29
01/06/2007	997,38	1.590.333	89,8%	-61.720	-2.057	-0,21	-0,70
01/07/2007	997,17	1.528.613	86,4%				
TOTAL ANUAL				311.262		1,14	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)				1.148.721			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO	
							(m³)	(%)
327	0	0	59	590,2	2,31	995,77	1.154.040	65,2%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência: Iguatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÜDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇÜDE: Pedras Brancas


MUNICÍPIO: Quixadá

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
434.040.000	607.000	127,00	105,00	70	215	1.985	1978

ANO: ano de construção do açüde

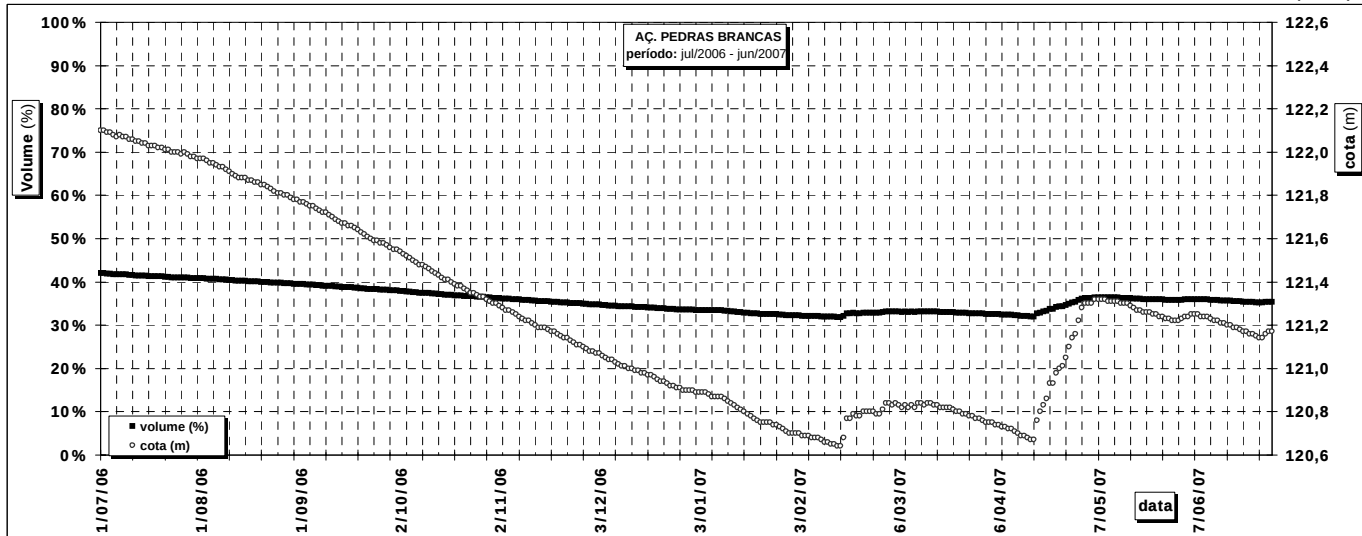

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	14/2/2007	228	122,10	120,65	1,45	0,64	182.086.944	138.373.792	43.713.152	2.219	2.219	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FÍRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
15/2/2007		28/6/2007	52	120,64	121,32	29.080.992	698.277	0	5.175.614	34.954.883

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
1.042.034	0	0	0	0	0	0	7.237.110	3.627.196	17.806.233	3.480.831	2.832.069	36.025.473

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA (m)	VOLUME (m³)	VOLUME (%)	VARIAÇÃO VOLUME (m³)	VARIAÇÃO VOLUME (m³/dia)	VARIAÇÃO COTA (m)	VARIAÇÃO COTA (cm/dia)
01/07/2006	122,10	182.086.944	42,0%	-4.938.160	-159.295	-0,13	-0,42
01/08/2006	121,97	177.148.784	40,8%	-5.875.136	-189.521	-0,20	-0,65
01/09/2006	121,77	171.273.648	39,5%	-6.462.304	-215.410	-0,22	-0,73
01/10/2006	121,55	164.811.344	38,0%	-7.343.760	-236.895	-0,25	-0,81
01/11/2006	121,30	157.467.584	36,3%	-6.462.528	-215.418	-0,22	-0,73
01/12/2006	121,08	151.005.056	34,8%	-5.287.504	-170.565	-0,18	-0,58
01/01/2007	120,90	145.717.552	33,6%	-5.875.136	-189.521	-0,20	-0,65
01/02/2007	120,70	139.842.416	32,2%	3.231.264	115.402	0,11	0,39
01/03/2007	120,81	143.073.680	33,0%	-1.468.624	-47.375	-0,05	-0,16
01/04/2007	120,76	141.605.056	32,6%	13.512.480	450.416	0,46	1,53
01/05/2007	121,22	155.117.536	35,7%	0	0	0,00	0,00
01/06/2007	121,22	155.117.536	35,7%	-1.762.432	-58.748	-0,06	-0,20
01/07/2007	121,16	153.355.104	35,3%				
TOTAL ANUAL				-28.731.840		-0,94	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						63.592.388	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	MÉDIO (%)
363	0	0	9	4.397,6	5,14	121,24	155.820.360	35,9%

O monitoramento deste açüde é realizado pela gerência Quixeramobim

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Penedo


MUNICÍPIO: Maranguape

B. HIDROGRÁFICA: Metropolitanas

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
2.414.000	952.134	998,00	994,55	30	0	8	1958

ANO: ano de construção do açude

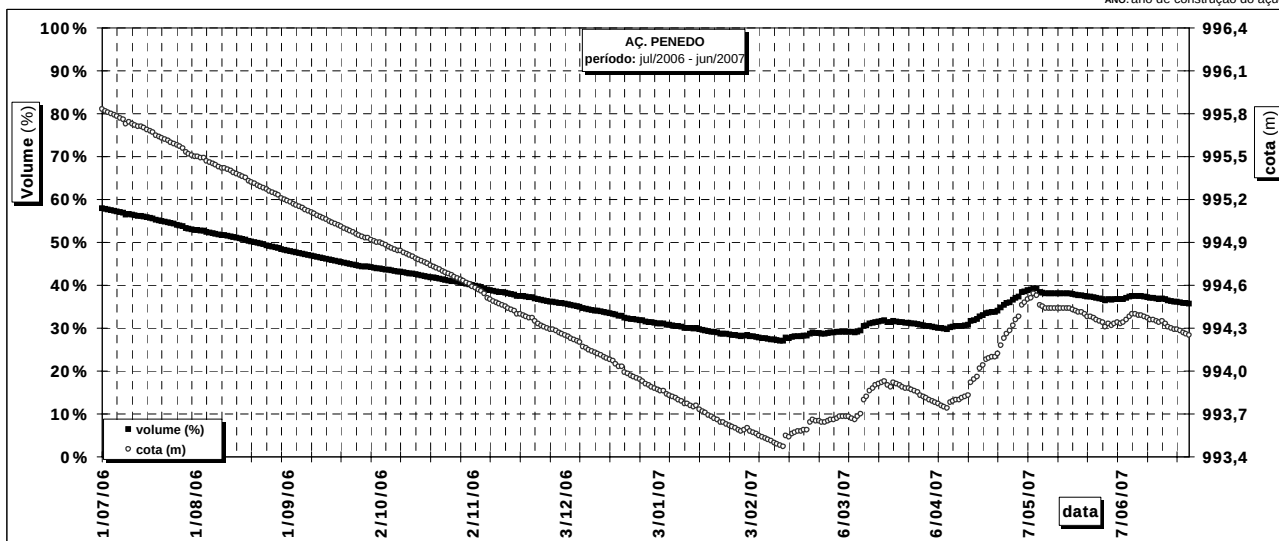

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	30/1/2007	213	995,83	993,59	2,24	1,05	1.399.066	680.796	718.270	39	18	21

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
31/1/2007	14/2/2007	20/6/2007	79	993,47	994,54	407.665	57.888	0	49.008	514.561

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
6.070	0	0	0	0	0	8.744	75.829	106.268	183.091	91.972	53.047	525.021

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	995,83	1.399.066	58,0%	-122.799	-3.961	-0,33	-1,06
01/08/2006	995,50	1.276.267	52,9%	-115.351	-3.721	-0,31	-1,00
01/09/2006	995,19	1.160.916	48,1%	-101.376	-3.379	-0,29	-0,97
01/10/2006	994,90	1.059.540	43,9%	-88.996	-2.871	-0,29	-0,94
01/11/2006	994,61	970.544	40,2%	-104.315	-3.477	-0,34	-1,13
01/12/2006	994,27	866.229	35,9%	-110.373	-3.560	-0,38	-1,23
01/01/2007	993,89	755.856	31,3%	-75.060	-2.421	-0,30	-0,97
01/02/2007	993,59	680.796	28,2%	15.012	536	0,06	0,21
01/03/2007	993,65	695.808	28,8%	45.036	1.453	0,18	0,58
01/04/2007	993,83	740.844	30,7%	128.456	4.282	0,45	1,50
01/05/2007	994,28	869.300	36,0%	18.410	594	0,06	0,19
01/06/2007	994,34	887.710	36,8%	-30.696	-1.023	-0,10	-0,33
01/07/2007	994,24	857.014	35,5%				
TOTAL ANUAL				-542.052		-1,59	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						451.592	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
352	237	0	10	1.678,2	3,01	994,44	929.390	38,5%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência GEMET

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Pentecoste


MUNICÍPIO: Pentecoste

B. HIDROGRÁFICA: Curu

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
395.630.000	16.696.007	58,00	44,20	200	635	3.254	1957

ANO: ano de construção do açude

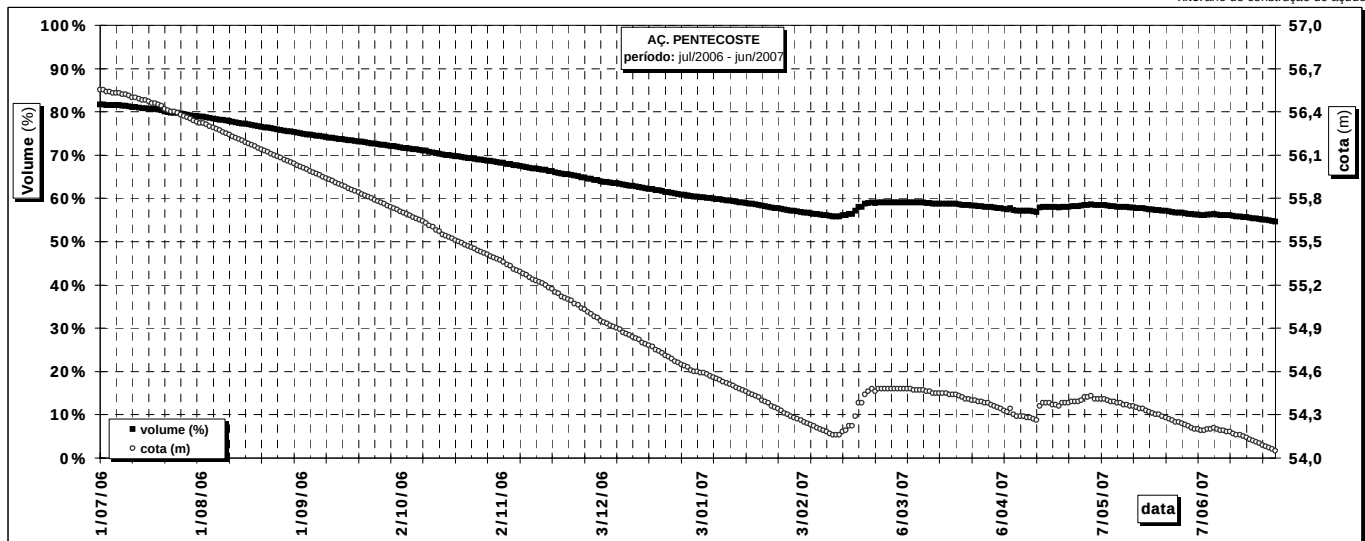

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	12/2/2007	226	56,55	54,17	2,38	1,05	323.226.976	221.132.528	102.094.448	5.228	3.088	2.140

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
13/2/2007		10/6/2007	70	54,16	54,48	23.244.720	2.738.016	0	4.550.418	30.533.154

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	17.547.555	0	9.513.454	1.751.649	1.720.496	30.533.154

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	56,55	323.226.976	81,7%	-11.486.176	-370.522	-0,23	-0,74
01/08/2006	56,32	311.740.800	78,8%	-14.981.984	-483.290	-0,30	-0,97
01/09/2006	56,02	296.758.816	75,0%	-12.417.152	-413.905	-0,30	-1,00
01/10/2006	55,72	284.341.664	71,9%	-13.865.216	-447.265	-0,34	-1,10
01/11/2006	55,38	270.476.448	68,4%	-16.312.064	-543.735	-0,40	-1,33
01/12/2006	54,98	254.164.384	64,2%	-15.496.448	-499.885	-0,38	-1,23
01/01/2007	54,60	238.667.936	60,3%	-13.049.584	-420.954	-0,32	-1,03
01/02/2007	54,28	225.618.352	57,0%	8.156.032	291.287	0,20	0,71
01/03/2007	54,48	233.774.384	59,1%	-4.077.936	-131.546	-0,10	-0,32
01/04/2007	54,38	229.696.448	58,1%	815.616	27.187	0,02	0,07
01/05/2007	54,40	230.512.064	58,3%	-6.524.800	-210.477	-0,16	-0,52
01/06/2007	54,24	223.987.264	56,6%	-8.563.920	-285.464	-0,21	-0,70
01/07/2007	54,03	215.423.344	54,5%				
TOTAL ANUAL				-107.803.632		-2,52	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						81.967.968	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	10	4.729,4	5,87	55,02	255.972.610	64,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Pentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Pirabibu


MUNICÍPIO: Quixeramobim

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
74.000.000	9.410.000	246,00	239,25	180	0	513	2000

ANO: ano de construção do açude

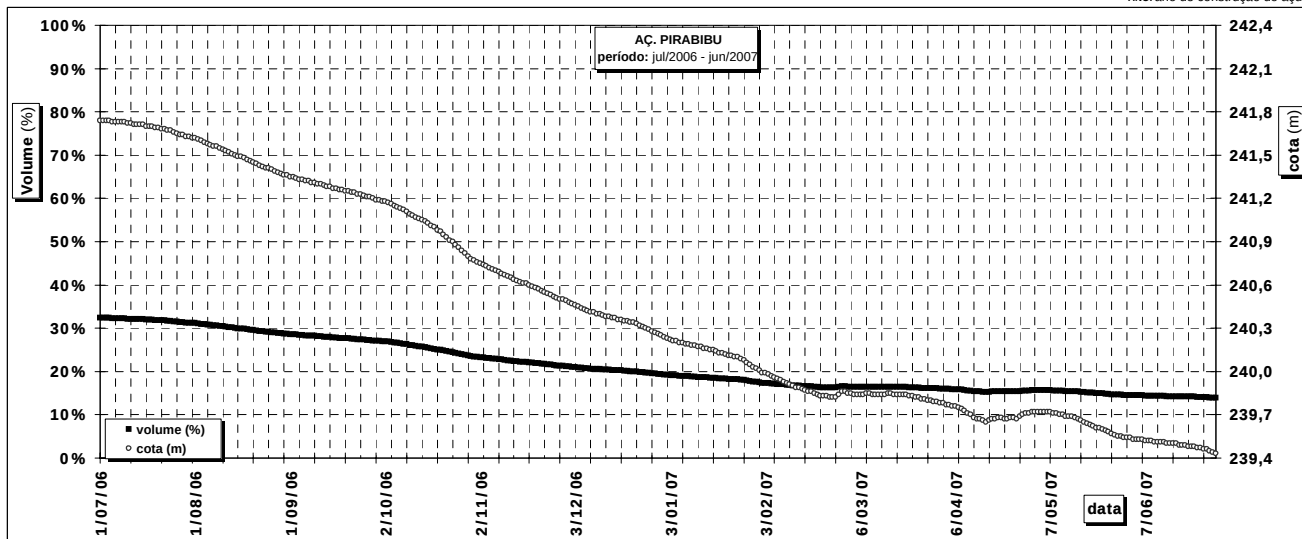

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	23/2/2007	237	241,74	239,83	1,91	0,81	23.928.840	12.078.008	11.850.832	578	506	72

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
24/2/2007		30/4/2007	12	239,65	239,86	690.041	84.752	0	413.424	1.188.217

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	301.275	217.104	669.838	0	0	1.188.217

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	241,74	23.928.840	32,3%	-854.474	-27.564	-0,12	-0,39
01/08/2006	241,62	23.074.366	31,2%	-1.922.322	-62.010	-0,27	-0,87
01/09/2006	241,35	21.152.044	28,6%	-1.210.496	-40.350	-0,17	-0,57
01/10/2006	241,18	19.941.548	26,9%	-2.673.580	-86.245	-0,42	-1,35
01/11/2006	240,76	17.267.968	23,3%	-1.623.993	-54.133	-0,28	-0,93
01/12/2006	240,48	15.643.975	21,1%	-1.391.943	-44.901	-0,24	-0,77
01/01/2007	240,24	14.252.032	19,3%	-1.334.064	-43.034	-0,23	-0,74
01/02/2007	240,01	12.917.968	17,5%	-701.965	-25.070	-0,15	-0,54
01/03/2007	239,86	12.216.003	16,5%	-368.009	-11.871	-0,08	-0,26
01/04/2007	239,78	11.847.994	16,0%	-275.988	-9.200	-0,06	-0,20
01/05/2007	239,72	11.572.006	15,6%	-828.037	-26.711	-0,18	-0,58
01/06/2007	239,54	10.743.969	14,5%	-551.977	-18.399	-0,12	-0,40
01/07/2007	239,42	10.191.992	13,8%				
TOTAL ANUAL				-13.736.848		-2,32	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						12.457.338	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC.	TEMPO DE RESID.	PROFUND. MÉDIA	COTA MÉDIA	V. ARM. MÉDIO	
			(cm/dia)	(dias)	(m)	(m)	(m³)	(%)
364	0	0	2	22.731.5	2.68	240.44	15.688.000	21.2%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Quixeramobim

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Poço da Pedra


MUNICÍPIO: Campos Sales

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
52.000.000	2.290.000	542,00	530,00	195	0	902	1958

ANO: ano de construção do açude

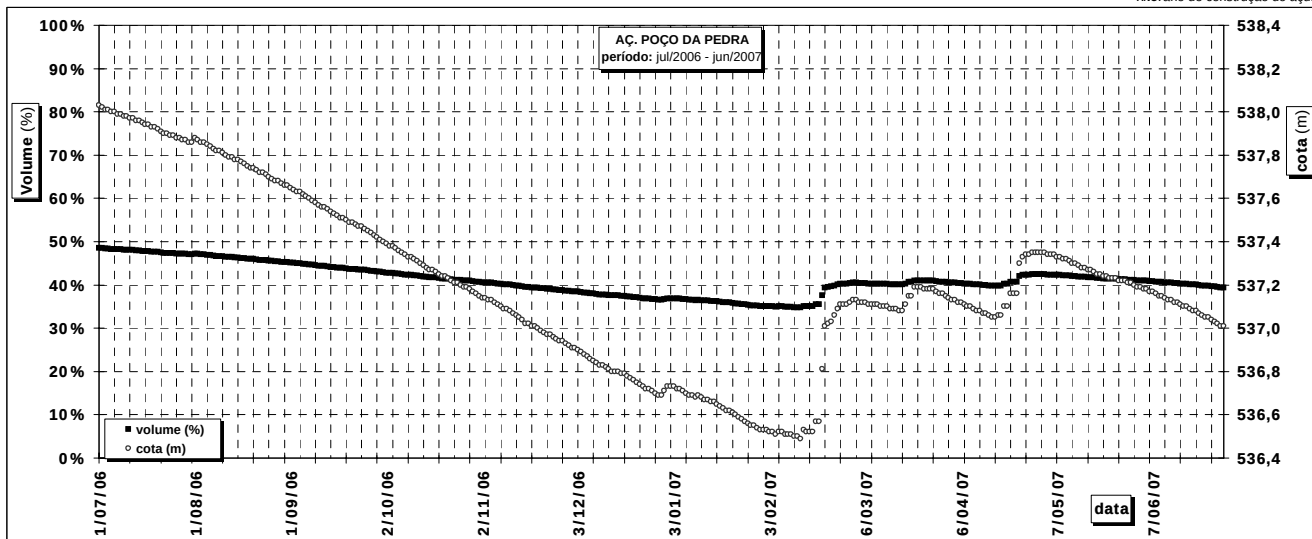

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	13/2/2007	227	538,03	536,49	1,54	0,68	25.248.116	18.062.294	7.185.822	366	366	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
13/2/2007	13/2/2007	28/4/2007	53	536,49	537,34	4.945.946	0	0	560.509	5.506.455

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
168.120	0	0	0	0	284.579	69.650	3.316.303	675.358	1.610.508	0	0	6.124.518

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	538,03	25.248.116	48,6%	-700.014	-22.581	-0,15	-0,48
01/08/2006	537,88	24.548.102	47,2%	-1.073.088	-34.616	-0,23	-0,74
01/09/2006	537,65	23.475.014	45,1%	-1.166.500	-38.883	-0,25	-0,83
01/10/2006	537,40	22.308.514	42,9%	-1.166.500	-37.629	-0,25	-0,81
01/11/2006	537,15	21.142.014	40,7%	-1.120.080	-37.336	-0,24	-0,80
01/12/2006	536,91	20.021.934	38,5%	-839.846	-27.092	-0,18	-0,58
01/01/2007	536,73	19.182.088	36,9%	-932.972	-30.096	-0,20	-0,65
01/02/2007	536,53	18.249.116	35,1%	2.752.782	98.314	0,59	2,11
01/03/2007	537,12	21.001.898	40,4%	140.116	4.520	0,03	0,10
01/04/2007	537,15	21.142.014	40,7%	932.972	31.099	0,20	0,67
01/05/2007	537,35	22.074.986	42,5%	-699.730	-22.572	-0,15	-0,48
01/06/2007	537,20	21.375.256	41,1%	-933.256	-31.109	-0,20	-0,67
01/07/2007	537,00	20.442.000	39,3%				
TOTAL ANUAL				-4.806.116		-1,03	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						10.946.946	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
361	0	0	24	3.099,0	4,81	537,20	21.372.000	41,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência/aguatú

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Poço do Barro


MUNICÍPIO: Morada Nova

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
52.000.000	1.351.500	120,00	107,50	200	0	380	1956

ANO: ano de construção do açude

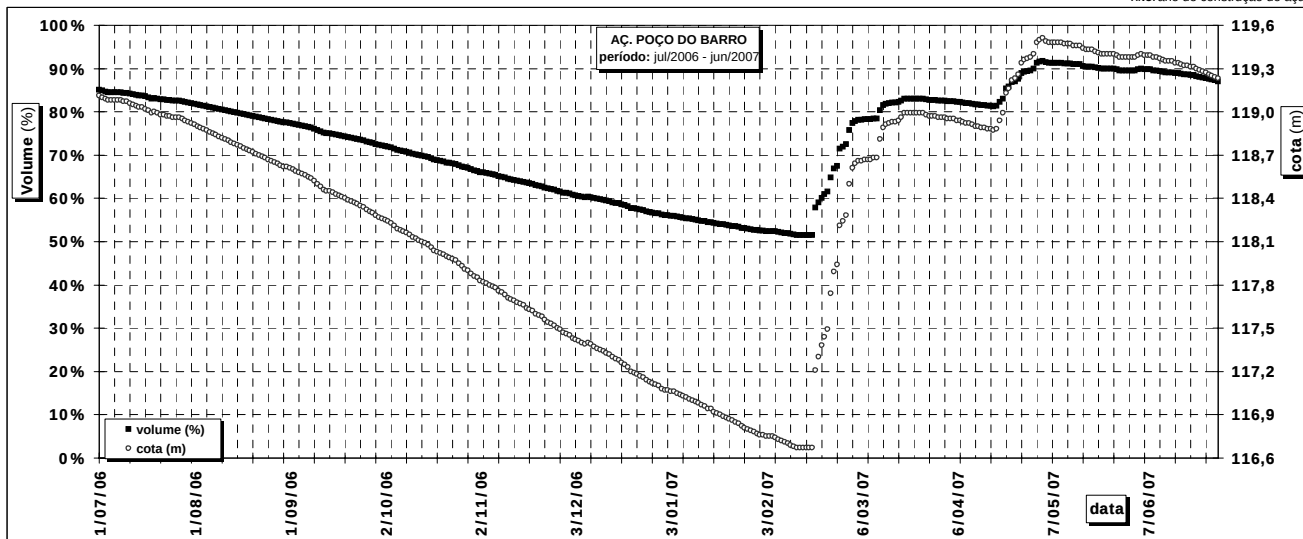

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	12/2/2007	226	119,11	116,68	2,43	1,08	44.212.504	26.853.562	17.358.942	888	631	257

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
13/2/2007	13/2/2007	4/6/2007	86	116,67	119,51	22.020.640	475.543	0	1.399.154	23.895.337

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
147.719	0	0	0	0	150.297	0	11.423.889	6.041.536	5.072.157	1.054.871	302.884	24.193.353

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	119,11	44.212.504	85,0%	-1.659.976	-53.548	-0,20	-0,65
01/08/2006	118,91	42.552.528	81,8%	-2.325.024	-75.001	-0,30	-0,97
01/09/2006	118,61	40.227.504	77,4%	-2.712.488	-90.416	-0,35	-1,17
01/10/2006	118,26	37.515.016	72,1%	-3.039.976	-98.064	-0,41	-1,32
01/11/2006	117,85	34.475.040	66,3%	-2.733.210	-91.107	-0,40	-1,33
01/12/2006	117,45	31.741.830	61,0%	-2.596.522	-83.759	-0,38	-1,23
01/01/2007	117,07	29.145.308	56,0%	-1.838.376	-59.302	-0,31	-1,00
01/02/2007	116,76	27.306.932	52,5%	10.363.060	370.109	1,52	5,43
01/03/2007	118,28	37.669.992	72,4%	5.270.000	170.000	0,68	2,19
01/04/2007	118,96	42.939.992	82,6%	3.810.020	127.001	0,44	1,47
01/05/2007	119,40	46.750.012	89,9%	-175.036	-5.646	-0,02	-0,06
01/06/2007	119,38	46.574.976	89,6%	-1.312.448	-43.748	-0,15	-0,50
01/07/2007	119,23	45.262.528	87,0%				
TOTAL ANUAL				1.050.024		0,12	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						16.365.277	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
360	0	0	54	784,5	5,02	118,33	38.376.000	73,8%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Poço Verde


MUNICÍPIO: Itapipoca

B. HIDROGRÁFICA: Litoral

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
13.650.000		68,00		81	0	63	1955

ANO: ano de construção do açude

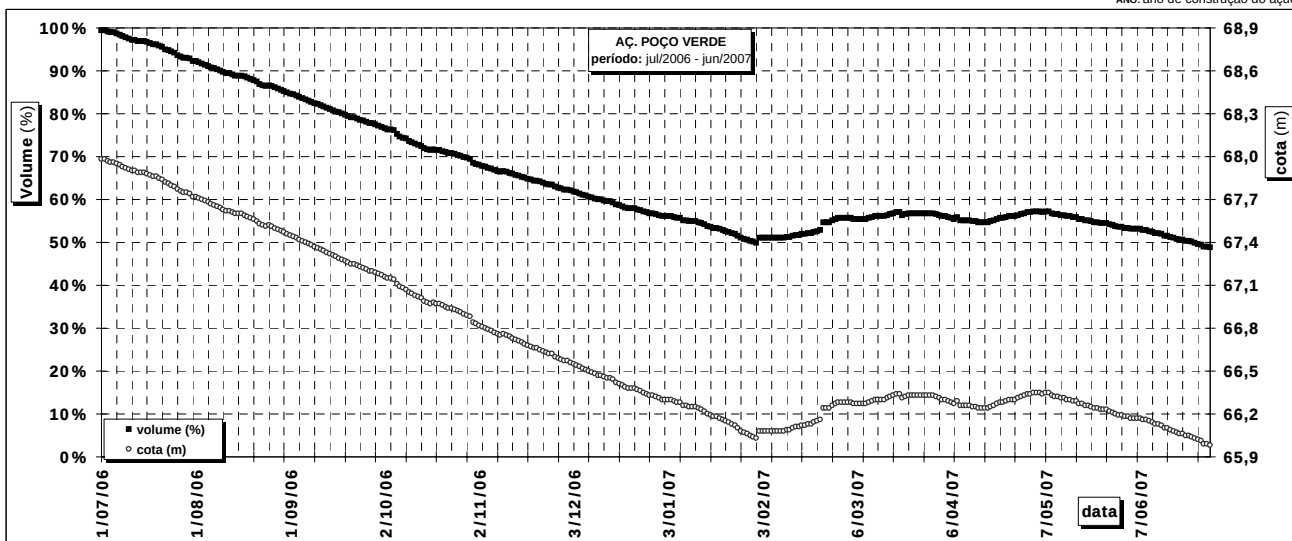

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/1/2007	214	67,98	66,04	1,94	0,91	13.574.013	6.835.603	6.738.410	364	257	107

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/2/2007		6/5/2007	82	66,03	66,35	1.507.232	0	0	578.327	2.085.559

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	61.476	0	56.042	55.185	0	0	1.061.905	407.644	514.483	111.223	0	2.267.958

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m²)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	67,98	13.574.013	99,4%	-988.008	-31.871	-0,26	-0,84
01/08/2006	67,72	12.586.005	92,2%	-1.026.017	-33.097	-0,27	-0,87
01/09/2006	67,45	11.559.988	84,7%	-1.063.995	-35.467	-0,28	-0,93
01/10/2006	67,17	10.495.993	76,9%	-1.179.787	-38.058	-0,34	-1,10
01/11/2006	66,83	9.316.206	68,3%	-816.407	-27.214	-0,26	-0,87
01/12/2006	66,57	8.499.799	62,3%	-847.789	-27.348	-0,27	-0,87
01/01/2007	66,30	7.652.010	56,1%	-847.814	-27.349	-0,27	-0,87
01/02/2007	66,03	6.804.196	49,8%	785.000	28.036	0,25	0,89
01/03/2007	66,28	7.589.196	55,6%	125.603	4.052	0,04	0,13
01/04/2007	66,32	7.714.799	56,5%	62.790	2.093	0,02	0,07
01/05/2007	66,34	7.777.589	57,0%	-470.981	-15.193	-0,15	-0,48
01/06/2007	66,19	7.306.608	53,5%	-665.005	-22.167	-0,22	-0,73
01/07/2007	65,97	6.641.603	48,7%				
TOTAL ANUAL				-6.932.410		-2,01	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						6.256.859	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
361	0	0	8	2.196,8	2,77	66,69	8.968.050	65,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Pompeu Sobrinho


MUNICÍPIO: Choró

B. HIDROGRÁFICA: Metropolitanas

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
143.000.000	16.509.989	218,50	207,20	50	0	322	1934

ANO: ano de construção do açude

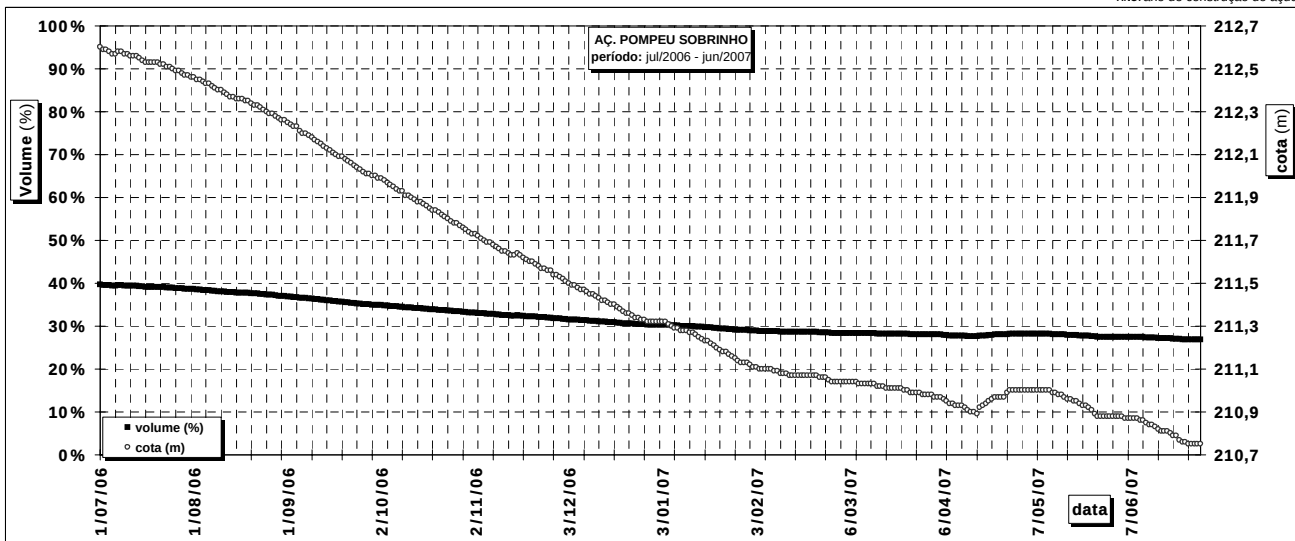

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	16/4/2007	289	212,60	210,90	1,70	0,59	56.750.068	39.499.956	17.250.112	690	690	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
17/4/2007		27/4/2007	10	210,89	210,99	825.004	103.680	0	281.135	1.209.819

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
272.714	0	0	0	263.568	0	0	0	0	1.248.485	0	0	1.784.767

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	212,60	56.750.068	39,7%	-1.574.992	-50.806	-0,14	-0,45
01/08/2006	212,46	55.175.076	38,6%	-2.362.576	-76.212	-0,21	-0,68
01/09/2006	212,25	52.812.500	36,9%	-2.909.948	-96.998	-0,26	-0,87
01/10/2006	211,99	49.902.552	34,9%	-2.535.092	-81.777	-0,26	-0,84
01/11/2006	211,73	47.367.460	33,1%	-2.047.420	-68.247	-0,21	-0,70
01/12/2006	211,52	45.320.040	31,7%	-1.949.968	-62.902	-0,20	-0,65
01/01/2007	211,32	43.370.072	30,3%	-1.950.120	-62.907	-0,20	-0,65
01/02/2007	211,12	41.419.952	29,0%	-780.016	-27.858	-0,08	-0,29
01/03/2007	211,04	40.639.936	28,4%	-539.968	-17.418	-0,06	-0,19
01/04/2007	210,98	40.099.968	28,0%	150.032	5.001	0,02	0,07
01/05/2007	211,00	40.250.000	28,1%	-899.964	-29.031	-0,12	-0,39
01/06/2007	210,88	39.350.036	27,5%	-1.049.996	-35.000	-0,14	-0,47
01/07/2007	210,74	38.300.040	26,8%				
TOTAL ANUAL				-18.450.028		-1,86	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						18.876.494	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
363	0	0	3	29.244,7	5,09	211,50	45.331.000	31,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência GEMET

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Potiretama


MUNICÍPIO: Potiretama

B. HIDROGRÁFICA: Médio Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
6.330.000	1.424.998	99,00	94,70	60	0	42	1992

ANO: ano de construção do açude

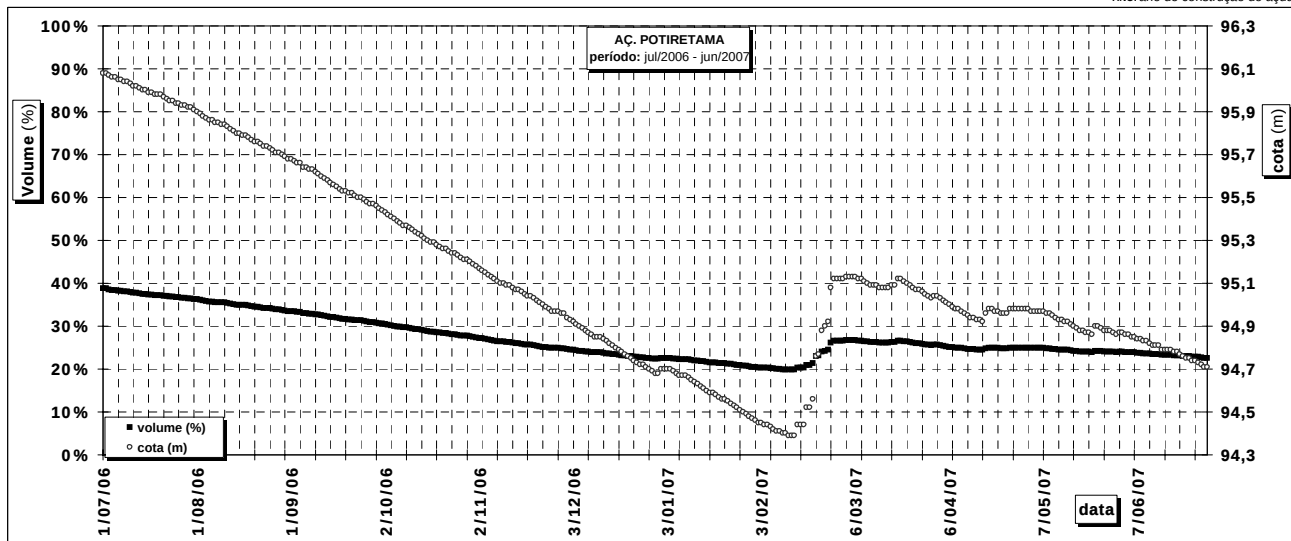

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	96,08	94,40	1,68	0,75	2.452.402	1.260.001	1.192.401	61	57	4

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	31/5/2007	64	94,39	95,13	547.409	29.376	0	94.278	671.063

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	22.166	0	490.276	77.223	63.986	36.174	0	689.825

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	96,08	2.452.402	38,7%	-160.401	-5.174	-0,18	-0,58
01/08/2006	95,90	2.292.001	36,2%	-171.601	-5.536	-0,22	-0,71
01/09/2006	95,68	2.120.400	33,5%	-187.198	-6.240	-0,24	-0,80
01/10/2006	95,44	1.933.202	30,5%	-202.802	-6.542	-0,26	-0,84
01/11/2006	95,18	1.730.400	27,3%	-173.399	-5.780	-0,24	-0,80
01/12/2006	94,94	1.557.001	24,6%	-132.003	-4.258	-0,24	-0,77
01/01/2007	94,70	1.424.998	22,5%	-131.998	-4.258	-0,24	-0,77
01/02/2007	94,46	1.293.000	20,4%	390.602	13.950	0,66	2,36
01/03/2007	95,12	1.683.602	26,6%	-62.401	-2.013	-0,08	-0,26
01/04/2007	95,04	1.621.201	25,6%	-42.199	-1.407	-0,06	-0,20
01/05/2007	94,98	1.579.002	24,9%	-60.500	-1.952	-0,11	-0,35
01/06/2007	94,87	1.518.502	24,0%	-93.504	-3.117	-0,17	-0,57
01/07/2007	94,70	1.424.998	22,5%				
TOTAL ANUAL				-1.027.404		-1,38	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.489.269	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	20	3.349,3	2,49	95,13	1.715.430	27,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Prazeres


MUNICÍPIO: Barro

B. HIDROGRÁFICA: Salgado

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
32.500.000	2.296.000	98,00	72,00	80	0	140	1988

ANO: ano de construção do açude

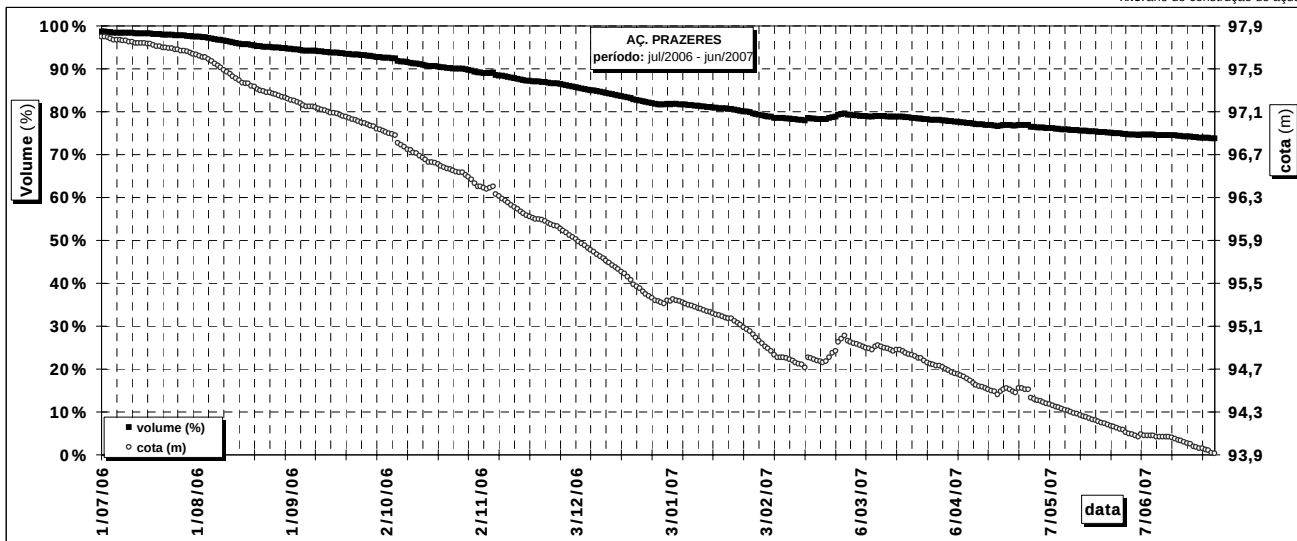

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	21/2/2007	235	97,80	94,77	3,03	1,29	32.054.674	25.423.474	6.631.200	326	187	139

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FÍRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
22/2/2007		5/6/2007	19	94,07	95,01	729.078	117.504	0	131.323	977.905

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	90.890	0	152.737	732.444	140.791	241.108	0	51.410	1.409.380

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	97,80	32.054.674	98,6%	-378.546	-12.211	-0,17	-0,55
01/08/2006	97,63	31.676.128	97,5%	-935.196	-30.168	-0,42	-1,35
01/09/2006	97,21	30.740.932	94,6%	-645.736	-21.525	-0,29	-0,97
01/10/2006	96,92	30.095.196	92,6%	-1.157.860	-37.350	-0,52	-1,68
01/11/2006	96,40	28.937.336	89,0%	-1.002.010	-33.400	-0,45	-1,50
01/12/2006	95,95	27.935.326	86,0%	-1.425.064	-45.970	-0,64	-2,06
01/01/2007	95,31	26.510.262	81,6%	-759.224	-24.491	-0,35	-1,13
01/02/2007	94,96	25.751.038	79,2%	91.234	3.258	0,05	0,18
01/03/2007	95,01	25.842.272	79,5%	-487.746	-15.734	-0,28	-0,90
01/04/2007	94,73	25.354.526	78,0%	-517.206	-17.240	-0,30	-1,00
01/05/2007	94,43	24.837.320	76,4%	-551.678	-17.796	-0,32	-1,03
01/06/2007	94,11	24.285.642	74,7%	-362.040	-12.068	-0,21	-0,70
01/07/2007	93,90	23.923.602	73,6%				
TOTAL ANUAL				-8.131.072		-3,90	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						4.816.951	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³) (%)
356	0	0	8	8.416,8	13,20	95,72	27.527.500 84,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrato

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Premuoca


MUNICÍPIO: Uruoca

B. HIDROGRÁFICA: Coreaú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
5.200.000	510.000	88,00	82,00	33	0	26	1981

ANO: ano de construção do açude

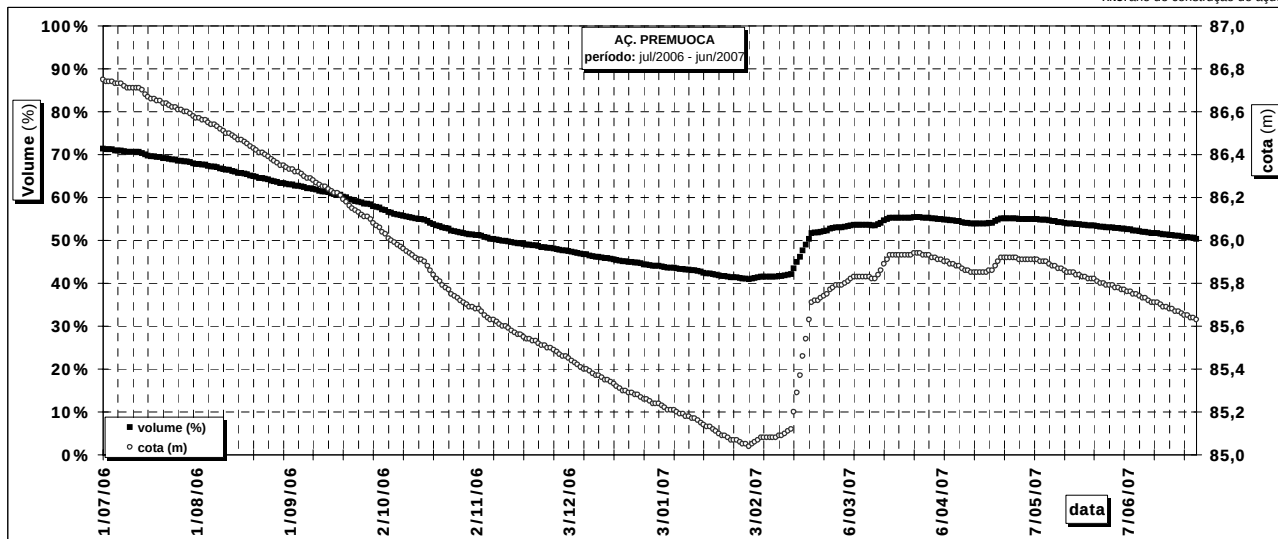

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/1/2007	214	86,75	85,05	1,70	0,79	3.710.000	2.132.003	1.577.997	85	68	17

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/2/2007	1/2/2007	23/4/2007	60	85,04	85,94	789.602	0	0	151.878	941.480

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	712.010	192.779	78.995	0	0	983.784

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	86,75	3.710.000	71,3%	-187.200	-6.039	-0,18	-0,58
01/08/2006	86,57	3.522.800	67,7%	-249.598	-8.052	-0,24	-0,77
01/09/2006	86,33	3.273.202	62,9%	-280.804	-9.360	-0,27	-0,90
01/10/2006	86,06	2.992.398	57,5%	-322.796	-10.413	-0,37	-1,19
01/11/2006	85,69	2.669.602	51,3%	-193.203	-6.440	-0,23	-0,77
01/12/2006	85,46	2.476.399	47,6%	-184.801	-5.961	-0,22	-0,71
01/01/2007	85,24	2.291.598	44,1%	-167.997	-5.419	-0,20	-0,65
01/02/2007	85,04	2.123.601	40,8%	621.598	22.200	0,74	2,64
01/03/2007	85,78	2.745.199	52,8%	126.001	4.065	0,15	0,48
01/04/2007	85,93	2.871.200	55,2%	-8.401	-280	-0,01	-0,03
01/05/2007	85,92	2.862.799	55,1%	-109.198	-3.523	-0,13	-0,42
01/06/2007	85,79	2.753.601	53,0%	-134.403	-4.480	-0,16	-0,53
01/07/2007	85,63	2.619.198	50,4%				
TOTAL ANUAL				-1.090.802		-1,12	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.731.869	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
98	0	0	8	1.929,3	3,09	85,83	2.813.200	54,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Quandú


MUNICÍPIO: Itapipoca

B. HIDROGRÁFICA: Litoral

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
4.000.000	20.000	98,50	85,00	42	0	60	1990

ANO: ano de construção do açude

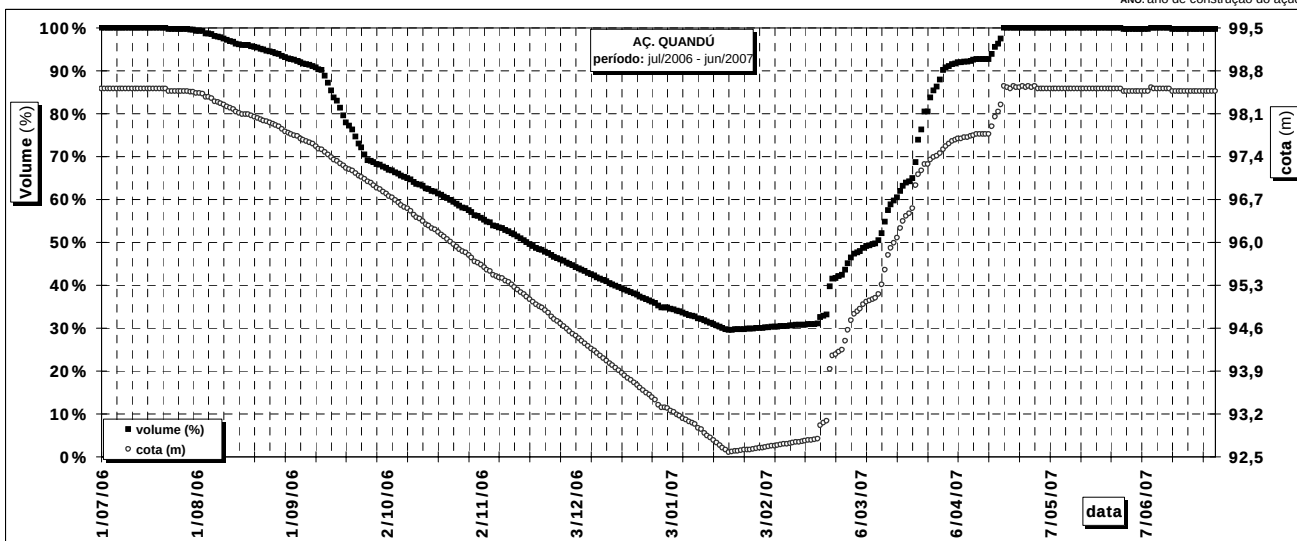

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	21/1/2007	204	98,51	92,61	5,90	2,89	4.000.000	1.190.800	2.809.200	159	19	140

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
22/1/2007	22/1/2007	15/6/2007	143	92,57	98,55	2.820.400	842.400	717.984	150.541	4.531.325

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
391.293	0	0	0	0	0	110.702	562.768	1.964.073	1.005.725	481.290	156.935	4.672.786

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	98,51	4.000.000	100,0%	-28.000	-903	-0,08	-0,26
01/08/2006	98,43	3.972.000	99,3%	-264.001	-8.516	-0,66	-2,13
01/09/2006	97,77	3.707.999	92,7%	-1.002.598	-33.420	-0,94	-3,13
01/10/2006	96,83	2.705.401	67,6%	-460.602	-14.858	-1,16	-3,74
01/11/2006	95,67	2.244.799	56,1%	-447.798	-14.927	-1,12	-3,73
01/12/2006	94,55	1.797.001	44,9%	-404.000	-13.032	-1,25	-4,03
01/01/2007	93,30	1.393.001	34,8%	-191.001	-6.161	-0,65	-2,10
01/02/2007	92,65	1.202.000	30,1%	540.600	19.307	1,74	6,21
01/03/2007	94,39	1.742.600	43,6%	1.774.395	57.239	3,06	9,87
01/04/2007	97,45	3.516.995	87,9%	483.005	16.100	1,08	3,60
01/05/2007	98,53	4.000.000	100,0%	-11.999	-387	-0,06	-0,19
01/06/2007	98,47	3.988.001	99,7%	0	0	0,00	0,00
01/07/2007	98,47	3.988.001	99,7%				
TOTAL ANUAL				-11.999		-0,04	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)				609.251			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	MÉDIO (%)
312	0	46	84	312,4	6,43	96,36	2.840.000	71,0%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Quincoé


MUNICÍPIO: Acopiara

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
7.130.000	695.000	95,00	86,50	90	0	166	1991

ANO: ano de construção do açude

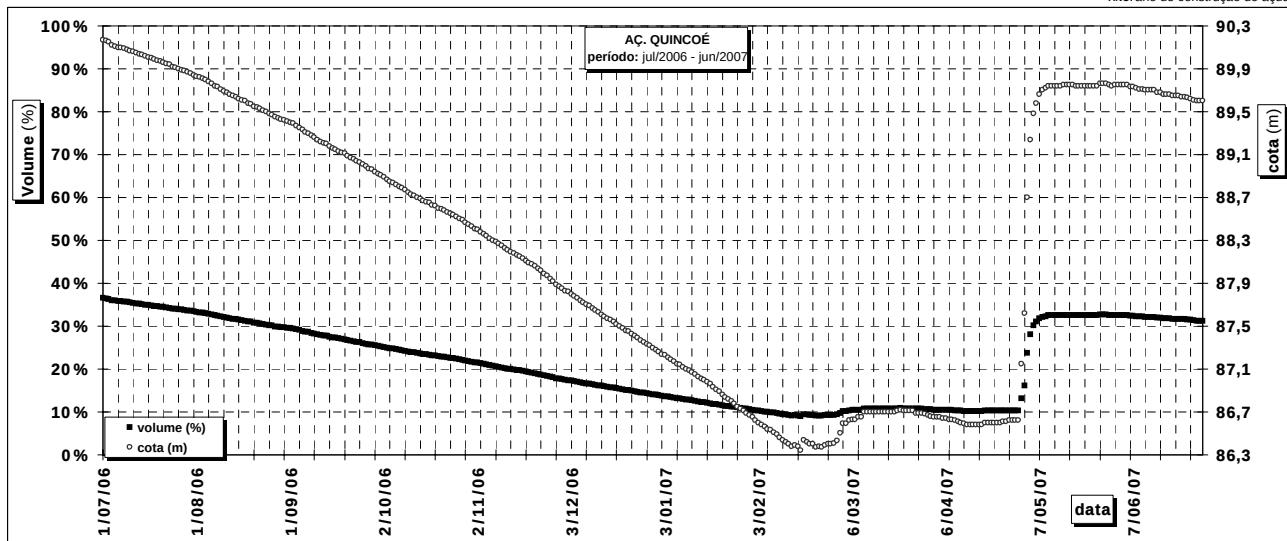

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	23/2/2007	237	90,17	86,38	3,79	1,60	2.604.099	652.999	1.951.100	95	38	57

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
24/2/2007	14/4/2007	31/5/2007	78	86,37	89,76	1.740.901	0	0	60.553	1.801.454

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	74.179	115.240	225.371	1.432.836	0	1.847.626

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	90,17	2.604.099	36,5%	-231.198	-7.458	-0,34	-1,10
01/08/2006	89,83	2.372.901	33,3%	-270.900	-8.739	-0,43	-1,39
01/09/2006	89,40	2.102.001	29,5%	-299.699	-9.990	-0,49	-1,63
01/10/2006	88,91	1.802.302	25,3%	-265.000	-8.548	-0,50	-1,61
01/11/2006	88,41	1.537.302	21,6%	-293.801	-9.793	-0,58	-1,93
01/12/2006	87,83	1.243.501	17,4%	-256.500	-8.274	-0,57	-1,84
01/01/2007	87,26	987.001	13,8%	-239.500	-7.726	-0,61	-1,97
01/02/2007	86,65	747.501	10,5%	-77.001	-2.750	-0,22	-0,79
01/03/2007	86,43	670.500	9,4%	80.501	2.597	0,23	0,74
01/04/2007	86,66	751.001	10,5%	186.500	6.217	0,49	1,63
01/05/2007	87,15	937.501	13,1%	1.384.999	44.677	2,60	8,39
01/06/2007	89,75	2.322.500	32,6%	-107.099	-3.570	-0,17	-0,57
01/07/2007	89,58	2.215.401	31,1%				
TOTAL ANUAL				-388.698		-0,59	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.047.107	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
229	0	0	108	1.408,5	2,84	88,27	1.540.080	21,6%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência/guatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Quixabinha


MUNICÍPIO: Mauriti

B. HIDROGRÁFICA: Salgado

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
31.780.000	740.000	418,00	393,00	80	0	87	1967

ANO: ano de construção do açude

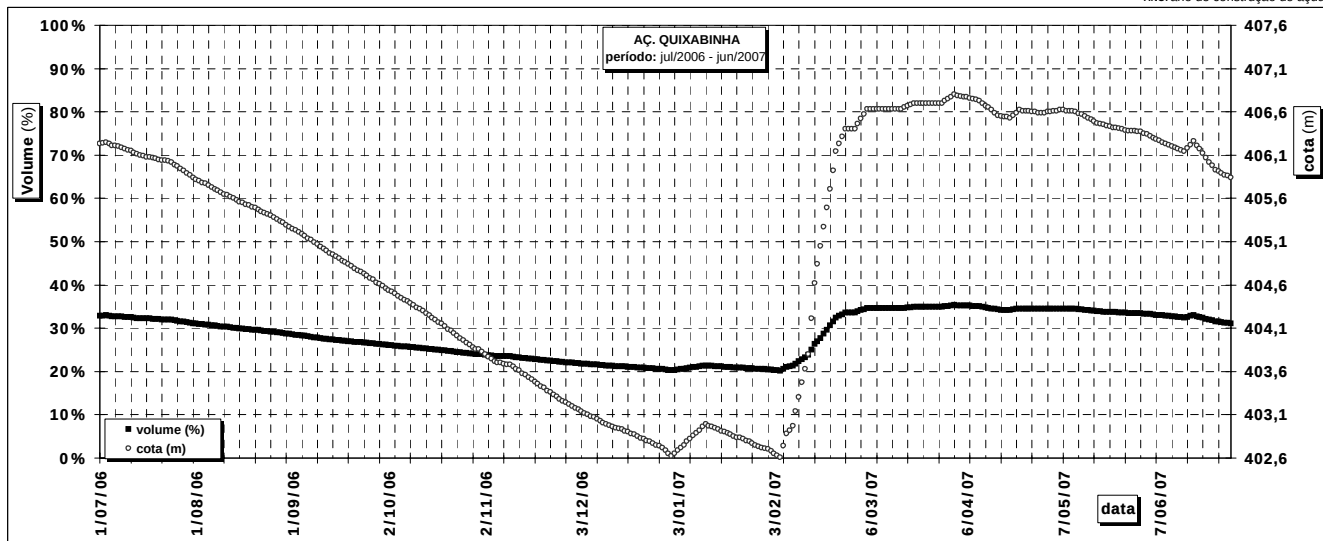

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	406,23	402,65	3,58	1,96	10.434.795	6.455.194	3.979.601	251	106	145

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	5/2/2007	15/6/2007	78	402,61	406,80	5.388.195	243.648	0	294.965	5.926.808

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	528.081	4.420.614	633.660	146.524	0	194.562	5.923.441

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	406,23	10.434.795	32,8%	-568.265	-18.331	-0,41	-1,32
01/08/2006	405,82	9.866.530	31,0%	-790.030	-25.485	-0,57	-1,84
01/09/2006	405,25	9.076.500	28,6%	-772.422	-25.747	-0,69	-2,30
01/10/2006	404,56	8.304.078	26,1%	-706.651	-22.795	-0,73	-2,35
01/11/2006	403,83	7.597.427	23,9%	-629.194	-20.973	-0,65	-2,17
01/12/2006	403,18	6.968.233	21,9%	-542.077	-17.486	-0,56	-1,81
01/01/2007	402,62	6.426.156	20,2%	77.456	2.499	0,08	0,26
01/02/2007	402,70	6.503.612	20,5%	4.166.780	148.814	3,70	13,21
01/03/2007	406,40	10.670.392	33,6%	512.813	16.542	0,37	1,19
01/04/2007	406,77	11.183.205	35,2%	-249.470	-8.316	-0,18	-0,60
01/05/2007	406,59	10.933.735	34,4%	-304.922	-9.836	-0,22	-0,71
01/06/2007	406,37	10.628.813	33,4%	-762.283	-25.409	-0,55	-1,83
01/07/2007	405,82	9.866.530	31,0%				
TOTAL ANUAL				-568.265		-0,41	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						2.603.038	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	MÉDIO (%)
68	0	0	41	1.958,3	7,64	405,03	9.025.520	28,4%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrato

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Quixeramobim


MUNICÍPIO: Quixeramobim

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
54.000.000	590.000	102,00	89,00	150	5.804	7.006	1960

ANO: ano de construção do açude

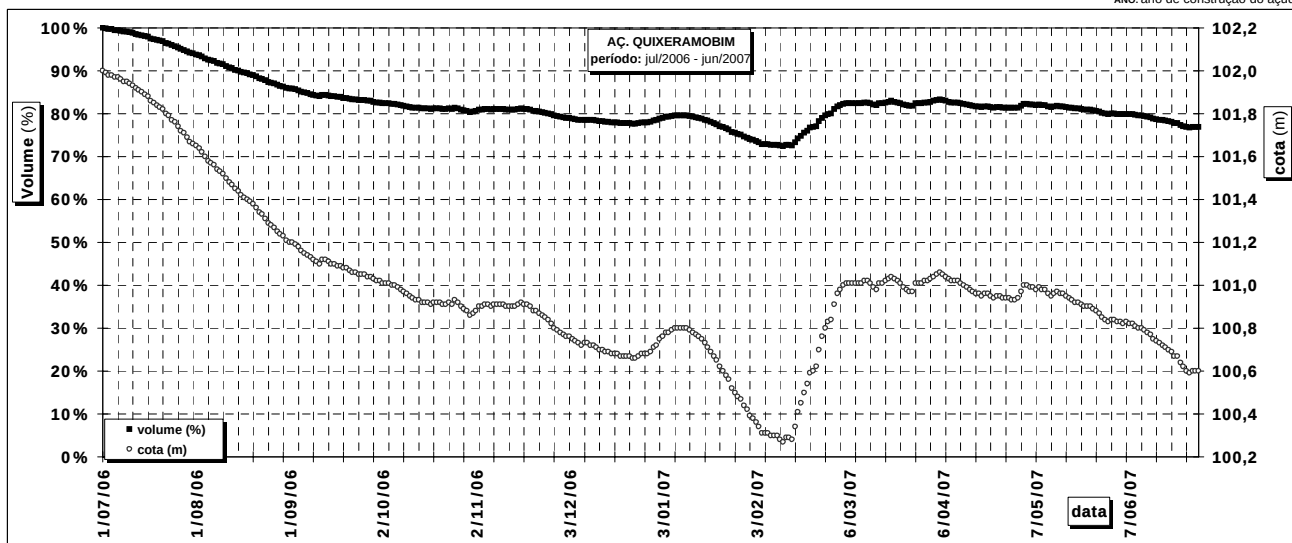

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	25/12/2006	177	102,00	100,66	1,34	0,76	54.000.000	41.918.028	#####	790	776	14

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
25/12/2006	15/2/2007	27/6/2007	93	100,27	101,06	9.035.912	1.286.496	0	2.302.509	12.624.917

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	373.655	969.898	1.436.420	1.381.939	1.072.559	5.640.309	2.609.845	1.019.839	976.840	271.142	15.752.446

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	102,00	54.000.000	100,0%	-3.359.984	-108.387	-0,35	-1,13
01/08/2006	101,65	50.640.016	93,8%	-4.320.044	-139.356	-0,45	-1,45
01/09/2006	101,20	46.319.972	85,8%	-1.728.004	-57.600	-0,18	-0,60
01/10/2006	101,02	44.591.968	82,6%	-1.140.948	-36.805	-0,15	-0,48
01/11/2006	100,87	43.451.020	80,5%	-730.044	-24.335	-0,10	-0,33
01/12/2006	100,77	42.720.976	79,1%	-364.968	-11.773	-0,05	-0,16
01/01/2007	100,72	42.356.008	78,4%	-2.409.012	-77.710	-0,33	-1,06
01/02/2007	100,39	39.946.996	74,0%	3.796.032	135.573	0,52	1,86
01/03/2007	100,91	43.743.028	81,0%	848.940	27.385	0,11	0,35
01/04/2007	101,02	44.591.968	82,6%	-629.952	-20.998	-0,08	-0,27
01/05/2007	100,94	43.962.016	81,4%	-730.044	-23.550	-0,10	-0,32
01/06/2007	100,84	43.231.972	80,1%	-1.825.000	-60.833	-0,25	-0,83
01/07/2007	100,59	41.406.972	76,7%				
TOTAL ANUAL				#####		-1,41	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						16.942.052	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	8	1.251,2	5,51	100,98	44.550.000	82,5%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Quixeramobim

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Realejo


MUNICÍPIO: Crateús

B. HIDROGRÁFICA: Parnaíba

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
31.550.000	437.998	327,00	314,40	70	0	307	1980

ANO: ano de construção do açude

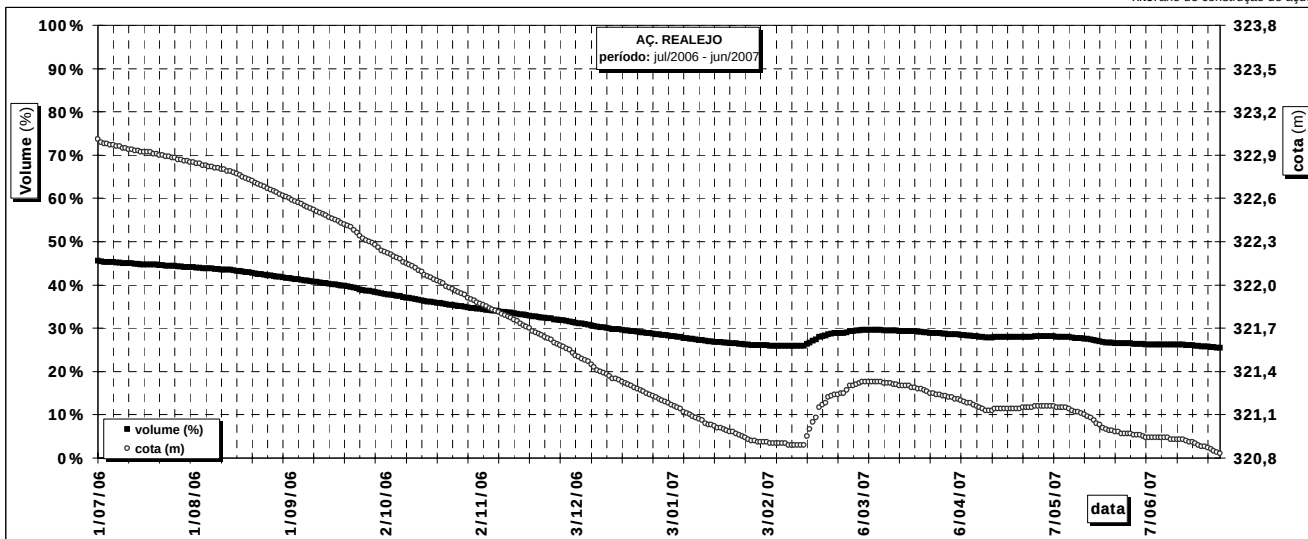

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	9/2/2007	223	323,01	320,90	2,11	0,95	14.394.634	8.183.986	6.210.648	322	322	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
10/2/2007		30/4/2007	59	320,89	321,33	1.260.125	0	0	351.236	1.611.361

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	1.216.563	229.247	165.551	0	0	1.611.361

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	323,01	14.394.634	45,6%	-505.615	-16.310	-0,16	-0,52
01/08/2006	322,85	13.889.019	44,0%	-785.000	-25.323	-0,25	-0,81
01/09/2006	322,60	13.104.019	41,5%	-1.130.450	-37.682	-0,36	-1,20
01/10/2006	322,24	11.973.569	38,0%	-1.090.755	-35.186	-0,36	-1,16
01/11/2006	321,88	10.882.814	34,5%	-927.348	-30.912	-0,33	-1,10
01/12/2006	321,55	9.955.466	31,6%	-1.011.559	-32.631	-0,36	-1,16
01/01/2007	321,19	8.943.907	28,3%	-737.298	-23.784	-0,28	-0,90
01/02/2007	320,91	8.206.609	26,0%	962.060	34.359	0,36	1,29
01/03/2007	321,27	9.168.669	29,1%	-112.338	-3.624	-0,04	-0,13
01/04/2007	321,23	9.056.331	28,7%	-196.721	-6.557	-0,07	-0,23
01/05/2007	321,16	8.859.610	28,1%	-517.407	-16.691	-0,19	-0,61
01/06/2007	320,97	8.342.203	26,4%	-338.986	-11.300	-0,15	-0,50
01/07/2007	320,82	8.003.217	25,4%				
TOTAL ANUAL				-6.391.417		-2,19	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						8.405.287	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
363	0	0	7	7.146,6	3,62	321,65	10.316.850	32,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrateús

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Riachão


MUNICÍPIO: Itaitinga

B. HIDROGRÁFICA: Metropolitanas

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
46.950.000	3.240.000	45,00	31,00	0	0	29	1981

ANO: ano de construção do açude

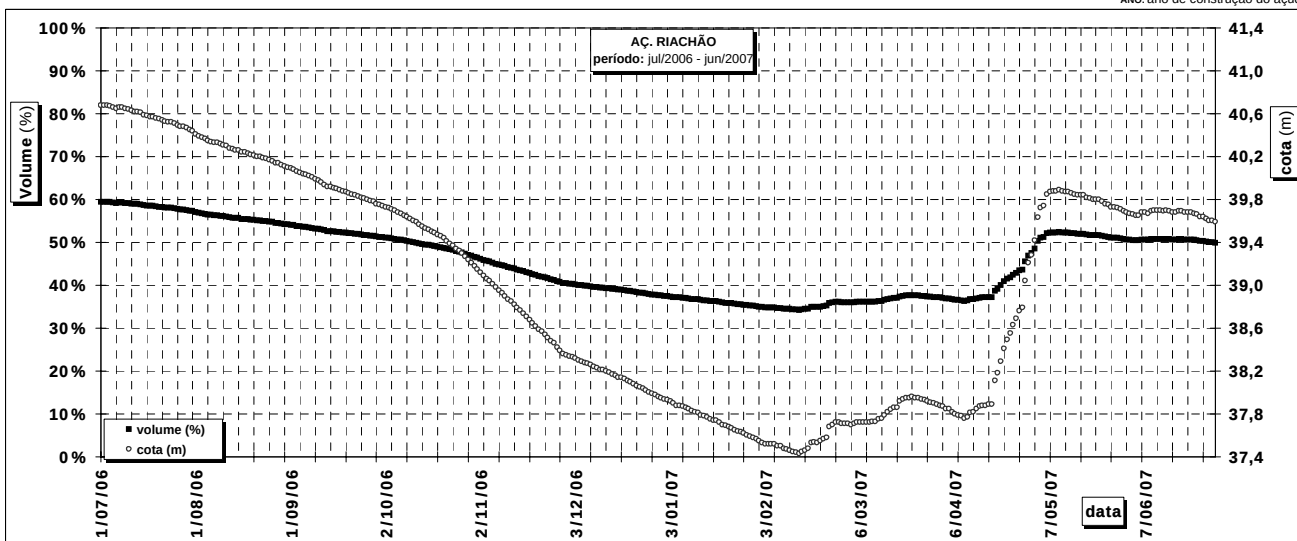

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	13/2/2007	227	40,68	37,44	3,24	1,43	27.910.402	16.099.996	11.810.406	602	203	399

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
14/2/2007	14/2/2007	17/6/2007	82	37,43	39,89	9.505.714	0	0	619.289	10.125.003

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
75.234	0	0	0	0	0	0	1.023.497	910.884	5.372.120	2.402.009	428.922	10.212.666

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	40,68	27.910.402	59,4%	-1.155.602	-37.277	-0,27	-0,87
01/08/2006	40,41	26.754.800	57,0%	-1.369.600	-44.181	-0,32	-1,03
01/09/2006	40,09	25.385.200	54,1%	-1.375.794	-45.860	-0,35	-1,17
01/10/2006	39,74	24.009.406	51,1%	-2.247.900	-72.513	-0,59	-1,90
01/11/2006	39,15	21.761.506	46,4%	-2.822.106	-94.070	-0,81	-2,70
01/12/2006	38,34	18.939.400	40,3%	-1.339.404	-43.207	-0,40	-1,29
01/01/2007	37,94	17.599.996	37,5%	-1.169.998	-37.742	-0,39	-1,26
01/02/2007	37,55	16.429.998	35,0%	480.000	17.143	0,16	0,57
01/03/2007	37,71	16.909.998	36,0%	510.006	16.452	0,17	0,55
01/04/2007	37,88	17.420.004	37,1%	4.836.792	161.226	1,40	4,67
01/05/2007	39,28	22.256.796	47,4%	1.524.006	49.161	0,40	1,29
01/06/2007	39,68	23.780.802	50,7%	-380.996	-12.700	-0,10	-0,33
01/07/2007	39,58	23.399.806	49,8%				
TOTAL ANUAL				-4.510.596		-1,10	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						5.331.658	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRESC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	25	1.678,0	5,88	39,00	21.456.150	45,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência GEMET

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Riacho do Sangue


MUNICÍPIO: Solonópole

B. HIDROGRÁFICA: Médio Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
61.424.000	5.178.400	118,00	108,00	120	153	1.369	1918

ANO: ano de construção do açude

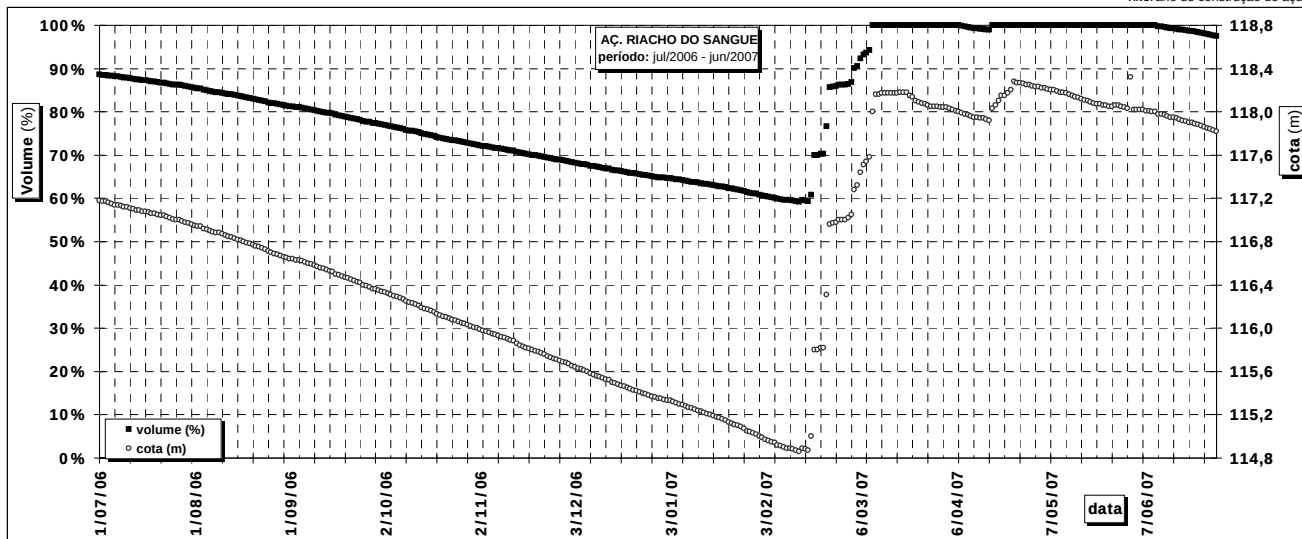

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	16/2/2007	230	117,18	114,88	2,30	1,00	54.457.776	36.510.524	17.947.252	903	640	263

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
17/2/2007	17/2/2007	10/6/2007	103	114,87	118,32	25.663.824	3.470.688	67.704.021	2.630.784	99.469.317

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	17.478.113	27.872.836	19.256.657	28.822.638	3.851.204	97.281.448

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	117,18	54.457.776	88,7%	-1.953.972	-63.031	-0,23	-0,74
01/08/2006	116,95	52.503.804	85,5%	-2.633.552	-84.953	-0,31	-1,00
01/09/2006	116,64	49.870.252	81,2%	-2.548.648	-84.955	-0,30	-1,00
01/10/2006	116,34	47.321.604	77,0%	-2.888.404	-93.174	-0,34	-1,10
01/11/2006	116,00	44.433.200	72,3%	-2.334.368	-77.812	-0,33	-1,10
01/12/2006	115,67	42.098.832	68,5%	-2.334.364	-75.302	-0,33	-1,06
01/01/2007	115,34	39.764.468	64,7%	-2.405.068	-77.583	-0,34	-1,10
01/02/2007	115,00	37.359.400	60,8%	15.569.200	556.043	2,00	7,14
01/03/2007	117,00	52.928.600	86,2%	8.495.400	274.045	1,04	3,35
01/04/2007	118,04	61.424.000	100,0%	0	0	0,20	0,67
01/05/2007	118,24	61.424.000	100,0%	0	0	-0,21	-0,68
01/06/2007	118,03	61.424.000	100,0%	-1.614.148	-53.805	-0,22	-0,73
01/07/2007	117,81	59.809.852	97,4%				
TOTAL ANUAL				5.352.076		0,63	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						13.924.416	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
356	0	79	80	230,5	7,34	116,72	50.613.376	82,4%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Rivaldo de Carvalho


MUNICÍPIO: Catarina

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
19.520.000		997,50		100	0	308	1966

ANO: ano de construção do açude

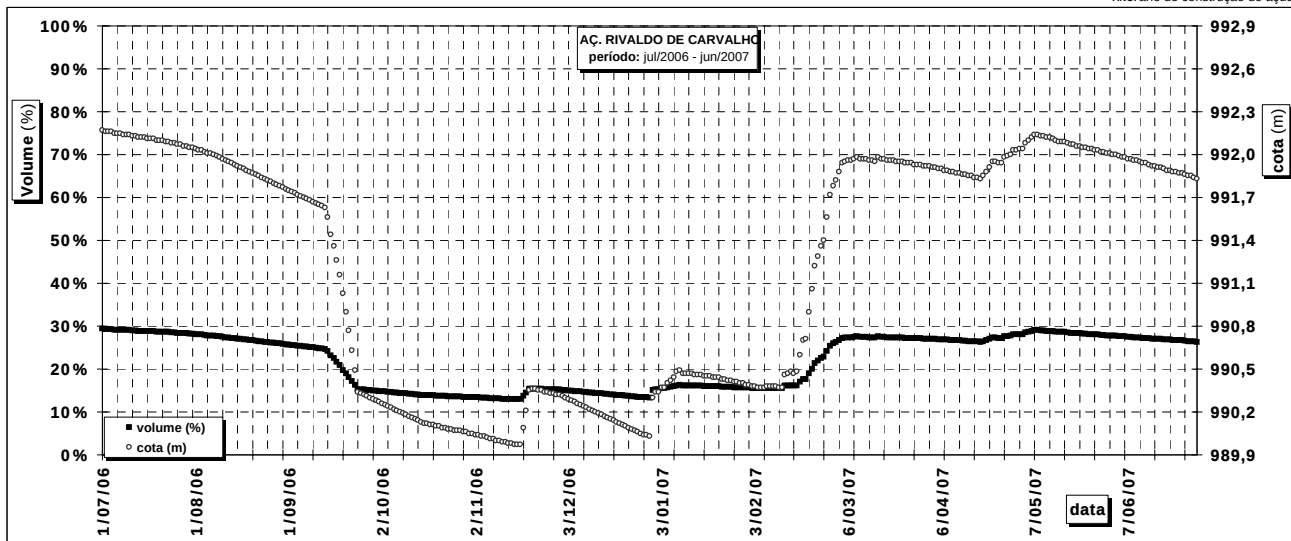

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	12/2/2007	6/5/2007	93	990,34	992,12	3.170.096	0	0	322.025	3.492.121

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	540.780	406.377	242.676	2.176.669	418.467	409.580	250.686	0	4.445.235

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	992,17	5.732.396	29,4%	-247.539	-7.985	-0,13	-0,42
01/08/2006	992,04	5.484.857	28,1%	-475.591	-15.342	-0,29	-0,94
01/09/2006	991,75	5.009.266	25,7%	-2.112.831	-70.428	-1,48	-4,93
01/10/2006	990,27	2.896.435	14,8%	-275.626	-8.891	-0,22	-0,71
01/11/2006	990,05	2.620.809	13,4%	325.705	10.857	0,26	0,87
01/12/2006	990,31	2.946.514	15,1%	37.617	1.213	0,03	0,10
01/01/2007	990,34	2.984.131	15,3%	62.617	2.020	0,05	0,16
01/02/2007	990,39	3.046.748	15,6%	2.010.501	71.804	1,39	4,96
01/03/2007	991,78	5.057.249	25,9%	223.629	7.214	0,14	0,45
01/04/2007	991,92	5.280.878	27,1%	185.036	6.168	0,11	0,37
01/05/2007	992,03	5.465.914	28,0%	-38.118	-1.230	-0,02	-0,06
01/06/2007	992,01	5.427.796	27,8%	-290.672	-9.689	-0,18	-0,60
01/07/2007	991,83	5.137.124	26,3%				
TOTAL ANUAL				-595.272		-0,34	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						3.529.339	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
361	0	0	19	1.602,8	2,81	991,22	4.274.880	21,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência/guatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Rosário


MUNICÍPIO: Lavras da Mangabeira

B. HIDROGRÁFICA: Salgado

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
47.200.000	4.489.914	288,00	278,00	100	0	337	2001

ANO: ano de construção do açude

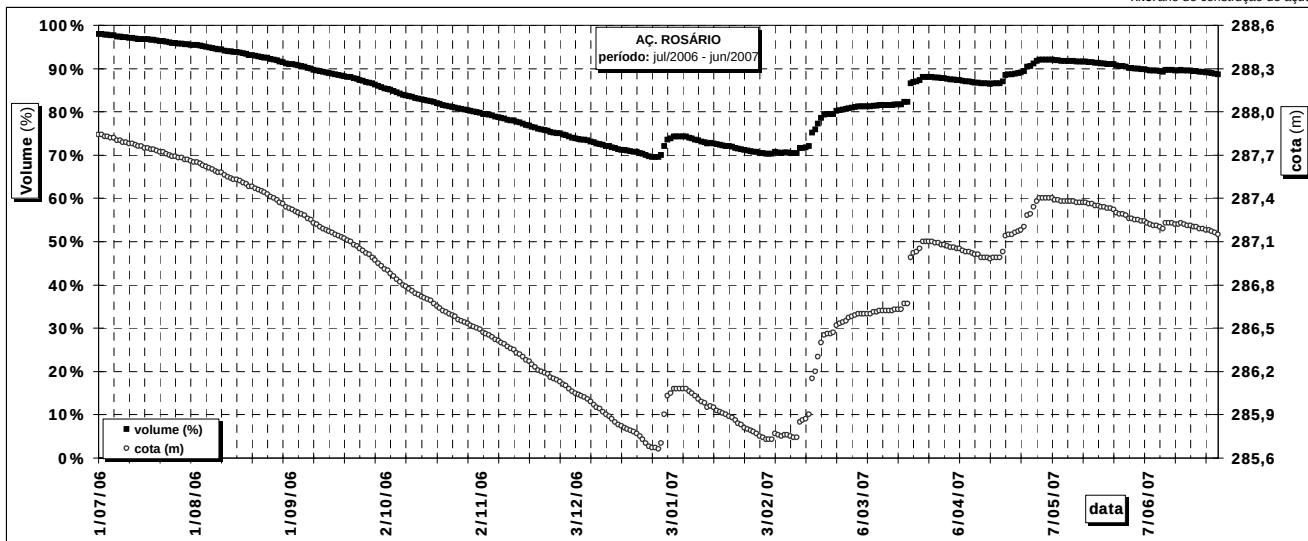

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	287,84	285,70	2,14	1,17	46.204.660	32.994.758	13.209.902	835	582	253

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007		17/6/2007	107	285,73	287,40	12.626.228	2.194.560	0	1.682.341	16.503.129

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	1.386.815	1.395.468	6.348.277	4.620.694	3.026.757	534.824	577.109	17.889.944

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	287,84	46.204.660	97,9%	-1.203.960	-38.837	-0,19	-0,61
01/08/2006	287,65	45.000.700	95,3%	-2.027.736	-65.411	-0,32	-1,03
01/09/2006	287,33	42.972.964	91,0%	-2.534.572	-84.486	-0,40	-1,33
01/10/2006	286,93	40.438.392	85,7%	-2.724.664	-87.892	-0,43	-1,39
01/11/2006	286,50	37.713.728	79,9%	-2.661.428	-88.714	-0,42	-1,40
01/12/2006	286,08	35.052.300	74,3%	-1.023.792	-33.026	-0,18	-0,58
01/01/2007	285,90	34.028.508	72,1%	-775.352	-25.011	-0,15	-0,48
01/02/2007	285,75	33.253.156	70,5%	4.777.324	170.619	0,80	2,86
01/03/2007	286,55	38.030.480	80,6%	3.358.352	108.334	0,53	1,71
01/04/2007	287,08	41.388.832	87,7%	1.647.560	54.919	0,26	0,87
01/05/2007	287,34	43.036.392	91,2%	-506.836	-16.350	-0,08	-0,26
01/06/2007	287,26	42.529.556	90,1%	-760.352	-25.345	-0,12	-0,40
01/07/2007	287,14	41.769.204	88,5%				
TOTAL ANUAL				-4.435.456		-0,70	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						14.034.072	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	
365	0	0	32	963,0	6,37	286,81	39.695.200	84,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrato

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Salão


MUNICÍPIO: Canindé

B. HIDROGRÁFICA: Curu

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
6.040.000	190.000	95,00	87,00	65	0	85	1918

ANO: ano de construção do açude

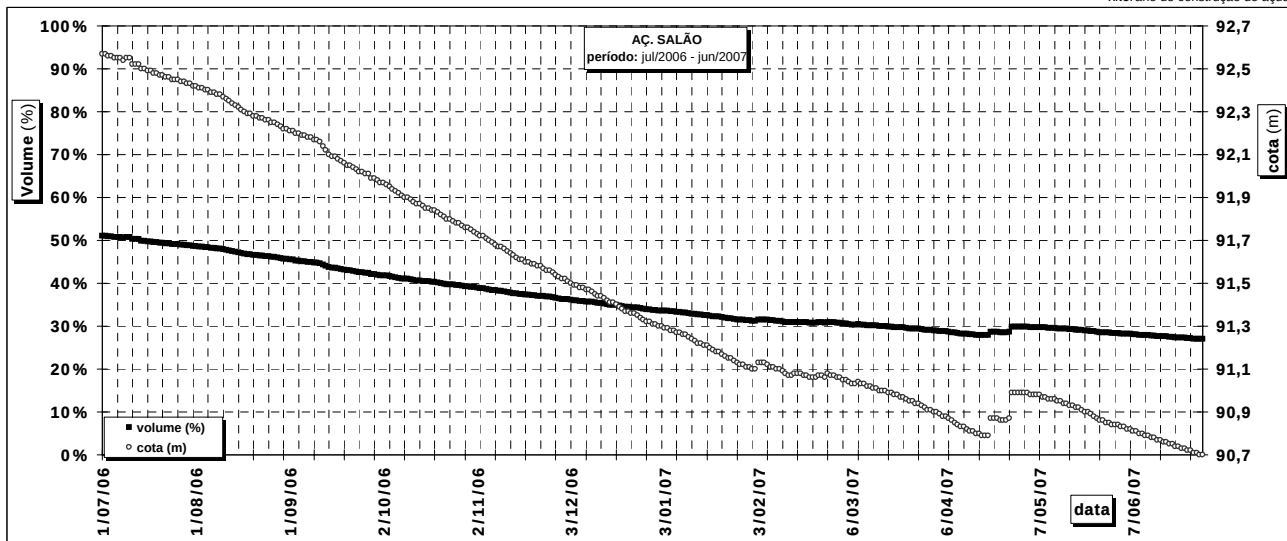

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/1/2007	214	92,57	91,11	1,46	0,68	3.080.100	1.891.401	1.188.699	64	59	5

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/2/2007		27/4/2007	45	90,79	91,13	185.207	0	0	45.034	230.241

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
18.064	0	0	0	0	0	0	81.781	11.184	139.213	0	0	250.242

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	92,57	3.080.100	51,0%	-139.502	-4.500	-0,15	-0,48
01/08/2006	92,42	2.940.598	48,7%	-195.299	-6.300	-0,21	-0,68
01/09/2006	92,21	2.745.299	45,5%	-217.498	-7.250	-0,24	-0,80
01/10/2006	91,97	2.527.801	41,9%	-170.202	-5.490	-0,23	-0,74
01/11/2006	91,74	2.357.599	39,0%	-162.801	-5.427	-0,22	-0,73
01/12/2006	91,52	2.194.798	36,3%	-162.796	-5.251	-0,22	-0,71
01/01/2007	91,30	2.032.002	33,6%	-148.003	-4.774	-0,20	-0,65
01/02/2007	91,10	1.883.999	31,2%	-29.601	-1.057	-0,04	-0,14
01/03/2007	91,06	1.854.398	30,7%	-98.396	-3.174	-0,15	-0,48
01/04/2007	90,91	1.756.002	29,1%	47.997	1.600	0,08	0,27
01/05/2007	90,99	1.803.999	29,9%	-90.001	-2.903	-0,15	-0,48
01/06/2007	90,84	1.713.998	28,4%	-89.996	-3.000	-0,15	-0,50
01/07/2007	90,69	1.624.002	26,9%				
TOTAL ANUAL				-1.456.098		-1,88	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.407.031	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	12	8.809,9	2,93	91,48	2.180.440	36,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Santa Maria


MUNICÍPIO: Ererê

B. HIDROGRÁFICA: Médio Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
5.866.800		99,00		100	0	136	2004

ANO: ano de construção do açude

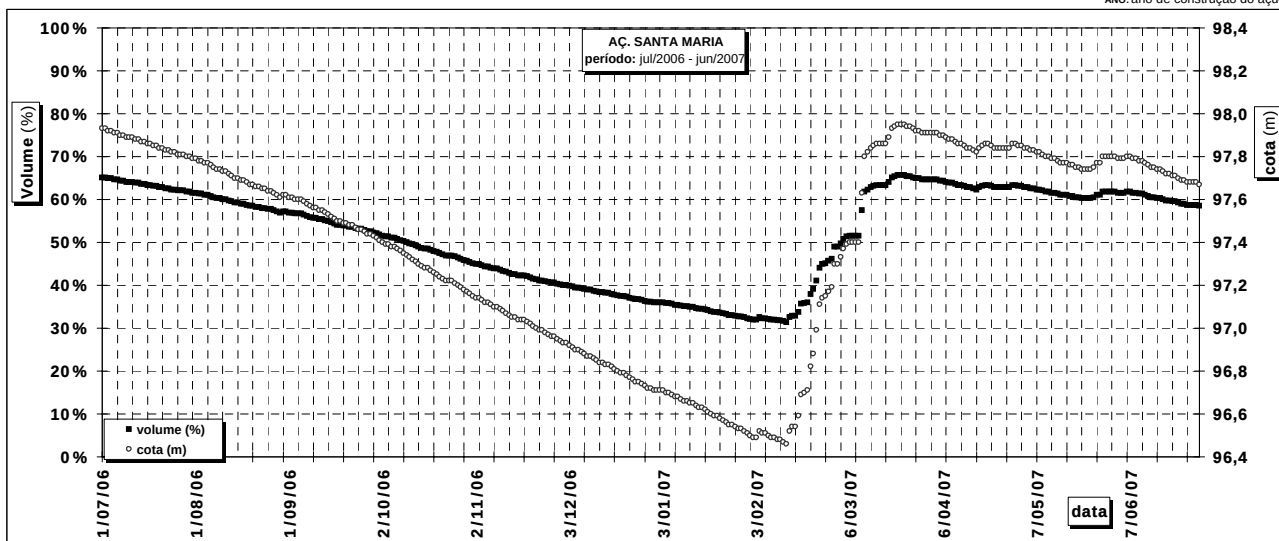

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	12/2/2007	226	97,93	96,47	1,46	0,65	3.820.786	1.852.063	1.968.723	100	100	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
13/2/2007	13/2/2007	5/6/2007	84	96,46	97,95	2.205.159	0	0	318.406	2.523.565

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	36.966	0	0	0	0	0	1.182.724	1.096.999	135.753	122.401	37.197	2.612.040

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	97,93	3.820.786	65,1%	-210.629	-6.794	-0,14	-0,45
01/08/2006	97,79	3.610.157	61,5%	-270.811	-8.736	-0,18	-0,58
01/09/2006	97,61	3.339.346	56,9%	-300.895	-10.030	-0,20	-0,67
01/10/2006	97,41	3.038.451	51,8%	-391.174	-12.619	-0,26	-0,84
01/11/2006	97,15	2.647.277	45,1%	-300.899	-10.030	-0,22	-0,73
01/12/2006	96,93	2.346.378	40,0%	-236.413	-7.626	-0,22	-0,71
01/01/2007	96,71	2.109.965	36,0%	-225.665	-7.280	-0,21	-0,68
01/02/2007	96,50	1.884.300	32,1%	988.655	35.309	0,80	2,86
01/03/2007	97,30	2.872.955	49,0%	917.746	29.605	0,61	1,97
01/04/2007	97,91	3.790.701	64,6%	-90.278	-3.009	-0,06	-0,20
01/05/2007	97,85	3.700.423	63,1%	-75.218	-2.426	-0,05	-0,16
01/06/2007	97,80	3.625.205	61,8%	-195.593	-6.520	-0,13	-0,43
01/07/2007	97,67	3.429.612	58,5%				
TOTAL ANUAL				-391.174		-0,26	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						3.065.360	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	23	819,8	2,06	97,39	3.044.869	51,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: S. Maria de Aracat.


MUNICÍPIO: Sobral

B. HIDROGRÁFICA: Litoral

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
8.200.000	1.540.000	98,00	94,00	90	0	154	1923

ANO: ano de construção do açude

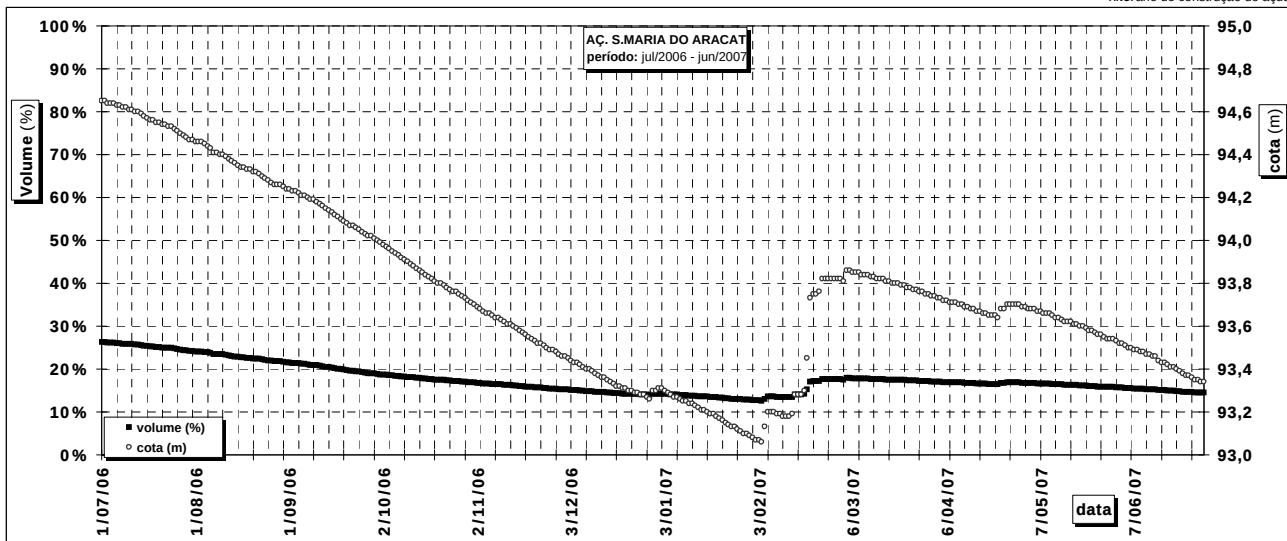

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	3/2/2007	217	94,65	93,07	1,58	0,73	2.151.002	1.037.800	1.113.202	59	51	8

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
4/2/2007	4/2/2007	25/4/2007	50	93,06	93,86	480.598	0	0	64.185	544.783

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	40.620	0	472.626	32.192	42.519	0	0	587.957

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	94,65	2.151.002	26,2%	-178.603	-5.761	-0,19	-0,61
01/08/2006	94,46	1.972.399	24,1%	-206.801	-6.671	-0,22	-0,71
01/09/2006	94,24	1.765.598	21,5%	-230.999	-7.700	-0,25	-0,83
01/10/2006	93,99	1.534.599	18,7%	-156.601	-5.052	-0,29	-0,94
01/11/2006	93,70	1.377.998	16,8%	-129.598	-4.320	-0,24	-0,80
01/12/2006	93,46	1.248.400	15,2%	-81.001	-2.613	-0,15	-0,48
01/01/2007	93,31	1.167.399	14,2%	-124.198	-4.006	-0,23	-0,74
01/02/2007	93,08	1.043.201	12,7%	399.599	14.271	0,74	2,64
01/03/2007	93,82	1.442.800	17,6%	-43.201	-1.394	-0,08	-0,26
01/04/2007	93,74	1.399.599	17,1%	-26.998	-900	-0,05	-0,17
01/05/2007	93,69	1.372.601	16,7%	-86.402	-2.787	-0,16	-0,52
01/06/2007	93,53	1.286.199	15,7%	-107.998	-3.600	-0,20	-0,67
01/07/2007	93,33	1.178.201	14,4%				
TOTAL ANUAL				-972.801		-1,32	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.595.426	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
362	0	0	28	5.090,5	1,73	93,75	1.443.200	17,6%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Santo Antônio


MUNICÍPIO: Iracema

B. HIDROGRÁFICA: Médio Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
832.000		54,50		0	0	3	2001

ANO: ano de construção do açude

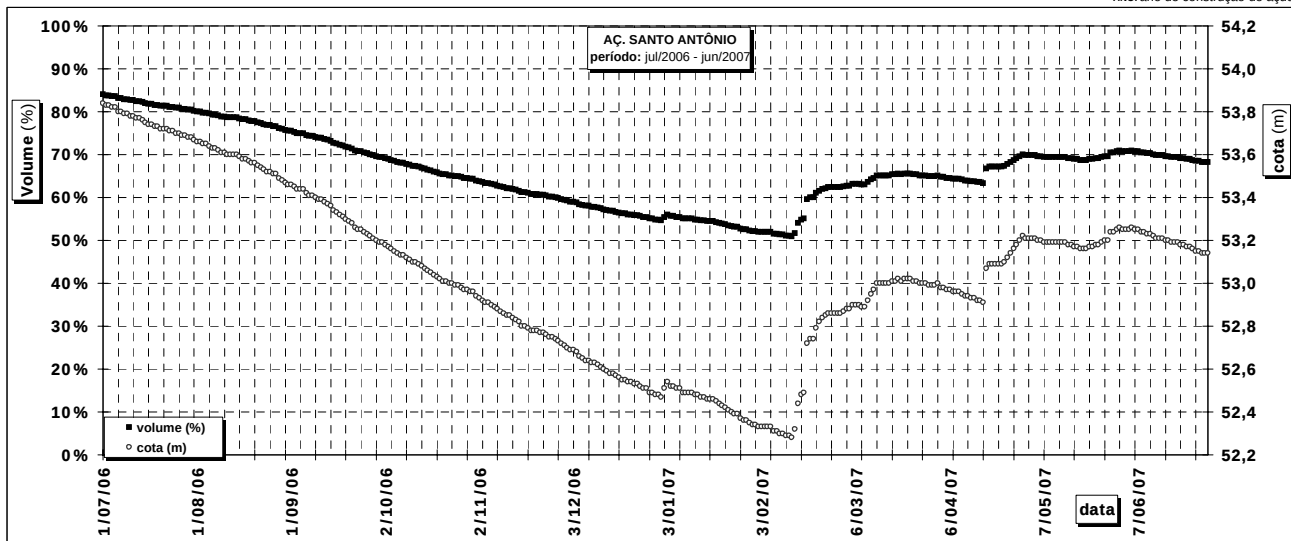

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	53,84	52,48	1,36	0,74	698.712	456.312	242.400	15	14	1

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	13/2/2007	4/6/2007	91	52,28	53,26	215.208	0	0	81.792	297.000

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	15.638	117.212	51.100	73.113	32.005	4.926	293.994

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	53,84	698.712	84,0%	-33.624	-1.085	-0,18	-0,58
01/08/2006	53,66	665.088	79,9%	-37.360	-1.205	-0,20	-0,65
01/09/2006	53,46	627.728	75,4%	-50.436	-1.681	-0,27	-0,90
01/10/2006	53,19	577.292	69,4%	-45.356	-1.463	-0,25	-0,81
01/11/2006	52,94	531.936	63,9%	-39.456	-1.315	-0,24	-0,80
01/12/2006	52,70	492.480	59,2%	-37.812	-1.220	-0,23	-0,74
01/01/2007	52,47	454.668	54,6%	-21.372	-689	-0,13	-0,42
01/02/2007	52,34	433.296	52,1%	85.488	3.053	0,52	1,86
01/03/2007	52,86	518.784	62,4%	21.372	689	0,13	0,42
01/04/2007	52,99	540.156	64,9%	40.872	1.362	0,22	0,73
01/05/2007	53,21	581.028	69,8%	9.340	301	0,05	0,16
01/06/2007	53,26	590.368	71,0%	-24.284	-809	-0,13	-0,43
01/07/2007	53,13	566.084	68,0%				
TOTAL ANUAL				-132.628		-0,71	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						699.249	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	MÉDIO (%)
363	0	0	23	1.032,9	1,69	53,04	553.280	66,5%

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: S. Ant. de Aracat.


MUNICÍPIO: Sobral

B. HIDROGRÁFICA: Litoral

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
24.340.000	1.940.000	93,00	84,00	185	154	627	1954

ANO: ano de construção do açude

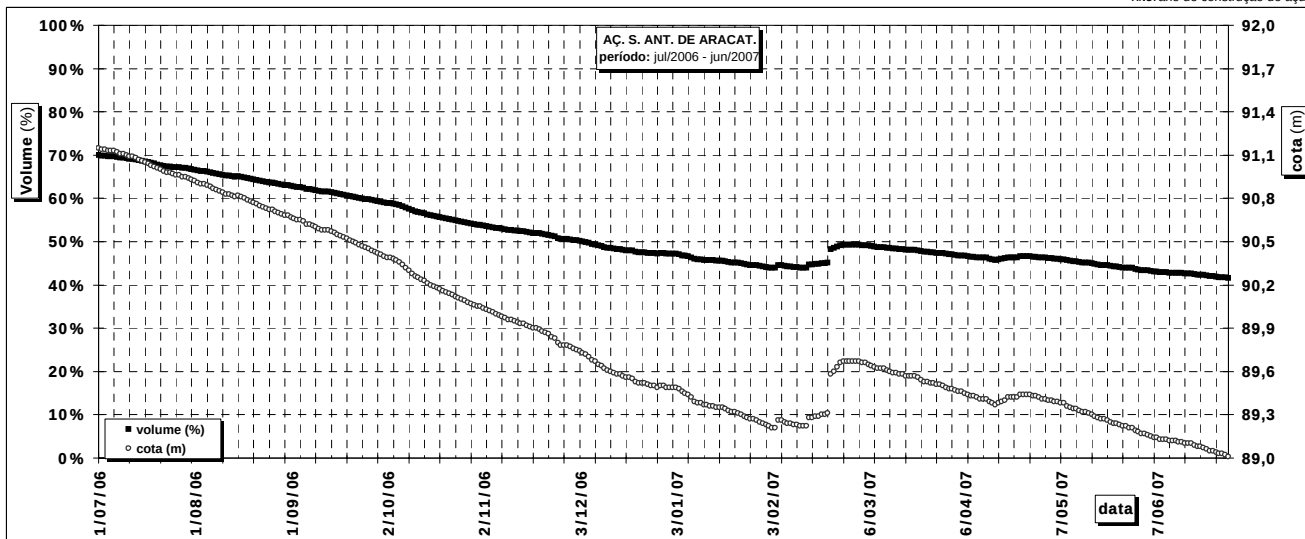

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	2/2/2007	216	91,15	89,22	1,93	0,89	17.032.506	10.709.203	6.323.303	338	243	95

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
3/2/2007		23/4/2007	42	89,21	89,67	1.630.200	176.256	0	267.553	2.074.009

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	74.960	0	0	0	87.006	0	1.782.867	0	304.260	0	0	2.249.093

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	91,15	17.032.506	70,0%	-844.912	-27.255	-0,23	-0,74
01/08/2006	90,92	16.187.594	66,5%	-882.500	-28.468	-0,25	-0,81
01/09/2006	90,67	15.305.094	62,9%	-953.089	-31.770	-0,27	-0,90
01/10/2006	90,40	14.352.005	59,0%	-1.235.494	-39.855	-0,35	-1,13
01/11/2006	90,05	13.116.511	53,9%	-862.905	-28.764	-0,29	-0,97
01/12/2006	89,76	12.253.606	50,3%	-772.212	-24.910	-0,27	-0,87
01/01/2007	89,49	11.481.394	47,2%	-743.584	-23.987	-0,26	-0,84
01/02/2007	89,23	10.737.810	44,1%	-1.258.385	-44.942	0,44	1,57
01/03/2007	89,67	11.996.195	49,3%	-543.385	-17.529	-0,19	-0,61
01/04/2007	89,48	11.452.810	47,1%	-200.200	-6.673	-0,07	-0,23
01/05/2007	89,41	11.252.610	46,2%	-657.809	-21.220	-0,23	-0,74
01/06/2007	89,18	10.594.801	43,5%	-514.801	-17.160	-0,18	-0,60
01/07/2007	89,00	10.080.000	41,4%				
TOTAL ANUAL				-6.952.506		-2,15	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						6.007.784	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
360	0	0	27	3.950,1	4,13	89,86	12.681.140	52,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: S. Ant. de Russas


MUNICÍPIO: Russas

B. HIDROGRÁFICA: Baixo Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
24.000.000	3.057.250	109,28	104,50	56	0	624	1927

ANO: ano de construção do açude

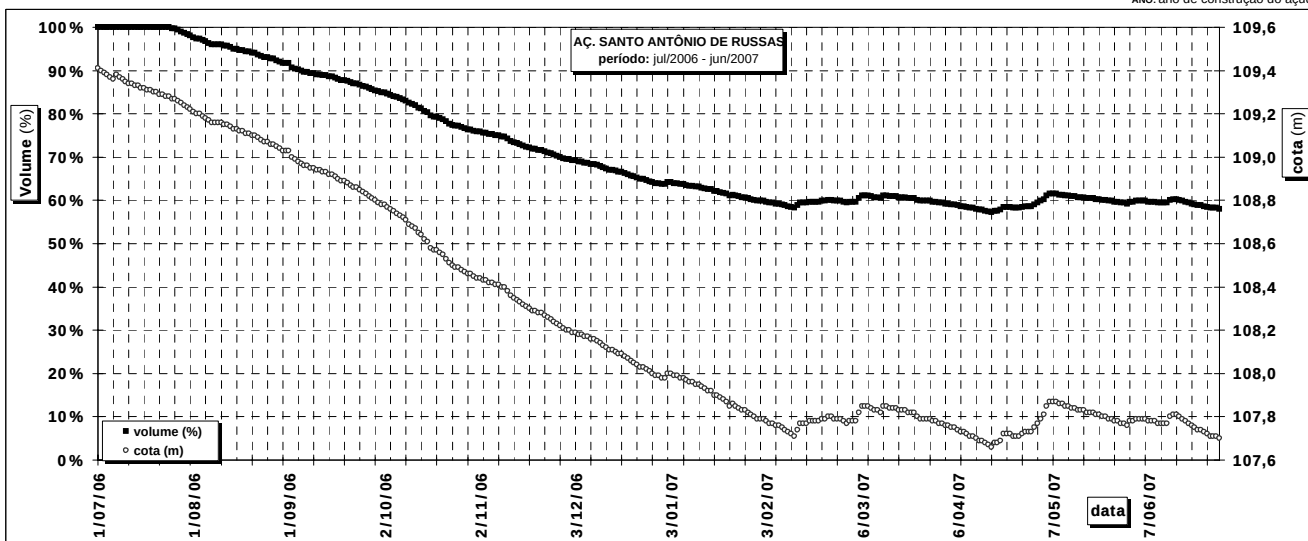

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	30/12/2006	182	109,41	107,99	1,42	0,78	24.000.000	15.345.900	8.654.100	550	550	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
13/2/2007		14/6/2007	83	107,66	107,87	2.258.171	0	0	814.295	3.072.466

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
4.051.535	0	0	0	0	0	258.000	752.309	660.477	657.694	795.396	404.498	7.579.909

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	109,41	24.000.000	100,0%	-557.258	-17.976	-0,20	-0,65
01/08/2006	109,21	23.442.742	97,7%	-1.432.930	-46.224	-0,18	-0,58
01/09/2006	109,03	22.009.812	91,7%	-1.641.540	-54.718	-0,25	-0,83
01/10/2006	108,78	20.368.272	84,9%	-2.167.816	-69.930	-0,34	-1,10
01/11/2006	108,44	18.200.456	75,8%	-1.530.275	-51.009	-0,24	-0,80
01/12/2006	108,20	16.670.181	69,5%	-1.373.345	-44.301	-0,22	-0,71
01/01/2007	107,98	15.296.836	63,7%	-932.722	-30.088	-0,19	-0,61
01/02/2007	107,79	14.364.114	59,9%	-98.200	-3.507	-0,02	-0,07
01/03/2007	107,77	14.265.914	59,4%	0	0	0,00	0,00
01/04/2007	107,77	14.265.914	59,4%	-98.164	-3.272	-0,02	-0,07
01/05/2007	107,75	14.167.750	59,0%	147.264	4.750	0,03	0,10
01/06/2007	107,78	14.315.014	59,6%	-392.729	-13.091	-0,08	-0,27
01/07/2007	107,70	13.922.285	58,0%				
TOTAL ANUAL				-10.077.715		-1,71	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						13.738.826	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	4	1.155,7	2,85	108,27	17.280.000	72,0%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: São Domingos


MUNICÍPIO: Caridade

B. HIDROGRÁFICA: Curu

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
3.035.000	310.000	98,50	92,15	120	0	16	1977

ANO: ano de construção do açude

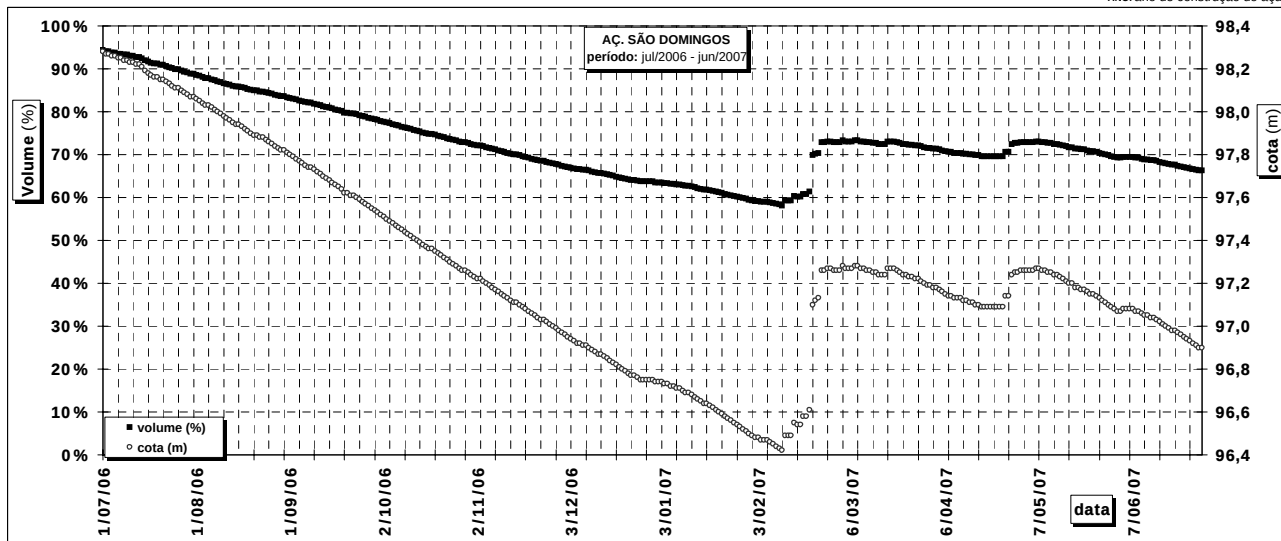

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	10/2/2007	224	98,28	96,43	1,85	0,83	2.861.199	1.769.300	1.091.899	56	42	14

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
11/2/2007		3/6/2007	64	96,42	97,28	602.499	2.592	0	69.246	674.337

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	492.571	47.626	110.034	10.374	15.413	676.018

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	98,28	2.861.199	94,3%	-173.801	-5.606	-0,22	-0,71
01/08/2006	98,06	2.687.398	88,5%	-163.396	-5.271	-0,26	-0,84
01/09/2006	97,80	2.524.002	83,2%	-162.404	-5.413	-0,28	-0,93
01/10/2006	97,52	2.361.598	77,8%	-168.196	-5.426	-0,29	-0,94
01/11/2006	97,23	2.193.402	72,3%	-153.802	-5.127	-0,27	-0,90
01/12/2006	96,96	2.039.600	67,2%	-112.201	-3.619	-0,22	-0,71
01/01/2007	96,74	1.927.399	63,5%	-127.500	-4.113	-0,25	-0,81
01/02/2007	96,49	1.799.899	59,3%	410.902	14.675	0,77	2,75
01/03/2007	97,26	2.210.801	72,8%	-40.599	-1.310	-0,07	-0,23
01/04/2007	97,19	2.170.202	71,5%	40.599	1.353	0,07	0,23
01/05/2007	97,26	2.210.801	72,8%	-104.400	-3.368	-0,18	-0,58
01/06/2007	97,08	2.106.401	69,4%	-102.501	-3.417	-0,19	-0,63
01/07/2007	96,89	2.003.900	66,0%				
TOTAL ANUAL				-857.299		-1,39	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.057.051	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
362	0	0	49	1.638,7	3,90	97,26	2.218.585	73,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: São José I


MUNICÍPIO: Boa Viagem

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
7.670.000	875.000	100,00	94,50	120	0	185	1988

ANO: ano de construção do açude

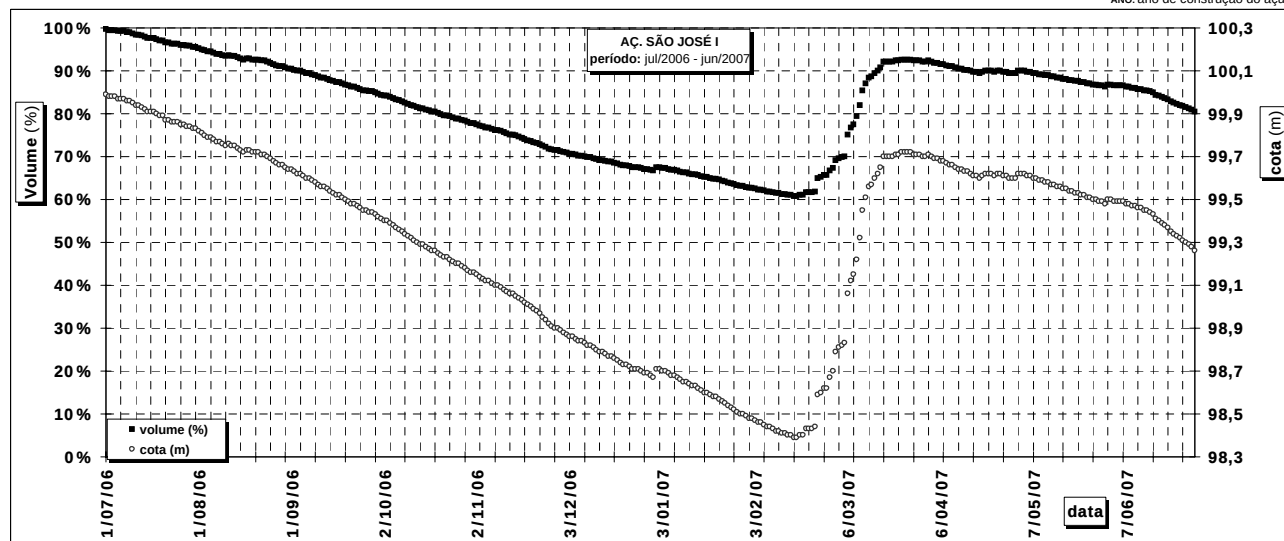

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	15/2/2007	229	99,99	98,40	1,59	0,69	7.649.696	4.680.003	2.969.693	150	150	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
16/2/2007	16/2/2007	31/5/2007	74	98,39	99,72	2.600.024	0	0	324.174	2.924.198

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	82.249	0	0	0	77.277	0	597.761	2.091.742	123.469	97.330	0	3.069.828

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	99,99	7.649.696	99,7%	-345.096	-11.132	-0,17	-0,55
01/08/2006	99,82	7.304.600	95,2%	-365.401	-11.787	-0,18	-0,58
01/09/2006	99,64	6.939.199	90,5%	-466.891	-15.563	-0,23	-0,77
01/10/2006	99,41	6.472.308	84,4%	-507.500	-16.371	-0,25	-0,81
01/11/2006	99,16	5.964.808	77,8%	-516.812	-17.227	-0,28	-0,93
01/12/2006	98,88	5.447.996	71,0%	-271.997	-8.774	-0,17	-0,55
01/01/2007	98,71	5.175.999	67,5%	-367.993	-11.871	-0,23	-0,74
01/02/2007	98,48	4.808.006	62,7%	351.989	12.571	0,22	0,79
01/03/2007	98,70	5.159.995	67,3%	1.900.999	61.323	1,00	3,23
01/04/2007	99,70	7.060.994	92,1%	-202.997	-6.767	-0,10	-0,33
01/05/2007	99,60	6.857.997	89,4%	-202.997	-6.548	-0,10	-0,32
01/06/2007	99,50	6.655.000	86,8%	-507.500	-16.917	-0,25	-0,83
01/07/2007	99,25	6.147.500	80,1%				
TOTAL ANUAL				-1.502.196		-0,74	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						4.013.368	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	23	912,0	3,23	99,29	6.266.390	81,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Quixeramobim

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: São José ii


MUNICÍPIO: Piquet Carneiro

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
29.140.000	6.414.000	250,00	242,00	60	0	226	1992

ANO: ano de construção do açude

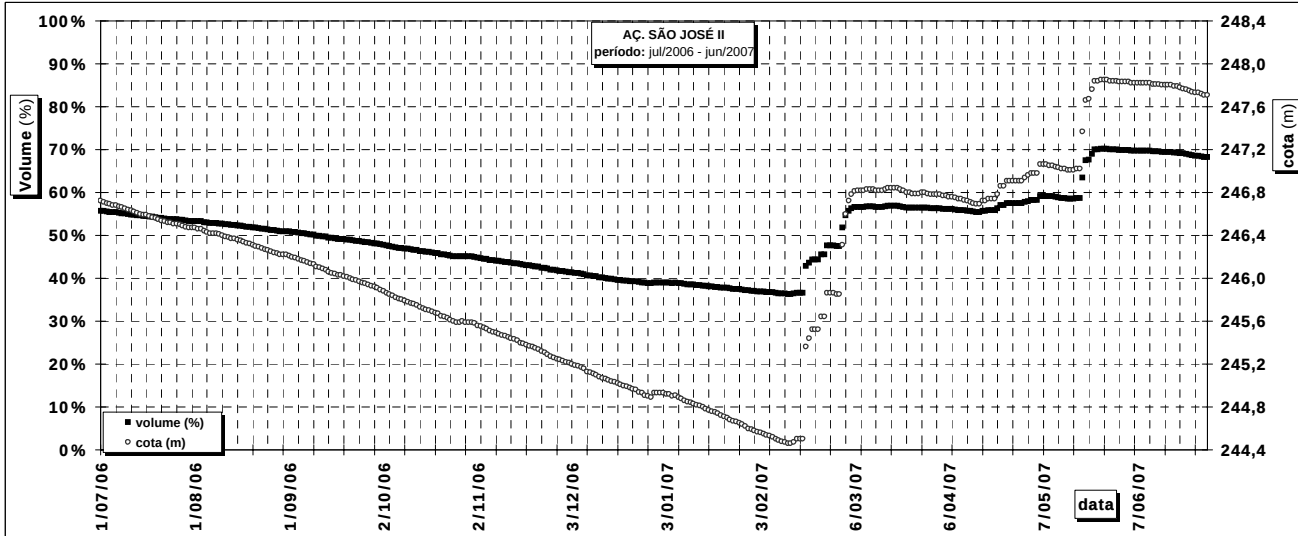

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	246,72	244,47	2,25	1,00	16.228.603	10.593.242	5.635.361	289	196	93

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	25/5/2007	80	244,46	247,84	10.561.586	72.064	0	571.123	11.204.773

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	71.855	0	104.284	31.308	3.451.621	2.949.701	820.791	3.980.437	0	11.409.997

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	246,72	16.228.603	55,7%	-688.750	-22.218	-0,25	-0,81
01/08/2006	246,47	15.539.853	53,3%	-716.285	-23.106	-0,26	-0,84
01/09/2006	246,21	14.823.568	50,9%	-881.620	-29.387	-0,32	-1,07
01/10/2006	245,89	13.941.948	47,8%	-854.043	-27.550	-0,31	-1,00
01/11/2006	245,58	13.087.905	44,9%	-991.802	-33.060	-0,36	-1,20
01/12/2006	245,22	12.096.103	41,5%	-724.555	-23.373	-0,29	-0,94
01/01/2007	244,93	11.371.548	39,0%	-592.185	-19.103	-0,35	-1,13
01/02/2007	244,58	10.779.363	37,0%	3.052.404	109.014	1,27	4,54
01/03/2007	245,85	13.831.767	47,5%	2.562.130	82.649	0,93	3,00
01/04/2007	246,78	16.393.897	56,3%	440.809	14.694	0,16	0,53
01/05/2007	246,94	16.834.706	57,8%	3.524.034	113.679	0,89	2,87
01/06/2007	247,83	20.358.740	69,9%	-526.086	-17.536	-0,13	-0,43
01/07/2007	247,70	19.832.654	68,1%				
TOTAL ANUAL				3.604.051		0,98	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						5.545.259	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	86	932,2	5,13	246,13	14.773.980	50,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Quixeramobim

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: São Mateus


MUNICÍPIO: Canindé

B. HIDROGRÁFICA: Curu

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
10.330.000	510.000	191,00	182,00	200	0	232	1957

ANO: ano de construção do açude

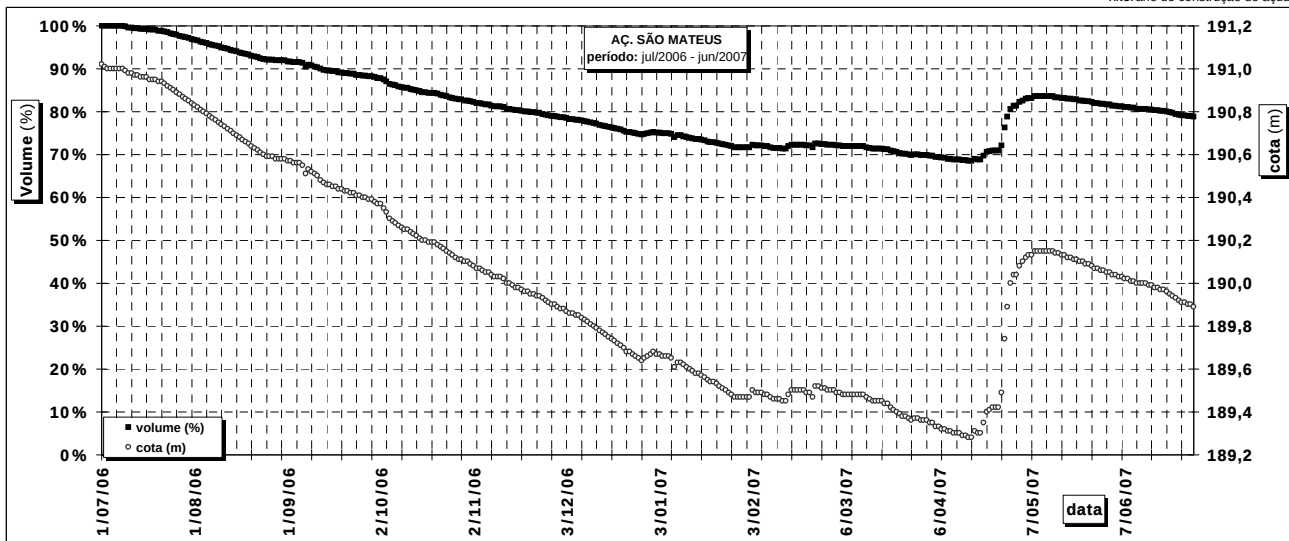

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	28/12/2006	180	191,02	189,64	1,38	0,77	10.330.000	7.703.599	2.626.401	168	145	23

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
29/1/2007	17/4/2007	7/5/2007	57	189,28	190,13	1.813.780	6.048	0	177.316	1.997.144

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
108.885	0	53.957	0	0	116.470	53.558	287.554	27.014	1.420.961	267.608	0	2.336.007

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	191,02	10.330.000	100,0%	-339.996	-10.968	-0,19	-0,61
01/08/2006	190,83	9.990.004	96,7%	-519.989	-16.774	-0,26	-0,84
01/09/2006	190,57	9.470.015	91,7%	-400.025	-13.334	-0,20	-0,67
01/10/2006	190,37	9.069.990	87,8%	-559.997	-18.064	-0,28	-0,90
01/11/2006	190,09	8.509.993	82,4%	-388.784	-12.959	-0,21	-0,70
01/12/2006	189,88	8.121.209	78,6%	-348.021	-11.226	-0,20	-0,65
01/01/2007	189,68	7.773.188	75,2%	-365.386	-11.787	-0,21	-0,68
01/02/2007	189,47	7.407.802	71,7%	52.198	1.864	0,03	0,11
01/03/2007	189,50	7.460.000	72,2%	-243.599	-7.858	-0,14	-0,45
01/04/2007	189,36	7.216.401	69,9%	1.193.586	39.786	0,68	2,27
01/05/2007	190,04	8.409.987	81,4%	20.019	646	0,01	0,03
01/06/2007	190,05	8.430.006	81,6%	-291.407	-9.714	-0,16	-0,53
01/07/2007	189,89	8.138.599	78,8%				
TOTAL ANUAL				-2.191.401		-1,13	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						3.491.106	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
362	0	0	25	1.614,1	4,50	190,01	8.398.290	81,3%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: S. Pedro Timbaúba


MUNICÍPIO: Miraima

B. HIDROGRÁFICA: Litoral

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
19.250.000		99,00		155	969	1.553	1916

ANO: ano de construção do açude

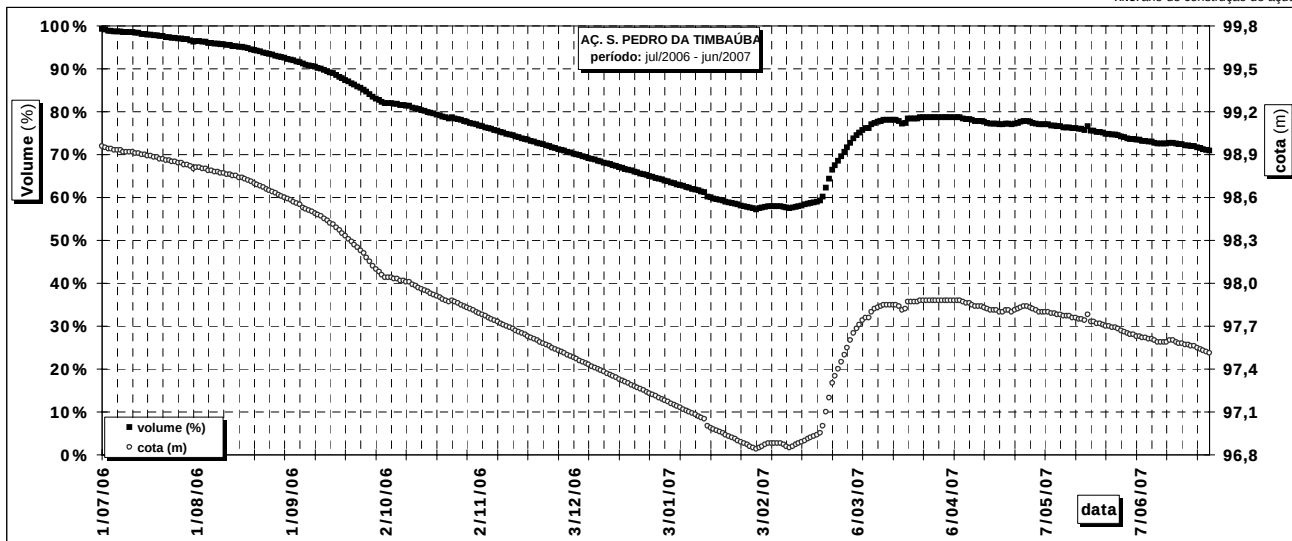

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/1/2007	214	98,96	96,85	2,11	0,99	19.104.948	11.050.250	8.054.698	435	284	151

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/2/2007	1/2/2007	16/6/2007	96	96,84	97,88	4.793.530	34.560	0	755.576	5.583.666

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
56.842	0	0	75.677	0	0	0	2.884.372	2.153.264	300.714	174.813	85.494	5.731.176

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	98,96	19.104.948	99,2%	-543.934	-17.546	-0,15	-0,48
01/08/2006	98,81	18.561.014	96,4%	-834.012	-26.904	-0,23	-0,74
01/09/2006	98,58	17.727.002	92,1%	-1.885.639	-62.855	-0,52	-1,73
01/10/2006	98,06	15.841.363	82,3%	-1.028.031	-33.162	-0,26	-0,84
01/11/2006	97,80	14.813.332	77,0%	-1.215.732	-40.524	-0,30	-1,00
01/12/2006	97,50	13.597.600	70,6%	-1.256.234	-40.524	-0,31	-1,00
01/01/2007	97,19	12.341.366	64,1%	-1.325.867	-42.770	-0,35	-1,13
01/02/2007	96,84	11.015.499	57,2%	2.379.469	84.981	0,61	2,18
01/03/2007	97,45	13.394.968	69,6%	1.742.533	56.211	0,43	1,39
01/04/2007	97,88	15.137.501	78,6%	-162.100	-5.403	-0,04	-0,13
01/05/2007	97,84	14.975.401	77,8%	-688.900	-22.223	-0,17	-0,55
01/06/2007	97,67	14.286.501	74,2%	-688.901	-22.963	-0,17	-0,57
01/07/2007	97,50	13.597.600	70,6%				
TOTAL ANUAL				-5.507.348		-1,46	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						7.436.774	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC.	TEMPO DE RESID.	PROFUND. MÉDIA	COTA MÉDIA	V. ARM. MÉDIO	
			(cm/dia)	(dias)	(m)	(m)	(m³)	(%)
356	0	0	10	1.226,0	3,81	97,83	14.861.000	77,2%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: São Vicente


MUNICÍPIO: Santana do Acaraú

B. HIDROGRÁFICA: Acaraú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
9.840.000	760.000	102,00	91,50	40	0	75	1923

ANO: ano de construção do açude

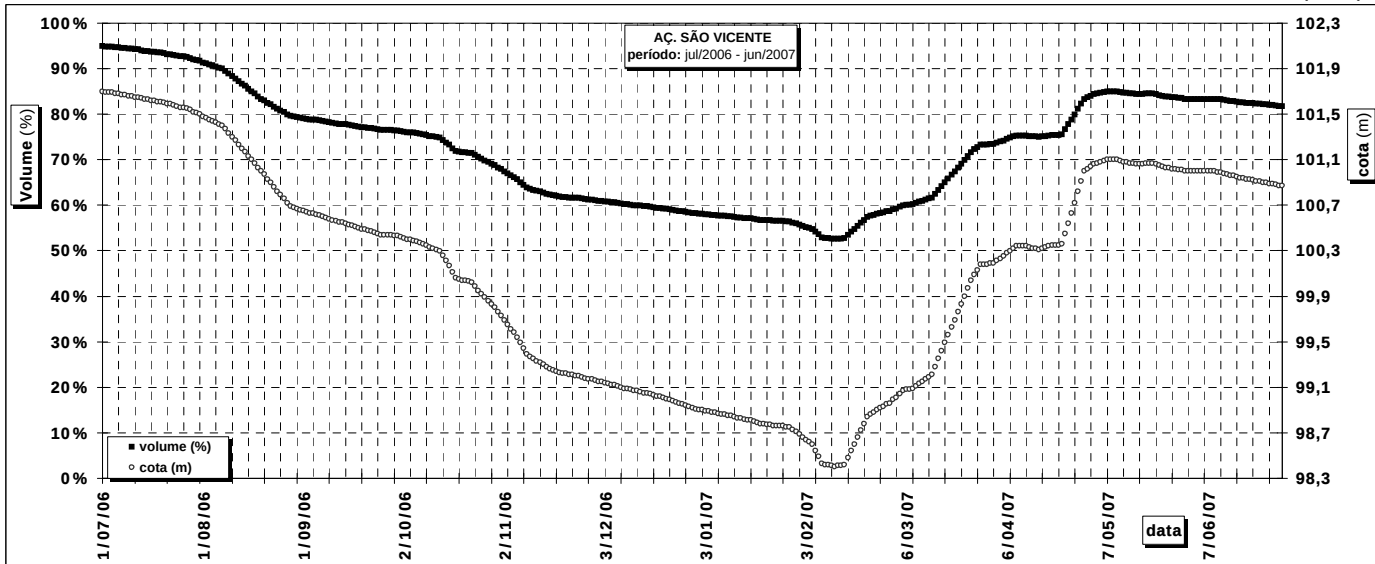

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	101,70	98,41	3,29	1,46	9.347.995	5.182.804	4.165.191	214	93	121

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	15/2/2007	17/5/2007	83	98,40	101,10	3.227.995	0	0	313.029	3.541.024

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	688.945	1.561.806	1.126.685	114.948	0	3.492.384

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	101,70	9.347.995	95,0%	-360.789	-11.638	-0,22	-0,71
01/08/2006	101,48	8.987.206	91,3%	-1.207.204	-38.942	-0,83	-2,68
01/09/2006	100,65	7.780.002	79,1%	-276.004	-9.200	-0,23	-0,77
01/10/2006	100,42	7.503.998	76,3%	-822.594	-26.535	-0,69	-2,23
01/11/2006	99,73	6.681.404	67,9%	-684.402	-22.813	-0,58	-1,93
01/12/2006	99,15	5.997.002	60,9%	-285.000	-9.194	-0,25	-0,81
01/01/2007	98,90	5.712.002	58,0%	-226.799	-7.316	-0,21	-0,68
01/02/2007	98,69	5.485.203	55,7%	291.596	10.414	0,27	0,96
01/03/2007	98,96	5.776.799	58,7%	1.451.204	46.813	1,23	3,97
01/04/2007	100,19	7.228.003	73,5%	1.004.792	33.493	0,83	2,77
01/05/2007	101,02	8.232.795	83,7%	-32.795	-1.058	-0,02	-0,06
01/06/2007	101,00	8.200.000	83,3%	-167.999	-5.600	-0,14	-0,47
01/07/2007	100,86	8.032.001	81,6%				
TOTAL ANUAL				-1.315.994		-0,84	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						2.356.126	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO	
							(m³)	(%)
73	0	0	9	1.028,4	5,81	100,10	7.163.520	72,8%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência: Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Serafim Dias


MUNICÍPIO: Mombaça

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
43.000.000	2.050.003	254,50	241,30	150	113	1.617	1995

ANO: ano de construção do açude

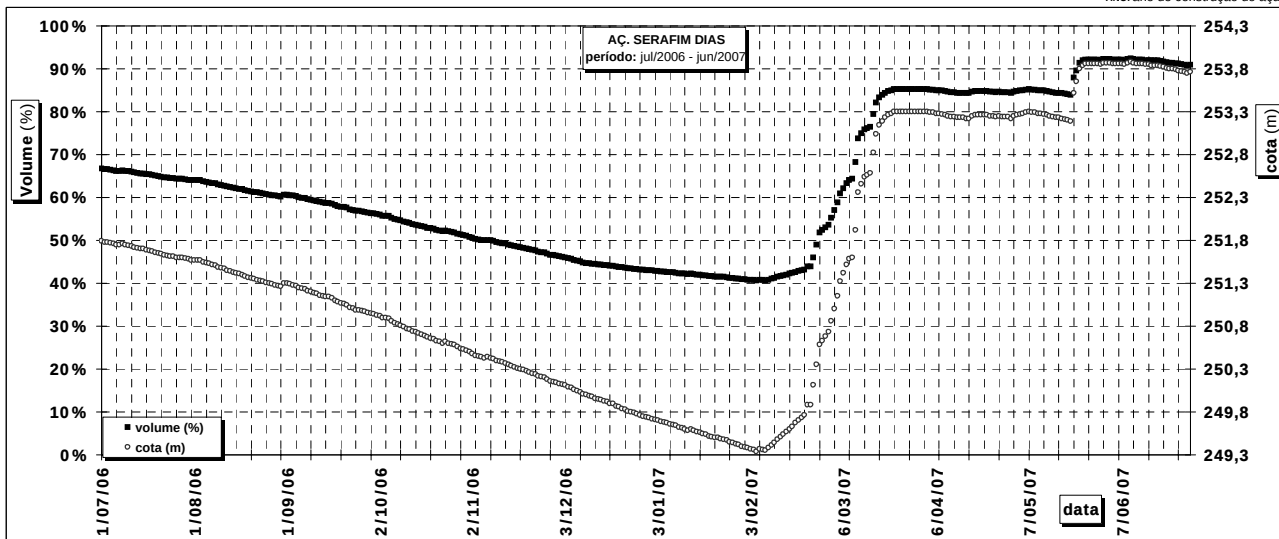

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	7/2/2007	221	251,79	249,36	2,43	1,10	28.667.076	17.492.482	11.174.594	585	395	190

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
8/2/2007	8/2/2007	29/6/2007	102	249,35	253,88	23.735.820	758.145	0	1.184.635	25.678.600

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
117.654	307.688	0	164.954	106.817	0	93.238	6.451.463	14.195.346	410.756	4.397.258	306.981	26.552.155

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	251,79	28.667.076	66,7%	-1.163.482	-37.532	-0,22	-0,71
01/08/2006	251,57	27.503.594	64,0%	-1.428.022	-46.065	-0,27	-0,87
01/09/2006	251,30	26.075.572	60,6%	-1.956.944	-65.231	-0,37	-1,23
01/10/2006	250,93	24.118.628	56,1%	-2.274.184	-73.361	-0,43	-1,39
01/11/2006	250,50	21.844.444	50,8%	-1.956.862	-65.229	-0,37	-1,23
01/12/2006	250,13	19.887.582	46,3%	-1.434.618	-46.278	-0,41	-1,32
01/01/2007	249,72	18.452.964	42,9%	-880.446	-28.401	-0,33	-1,06
01/02/2007	249,39	17.572.518	40,9%	5.488.348	196.012	1,34	4,79
01/03/2007	250,73	23.060.866	53,6%	13.592.482	438.467	2,57	8,29
01/04/2007	253,30	36.653.348	85,2%	-423.120	-14.104	-0,08	-0,27
01/05/2007	253,22	36.230.228	84,3%	3.437.748	110.895	0,65	2,10
01/06/2007	253,87	39.667.976	92,3%	-634.644	-21.155	-0,12	-0,40
01/07/2007	253,75	39.033.332	90,8%				
TOTAL ANUAL				10.366.256		1,96	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)							9.375.096

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
346	0	0	44	591,1	5,62	251,46	27.133.000	63,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Quixeramobim

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Sítios Novos


MUNICÍPIO: Caucaia

B. HIDROGRÁFICA: Metropolitanas

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
126.000.000	18.431.602	45,15	36,68	100	32	447	1999

ANO: ano de construção do açude

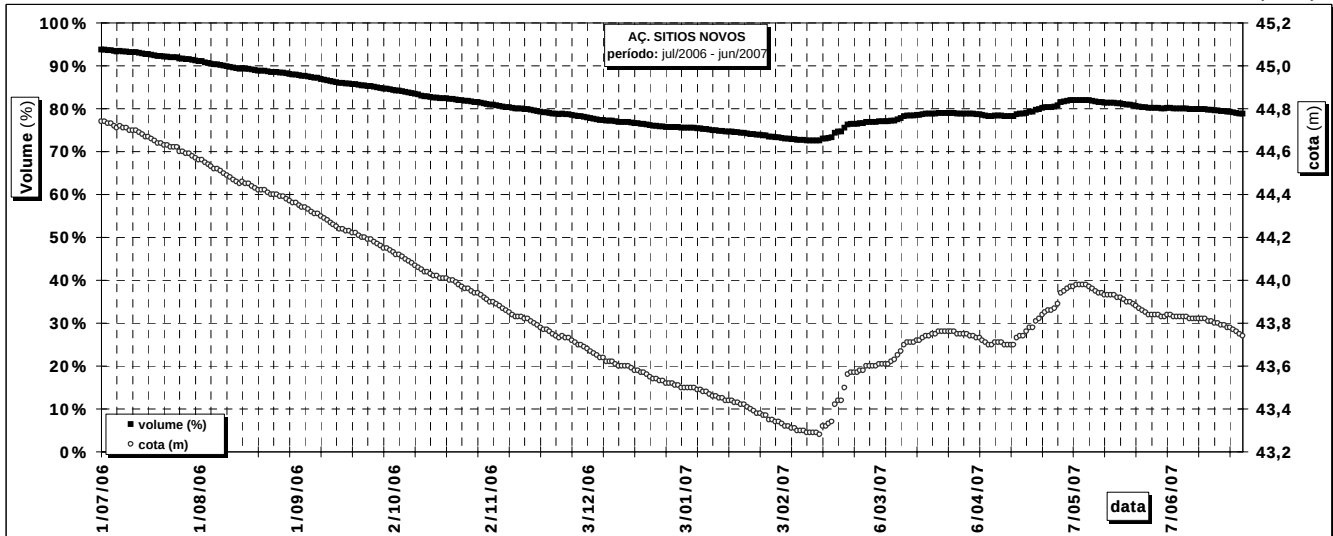

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	14/2/2007	228	44,74	43,29	1,45	0,64	118.144.432	91.479.312	26.665.120	1.353	1.025	328

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
15/2/2007	15/2/2007	5/6/2007	88	43,28	43,98	13.392.512	1.382.400	0	5.504.255	20.279.167

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
358.489	393.604	0	0	380.040	0	0	6.993.726	5.366.074	4.830.801	2.660.972	555.673	21.539.379

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	44,74	118.144.432	93,8%	-3.520.808	-113.574	-0,18	-0,58
01/08/2006	44,56	114.623.624	91,0%	-3.912.016	-126.194	-0,20	-0,65
01/09/2006	44,36	110.711.608	87,9%	-4.303.216	-143.441	-0,22	-0,73
01/10/2006	44,14	106.408.392	84,5%	-4.283.696	-138.184	-0,23	-0,74
01/11/2006	43,91	102.124.696	81,1%	-3.605.680	-120.189	-0,21	-0,70
01/12/2006	43,70	98.519.016	78,2%	-3.262.344	-105.237	-0,19	-0,61
01/01/2007	43,51	95.256.672	75,6%	-2.918.872	-94.157	-0,17	-0,55
01/02/2007	43,34	92.337.800	73,3%	4.120.832	147.173	0,24	0,86
01/03/2007	43,58	96.458.632	76,6%	2.918.872	94.157	0,17	0,55
01/04/2007	43,75	99.377.504	78,9%	2.060.376	68.679	0,12	0,40
01/05/2007	43,87	101.437.880	80,5%	-515.080	-16.615	-0,03	-0,10
01/06/2007	43,84	100.922.800	80,1%	-1.716.968	-57.232	-0,10	-0,33
01/07/2007	43,74	99.205.832	78,7%				
TOTAL ANUAL				-18.938.600		-1,00	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						49.681.096	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	8	2.135,2	3,01	43,90	102.312.000	81,2%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência GEMET

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Sobral


MUNICÍPIO: Sobral

B. HIDROGRÁFICA: Acaraú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
4.675.000	687.601	99,00	91,76	90	0	32	1921

ANO: ano de construção do açude

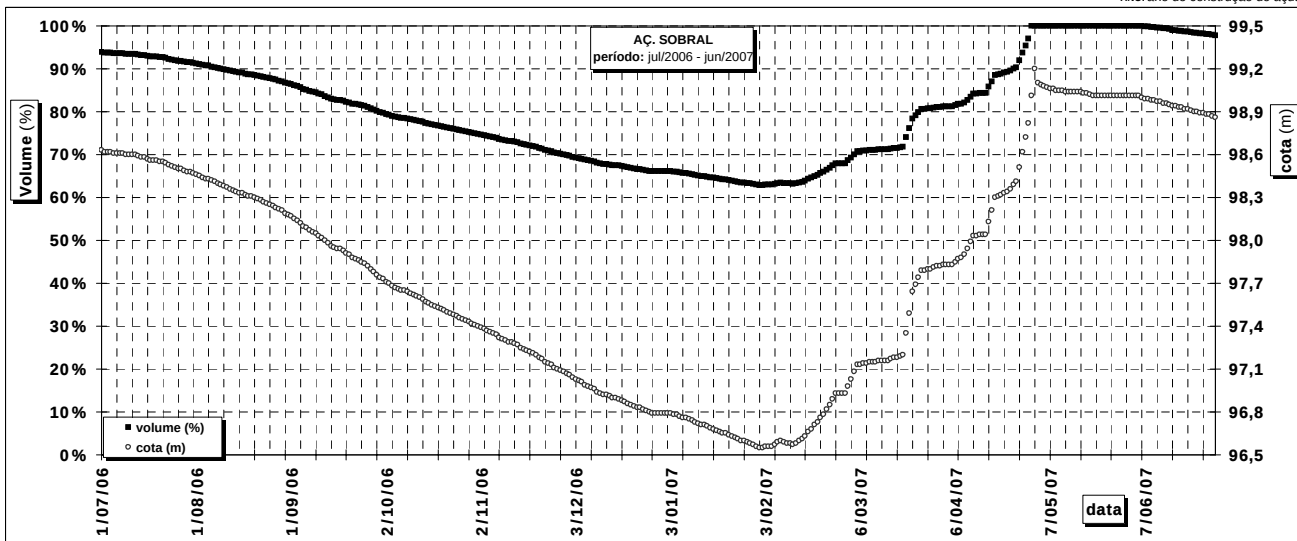

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/1/2007	214	98,63	96,56	2,07	0,97	4.391.948	2.942.799	1.449.149	78	51	27

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/2/2007	1/2/2007	4/6/2007	119	96,55	99,20	1.757.397	0	4.120.734	299.152	6.177.283

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	320.949	671.359	948.911	4.144.862	18.788	6.104.869

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	98,63	4.391.948	93,9%	-130.048	-4.195	-0,17	-0,55
01/08/2006	98,46	4.261.900	91,2%	-221.851	-7.156	-0,29	-0,94
01/09/2006	98,17	4.040.049	86,4%	-316.347	-10.545	-0,44	-1,47
01/10/2006	97,73	3.723.702	79,7%	-227.701	-7.345	-0,33	-1,06
01/11/2006	97,40	3.496.001	74,8%	-234.603	-7.820	-0,34	-1,13
01/12/2006	97,06	3.261.398	69,8%	-173.697	-5.603	-0,27	-0,87
01/01/2007	96,79	3.087.701	66,0%	-151.199	-4.877	-0,24	-0,77
01/02/2007	96,55	2.936.502	62,8%	239.398	8.550	0,38	1,36
01/03/2007	96,93	3.175.900	67,9%	609.900	19.674	0,89	2,87
01/04/2007	97,82	3.785.800	81,0%	889.200	29.640	1,19	3,97
01/05/2007	99,01	4.675.000	100,0%	0	0	0,00	0,00
01/06/2007	99,01	4.675.000	100,0%	-107.099	-3.570	-0,15	-0,50
01/07/2007	98,86	4.567.901	97,7%				
TOTAL ANUAL				175.953		0,23	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.399.282	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
126	0	35	19	279,5	5,09	97,79	3.782.075	80,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Souza


MUNICÍPIO: Canindé

B. HIDROGRÁFICA: Curu

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
30.840.000	3.682.500	162,50	153,75	100	0	205	1999

ANO: ano de construção do açude

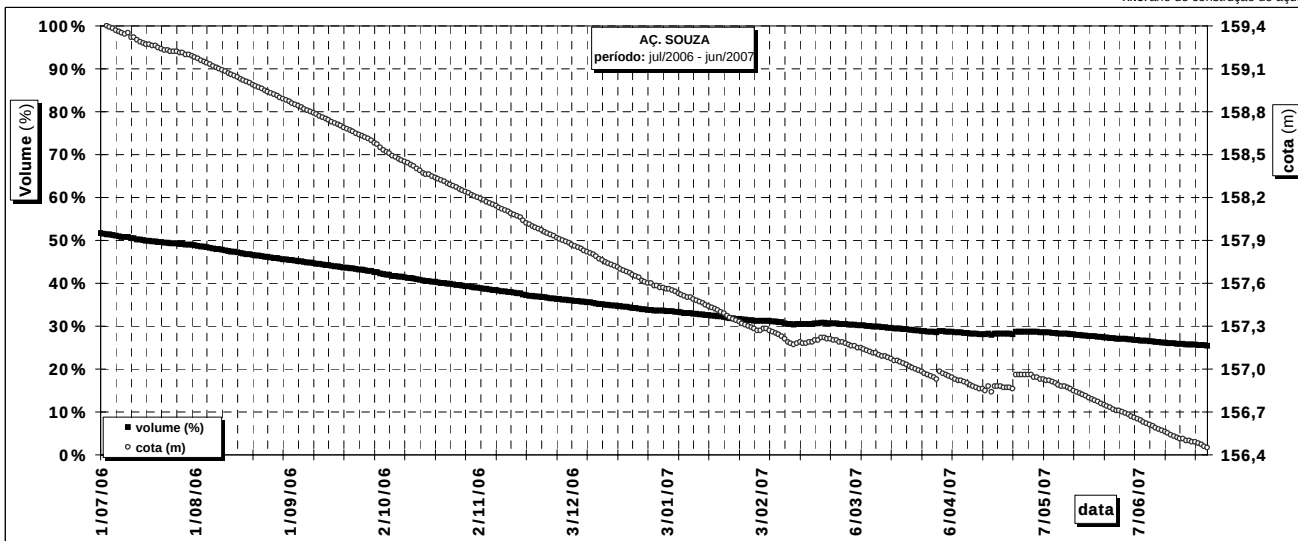

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	1/2/2007	215	159,42	157,28	2,14	1,00	15.922.993	9.628.797	6.294.196	338	217	121

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
2/2/2007		27/4/2007	24	156,84	157,28	616.652	14.688	0	155.599	786.939

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
53.940	0	0	0	0	0	0	306.413	0	487.843	0	0	848.196

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	159,42	15.922.993	51,6%	-876.020	-28.259	-0,24	-0,77
01/08/2006	159,18	15.046.973	48,8%	-1.045.688	-33.732	-0,31	-1,00
01/09/2006	158,87	14.001.285	45,4%	-956.776	-31.893	-0,32	-1,07
01/10/2006	158,55	13.044.509	42,3%	-1.016.589	-32.793	-0,34	-1,10
01/11/2006	158,21	12.027.920	39,0%	-898.522	-29.951	-0,32	-1,07
01/12/2006	157,89	11.129.398	36,1%	-787.180	-25.393	-0,32	-1,03
01/01/2007	157,57	10.342.218	33,5%	-713.421	-23.014	-0,29	-0,94
01/02/2007	157,28	9.628.797	31,2%	-221.391	-7.907	-0,09	-0,32
01/03/2007	157,19	9.407.406	30,5%	-588.601	-18.987	-0,25	-0,81
01/04/2007	156,94	8.818.805	28,6%	40.409	1.347	0,02	0,07
01/05/2007	156,96	8.859.214	28,7%	-505.000	-16.290	-0,25	-0,81
01/06/2007	156,71	8.354.214	27,1%	-545.409	-18.180	-0,27	-0,90
01/07/2007	156,44	7.808.805	25,3%				
TOTAL ANUAL				-8.114.188		-2,98	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						5.073.035	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³) (%)
365	0	0	10	13.271,2	4,18	157,78	11.071.560 35,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Sucesso


MUNICÍPIO: Tamboril

B. HIDROGRÁFICA: Parnaíba

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
10.000.000		100,00		134	0	273	1988

ANO: ano de construção do açude

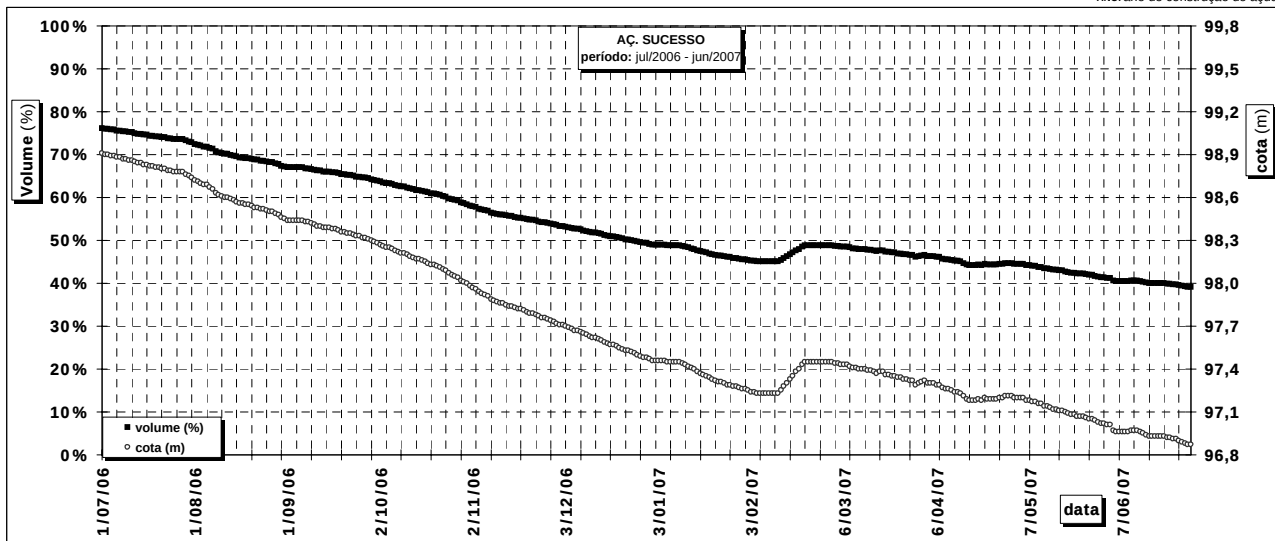

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	4/2/2007	218	98,91	97,24	1,67	0,77	7.614.507	4.517.597	3.096.910	164	164	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
5/2/2007		6/6/2007	71	96,96	97,45	539.369	0	0	187.650	727.019

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	485.021	78.254	163.744	0	41.959	768.978

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	98,91	7.614.507	76,1%	-370.504	-11.952	-0,19	-0,61
01/08/2006	98,72	7.244.003	72,4%	-545.998	-17.613	-0,28	-0,90
01/09/2006	98,44	6.698.005	67,0%	-312.007	-10.400	-0,16	-0,53
01/10/2006	98,28	6.385.998	63,9%	-580.792	-18.735	-0,30	-0,97
01/11/2006	97,98	5.805.206	58,1%	-469.807	-15.660	-0,27	-0,90
01/12/2006	97,71	5.335.399	53,4%	-435.000	-14.032	-0,25	-0,81
01/01/2007	97,46	4.900.399	49,0%	-347.995	-11.226	-0,20	-0,65
01/02/2007	97,26	4.552.404	45,5%	330.591	11.807	0,19	0,68
01/03/2007	97,45	4.882.995	48,8%	-243.599	-7.858	-0,14	-0,45
01/04/2007	97,31	4.639.396	46,4%	-173.997	-5.800	-0,10	-0,33
01/05/2007	97,21	4.465.399	44,7%	-330.605	-10.665	-0,19	-0,61
01/06/2007	97,02	4.134.794	41,3%	-233.593	-7.786	-0,16	-0,53
01/07/2007	96,86	3.901.201	39,0%				
TOTAL ANUAL				-3.713.306		-2,05	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						5.508.151	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
174	0	0	2	4.746,6	2,89	97,73	5.410.000	54,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrateús

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Tatajuba


MUNICÍPIO: Icó

B. HIDROGRÁFICA: Salgado

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
2.720.000	69.000	220,50	210,18	73	0	22	1999

ANO: ano de construção do açude

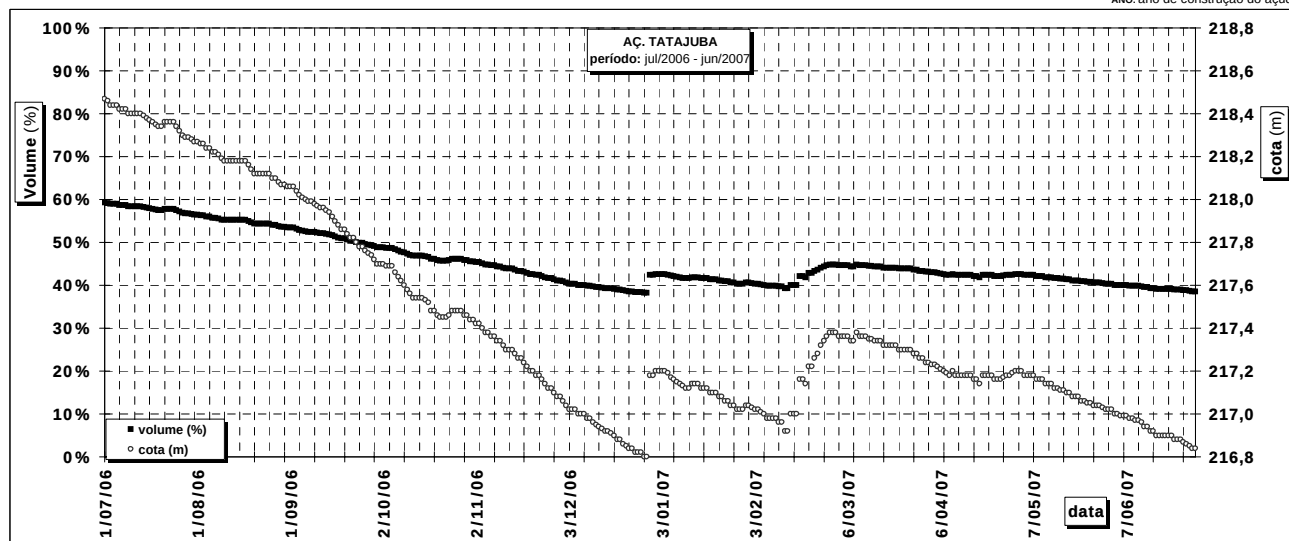

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	29/12/2006	181	218,47	216,80	1,67	0,92	1.613.301	1.038.001	575.300	36	27	9

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
30/12/2006		26/4/2007	50	216,92	217,38	207.801	20.736	0	61.582	290.119

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
20.866	0	0	38.832	0	144.764	45.802	195.409	16.939	48.741	0	0	511.353

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	218,47	1.613.301	59,3%	-77.999	-2.516	-0,20	-0,65
01/08/2006	218,27	1.535.302	56,4%	-81.903	-2.642	-0,21	-0,68
01/09/2006	218,06	1.453.399	53,4%	-125.400	-4.180	-0,36	-1,20
01/10/2006	217,70	1.327.999	48,8%	-88.398	-2.852	-0,26	-0,84
01/11/2006	217,44	1.239.601	45,6%	-129.202	-4.307	-0,38	-1,27
01/12/2006	217,06	1.110.399	40,8%	-47.600	1.535	0,14	0,45
01/01/2007	217,20	1.157.999	42,6%	-54.401	-1.755	-0,16	-0,52
01/02/2007	217,04	1.103.598	40,6%	115.604	4.129	0,34	1,21
01/03/2007	217,38	1.219.202	44,8%	-47.600	-1.535	-0,14	-0,45
01/04/2007	217,24	1.171.602	43,1%	-13.603	-453	-0,04	-0,13
01/05/2007	217,20	1.157.999	42,6%	-61.197	-1.974	-0,18	-0,58
01/06/2007	217,02	1.096.802	40,3%	-53.600	-1.787	-0,20	-0,67
01/07/2007	216,82	1.043.202	38,4%				
TOTAL ANUAL				-570.099		-1,65	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.182.154	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
305	0	0	16	1.941,5	2,10	217,42	1.234.880	45,4%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrato

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Tejuçuoca


MUNICÍPIO: Tejuçuoca

B. HIDROGRÁFICA: Curu

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
28.110.000	980.000	116,61	103,00	60	0	234	1990

ANO: ano de construção do açude

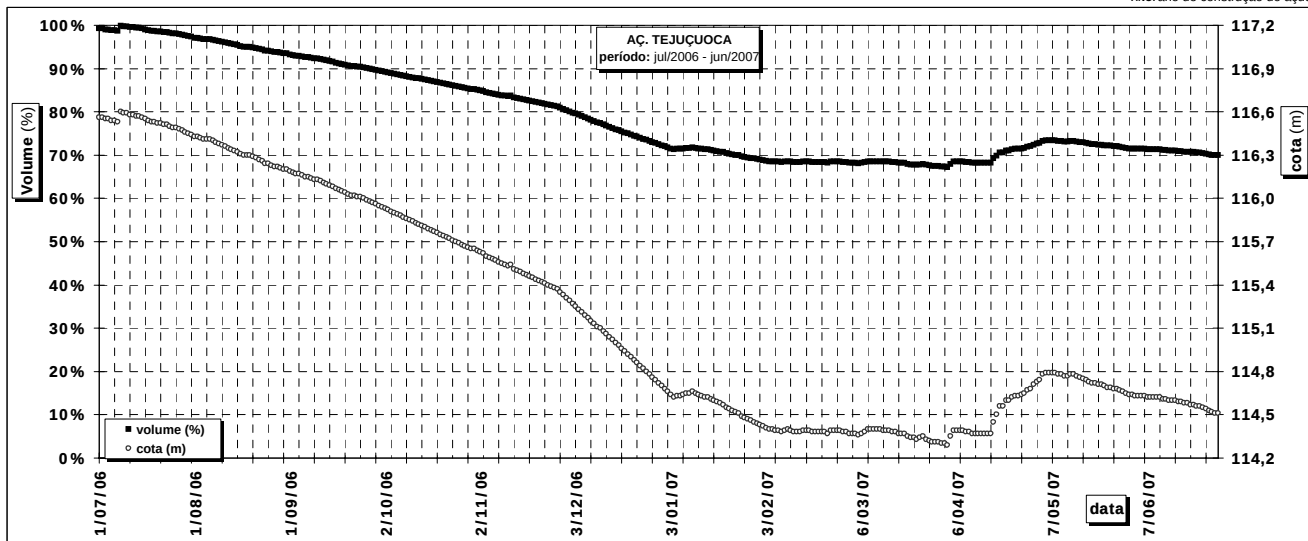

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	3/1/2007	186	116,56	114,64	1,92	1,03	27.884.580	20.100.798	7.783.782	484	305	179

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
4/1/2007	3/4/2007	12/5/2007	80	114,29	114,79	2.359.602	333.504	0	531.006	3.224.112

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
337.647	0	0	0	87.656	0	382.160	396.380	288.540	1.758.023	411.432	0	3.661.838

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	116,56	27.884.580	99,2%	-586.054	-18.905	-0,13	-0,42
01/08/2006	116,43	27.298.526	97,1%	-1.081.958	-34.902	-0,24	-0,77
01/09/2006	116,19	26.216.568	93,3%	-1.097.158	-36.572	-0,25	-0,83
01/10/2006	115,94	25.119.410	89,4%	-1.203.012	-38.807	-0,30	-0,97
01/11/2006	115,64	23.916.398	85,1%	-1.403.494	-46.783	-0,35	-1,17
01/12/2006	115,29	22.512.904	80,1%	-2.273.302	-73.332	-0,61	-1,97
01/01/2007	114,68	20.239.602	72,0%	-867.500	-27.984	-0,25	-0,81
01/02/2007	114,43	19.372.102	68,9%	-173.512	-6.197	-0,05	-0,18
01/03/2007	114,38	19.198.590	68,3%	-277.580	-8.954	-0,08	-0,26
01/04/2007	114,30	18.921.010	67,3%	1.422.686	47.423	0,41	1,37
01/05/2007	114,71	20.343.696	72,4%	-242.898	-7.835	-0,07	-0,23
01/06/2007	114,64	20.100.798	71,5%	-520.506	-17.350	-0,15	-0,50
01/07/2007	114,49	19.580.292	69,7%				
TOTAL ANUAL				-8.304.288		-2,07	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						7.289.100	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
352	0	0	8	2.801,9	5,80	115,20	22.319.340	79,4%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Tomás Osterne


MUNICÍPIO: Crato

B. HIDROGRÁFICA: Salgado

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
28.780.000	600.000	441,00	422,00	39	0	118	1982

ANO: ano de construção do açude

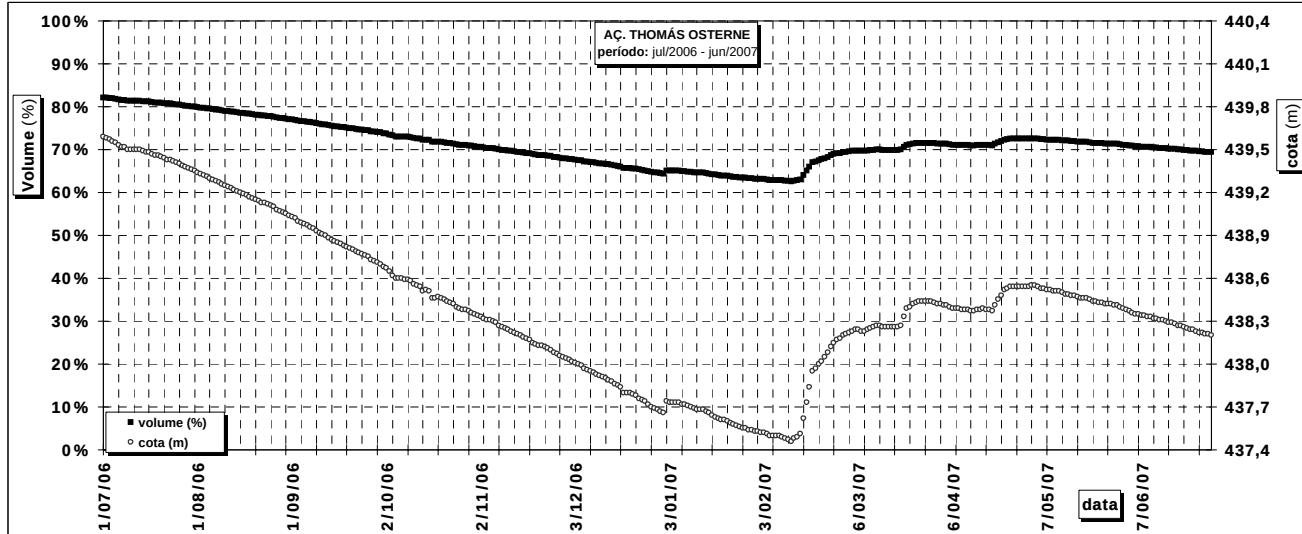

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	439,59	437,47	2,12	0,94	23.643.490	18.025.504	5.617.986	288	230	58

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	30/4/2007	55	437,46	438,54	3.153.500	345.600	0	520.956	4.020.056

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	179.034	0	0	274.362	2.513.855	887.870	618.331	0	0	4.473.452

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	439,59	23.643.490	82,2%	-662.500	-21.371	-0,25	-0,81
01/08/2006	439,34	22.980.990	79,9%	-821.494	-26.500	-0,31	-1,00
01/09/2006	439,03	22.159.496	77,0%	-927.516	-30.917	-0,35	-1,17
01/10/2006	438,68	21.231.980	73,8%	-900.990	-29.064	-0,34	-1,10
01/11/2006	438,34	20.330.990	70,6%	-821.494	-27.383	-0,31	-1,03
01/12/2006	438,03	19.509.496	67,8%	-980.486	-31.629	-0,37	-1,19
01/01/2007	437,66	18.529.010	64,4%	-344.514	-11.113	-0,13	-0,42
01/02/2007	437,53	18.184.496	63,2%	1.775.536	63.412	0,67	2,39
01/03/2007	438,20	19.960.032	69,4%	583.004	18.807	0,22	0,71
01/04/2007	438,42	20.543.036	71,4%	317.986	10.600	0,12	0,40
01/05/2007	438,54	20.861.022	72,5%	-397.484	-12.822	-0,15	-0,48
01/06/2007	438,39	20.463.538	71,1%	-503.506	-16.784	-0,19	-0,63
01/07/2007	438,20	19.960.032	69,4%				
TOTAL ANUAL				-3.683.458		-1,39	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						6.582.092	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
121	0	0	11	2.348,2	7,07	438,42	20.548.920	71,4%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Crato

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Tigre


MUNICÍPIO: Solonópole

B. HIDROGRÁFICA: Médio Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
3.510.000		100,00		0	0	22	1982

ANO: ano de construção do açude

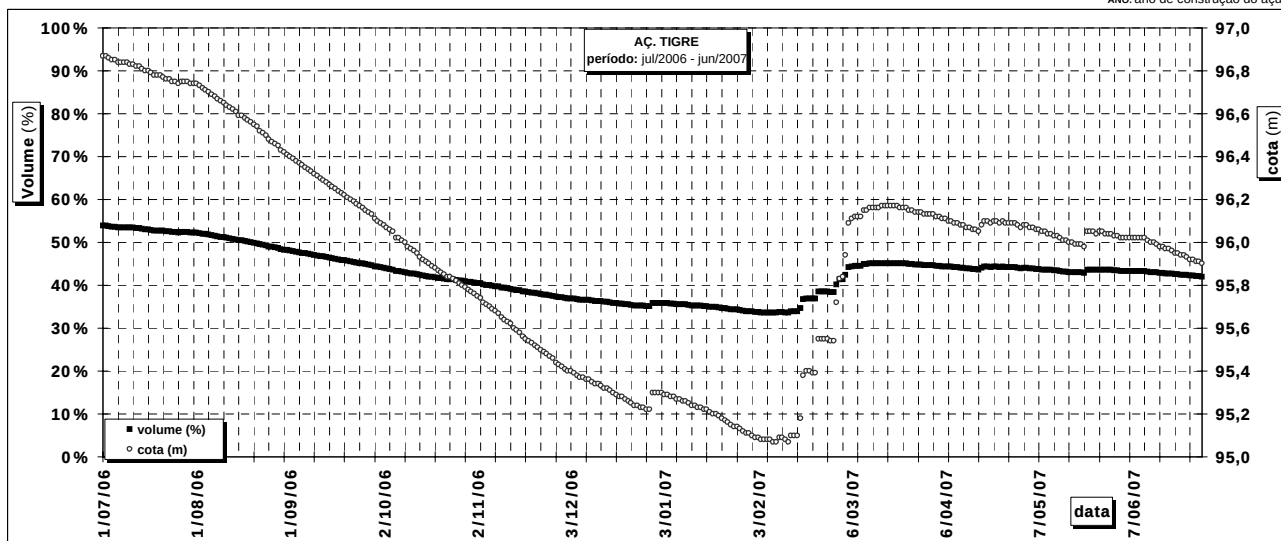

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	29/12/2006	181	96,87	95,22	1,65	0,91	1.890.373	1.231.083	659.290	42	34	8

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
30/12/2006	13/2/2007	26/5/2007	72	95,07	96,17	490.009	0	0	58.464	548.473

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
8.759	0	0	0	0	36.605	0	272.179	194.458	38.844	44.046	0	594.891

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	96,87	1.890.373	53,9%	-56.764	-1.831	-0,13	-0,42
01/08/2006	96,74	1.833.609	52,2%	-148.452	-4.789	-0,34	-1,10
01/09/2006	96,40	1.685.157	48,0%	-135.357	-4.512	-0,31	-1,03
01/10/2006	96,09	1.549.800	44,2%	-125.270	-4.041	-0,33	-1,06
01/11/2006	95,76	1.424.530	40,6%	-125.381	-4.179	-0,35	-1,17
01/12/2006	95,41	1.299.149	37,0%	-39.406	-1.271	-0,11	-0,35
01/01/2007	95,30	1.259.743	35,9%	-71.649	-2.311	-0,20	-0,65
01/02/2007	95,10	1.188.094	33,8%	222.106	7.932	0,62	2,21
01/03/2007	95,72	1.410.200	40,2%	157.066	5.067	0,41	1,32
01/04/2007	96,13	1.567.266	44,7%	-26.197	-873	-0,06	-0,20
01/05/2007	96,07	1.541.069	43,9%	-17.465	-563	-0,04	-0,13
01/06/2007	96,03	1.523.604	43,4%	-48.921	-1.631	-0,13	-0,43
01/07/2007	95,90	1.474.683	42,0%				
TOTAL ANUAL				-415.690		-0,97	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						812.393	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	20	2.153,6	3,82	95,93	1.498.770	42,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Limoeiro do Norte

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÜDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇÜDE: Trapiá I


MUNICÍPIO: Caridade

B. HIDROGRÁFICA: Curu

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
2.010.000		101,50		27	0	9	1985

ANO: ano de construção do açüde

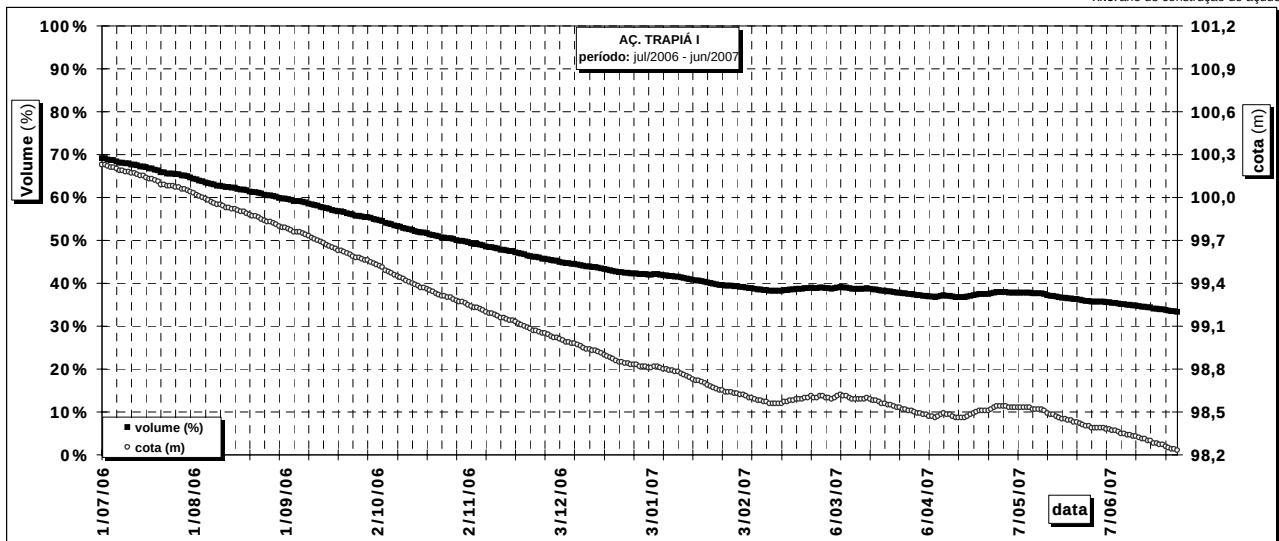

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	14/2/2007	228	100,23	98,56	1,67	0,73	1.388.102	767.999	620.103	31	26	5

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
14/2/2007		29/4/2007	51	98,46	98,62	63.003	0	0	34.194	97.197

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	8.051	35.207	16.239	45.763	0	0	105.260

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	100,23	1.388.102	69,1%	-94.003	-3.032	-0,20	-0,65
01/08/2006	100,03	1.294.099	64,4%	-93.899	-3.029	-0,24	-0,77
01/09/2006	99,79	1.200.200	59,7%	-95.000	-3.167	-0,25	-0,83
01/10/2006	99,54	1.105.200	55,0%	-106.399	-3.432	-0,28	-0,90
01/11/2006	99,26	998.801	49,7%	-91.202	-3.040	-0,24	-0,80
01/12/2006	99,02	907.599	45,2%	-61.599	-1.987	-0,20	-0,65
01/01/2007	98,82	846.000	42,1%	-57.001	-1.839	-0,19	-0,61
01/02/2007	98,63	788.999	39,3%	-5.999	-214	-0,02	-0,07
01/03/2007	98,61	783.000	39,0%	-29.999	-968	-0,10	-0,32
01/04/2007	98,51	753.001	37,5%	8.999	300	0,03	0,10
01/05/2007	98,54	762.000	37,9%	-45.000	-1.452	-0,15	-0,48
01/06/2007	98,39	717.000	35,7%	-51.000	-1.700	-0,17	-0,57
01/07/2007	98,22	666.000	33,1%				
TOTAL ANUAL				-722.102		-2,01	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						647.232	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
365	0	0	1	6.969,9	2,74	99,03	932.640	46,4%

O monitoramento deste açüde é realizado pela gerênciaPentecoste

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Trapiá II


MUNICÍPIO: Pedra Branca

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
18.190.000	1.540.000	510,00	497,00	50	0	128	1992

ANO: ano de construção do açude

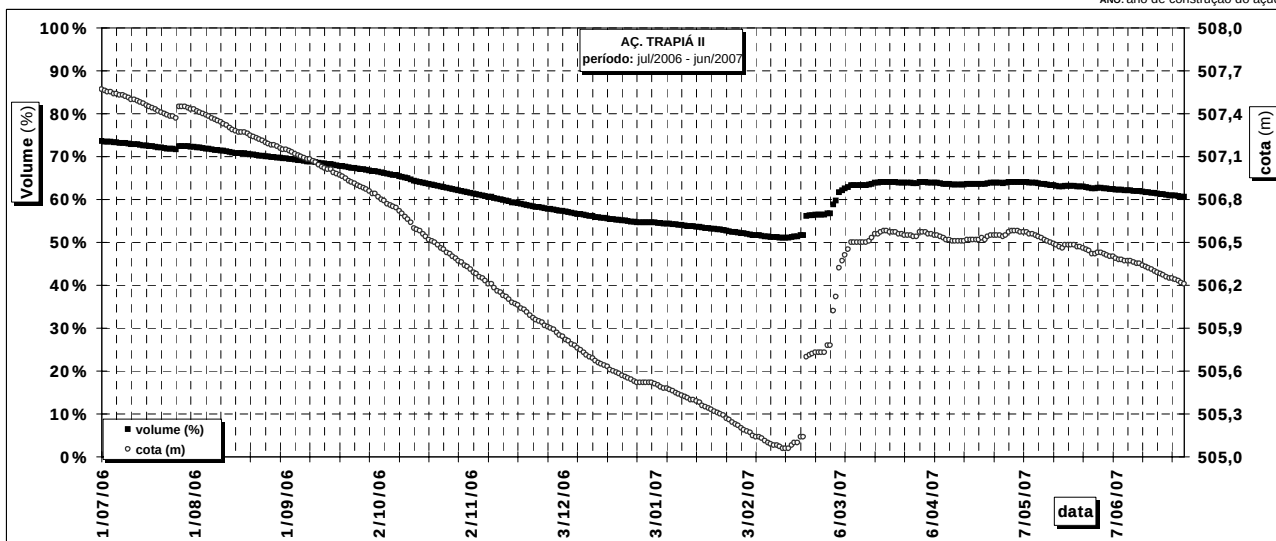

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	14/2/2007	228	507,57	505,07	2,50	1,10	13.381.813	9.287.561	4.094.252	207	136	71

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
15/2/2007	15/2/2007	31/5/2007	76	505,06	506,58	2.647.218	85.796	0	285.064	3.018.078

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
163.841	0	0	0	0	0	0	1.118.934	1.506.140	219.335	156.823	0	3.165.073

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	507,57	13.381.813	73,6%	-243.626	-7.859	-0,14	-0,45
01/08/2006	507,43	13.138.187	72,2%	-487.198	-15.716	-0,28	-0,90
01/09/2006	507,15	12.650.989	69,5%	-539.395	-17.980	-0,31	-1,03
01/10/2006	506,84	12.111.594	66,6%	-887.417	-28.626	-0,51	-1,65
01/11/2006	506,33	11.224.177	61,7%	-764.634	-25.488	-0,46	-1,53
01/12/2006	505,87	10.459.543	57,5%	-512.759	-16.541	-0,35	-1,13
01/01/2007	505,52	9.946.784	54,7%	-468.766	-15.121	-0,32	-1,03
01/02/2007	505,20	9.478.018	52,1%	-776.448	-27.730	0,53	1,89
01/03/2007	505,73	10.254.466	56,4%	1.335.149	43.069	0,81	2,61
01/04/2007	506,54	11.589.615	63,7%	17.364	579	0,01	0,03
01/05/2007	506,55	11.606.979	63,8%	-208.792	-6.735	-0,12	-0,39
01/06/2007	506,43	11.398.187	62,7%	-382.802	-12.760	-0,22	-0,73
01/07/2007	506,21	11.015.385	60,6%				
TOTAL ANUAL				-2.366.428		-1,36	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						3.435.574	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
362	0	0	56	2.097,7	6,89	506,39	11.368.750	62,5%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Quixeramobim

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Trapiá III


MUNICÍPIO: Coreaú

B. HIDROGRÁFICA: Coreaú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
5.510.000	413.000	100,00	92,10	50	0	22	1961

ANO: ano de construção do açude

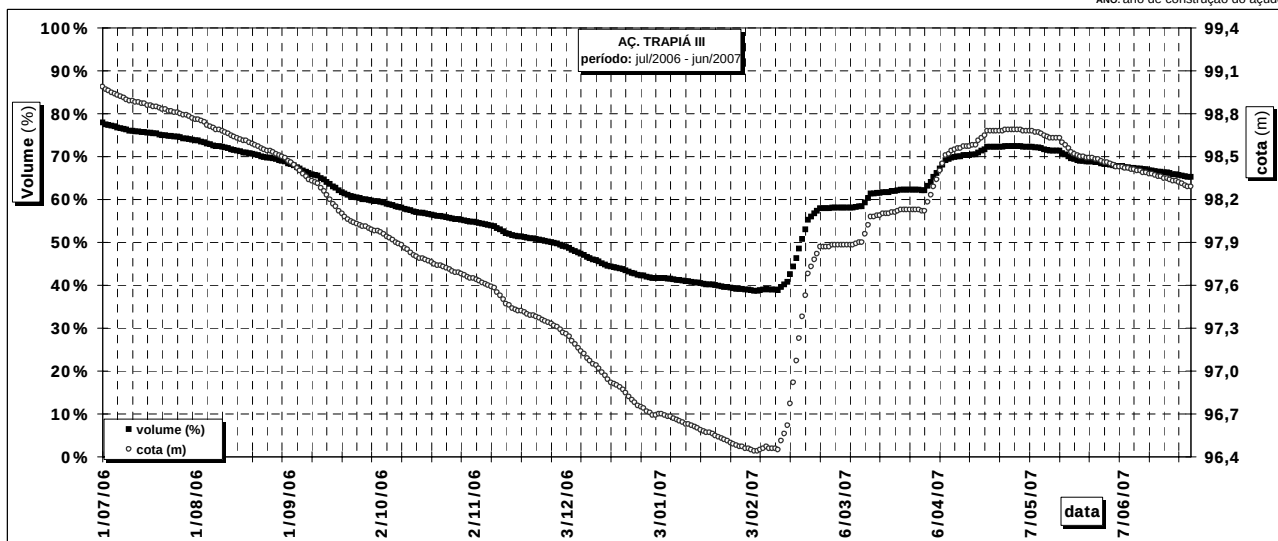

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO O VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	98,99	96,71	2,28	1,25	4.289.998	2.304.400	1.985.598	125	66	59

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	12/2/2007	26/4/2007	69	96,44	98,68	1.877.591	0	0	209.198	2.086.789

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	0	16.504	1.140.653	279.841	649.390	0	0	2.086.388

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	98,99	4.289.998	77,9%	-229.996	-7.419	-0,23	-0,74
01/08/2006	98,76	4.060.002	73,7%	-290.001	-9.355	-0,29	-0,94
01/09/2006	98,47	3.770.001	68,4%	-486.198	-16.207	-0,49	-1,63
01/10/2006	97,98	3.283.803	59,6%	-267.302	-8.623	-0,33	-1,06
01/11/2006	97,65	3.016.501	54,7%	-291.600	-9.720	-0,36	-1,20
01/12/2006	97,29	2.724.901	49,5%	-433.299	-13.977	-0,60	-1,94
01/01/2007	96,69	2.291.602	41,6%	-147.202	-4.748	-0,23	-0,74
01/02/2007	96,46	2.144.400	38,9%	1.050.302	37.511	1,41	5,04
01/03/2007	97,87	3.194.702	58,0%	225.301	7.268	0,25	0,81
01/04/2007	98,12	3.420.003	62,1%	570.000	19.000	0,57	1,90
01/05/2007	98,69	3.990.003	72,4%	-230.004	-7.419	-0,23	-0,74
01/06/2007	98,46	3.759.999	68,2%	-169.998	-5.667	-0,17	-0,57
01/07/2007	98,29	3.590.001	65,2%				
TOTAL ANUAL				-699.997		-0,70	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.683.541	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	(%)
92	0	0	15	963,9	3,67	97,92	3.300.490	59,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Trici


MUNICÍPIO: Tauá

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
16.500.000	2.205.000	433,00	426,50	165	0	555	1987

ANO: ano de construção do açude

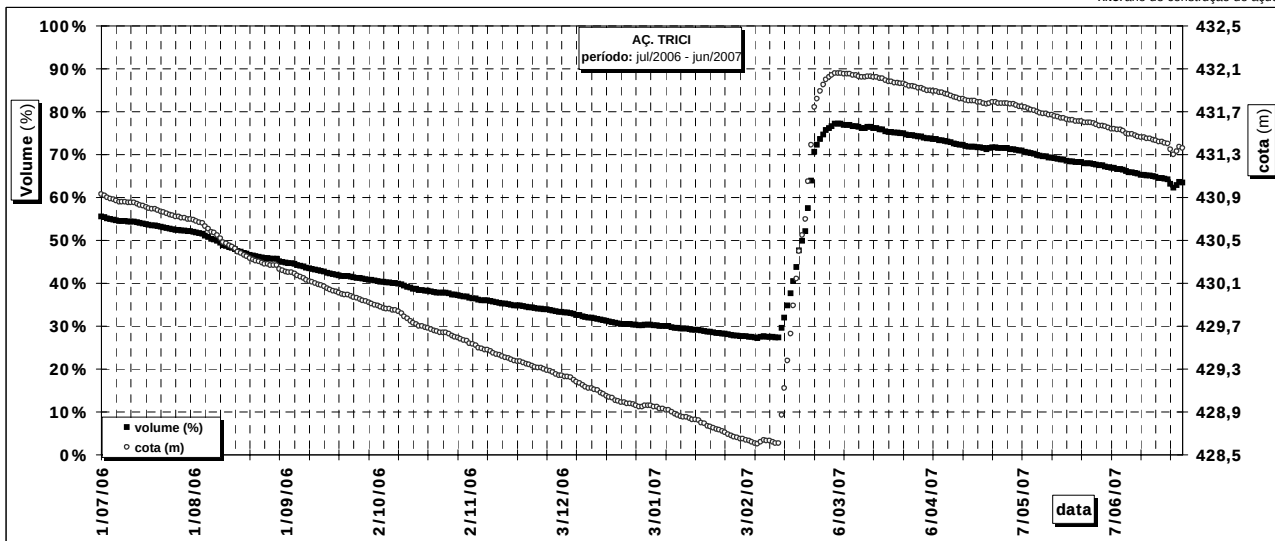

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	6/2/2007	220	430,93	428,61	2,32	1,05	9.149.182	4.507.880	4.641.302	244	197	47

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
7/2/2007	14/2/2007	27/6/2007	38	428,60	432,06	8.498.850	0	0	395.143	8.893.993

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	54.798	0	8.100.270	376.189	103.147	0	254.691	8.889.095

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	430,93	9.149.182	55,4%	-585.576	-18.890	-0,24	-0,77
01/08/2006	430,69	8.563.606	51,9%	-1.171.227	-37.782	-0,48	-1,55
01/09/2006	430,21	7.392.379	44,8%	-695.390	-23.180	-0,31	-1,03
01/10/2006	429,90	6.696.989	40,6%	-622.193	-20.071	-0,34	-1,10
01/11/2006	429,56	6.074.796	36,8%	-567.296	-18.910	-0,31	-1,03
01/12/2006	429,25	5.507.500	33,4%	-513.112	-16.552	-0,29	-0,94
01/01/2007	428,96	4.994.388	30,3%	-430.896	-13.900	-0,31	-1,00
01/02/2007	428,65	4.563.492	27,7%	-7.758.547	277.091	3,30	11,79
01/03/2007	431,95	12.322.039	74,7%	-63.262	-2.041	-0,02	-0,06
01/04/2007	431,93	12.258.777	74,3%	-473.981	-15.799	-0,15	-0,50
01/05/2007	431,78	11.784.796	71,4%	-632.038	-20.388	-0,20	-0,65
01/06/2007	431,58	11.152.758	67,6%	-695.204	-23.173	-0,22	-0,73
01/07/2007	431,36	10.457.554	63,4%				
TOTAL ANUAL				1.308.372		0,43	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						5.727.670	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	MÉDIO (%)
179	0	0	35	677,5	3,36	430,41	8.266.500	50,1%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência/guatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Trussu


MUNICÍPIO: Iguatu

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
301.000.000	1.320.000	254,00	227,00	150	0	1.568	1996

ANO: ano de construção do açude

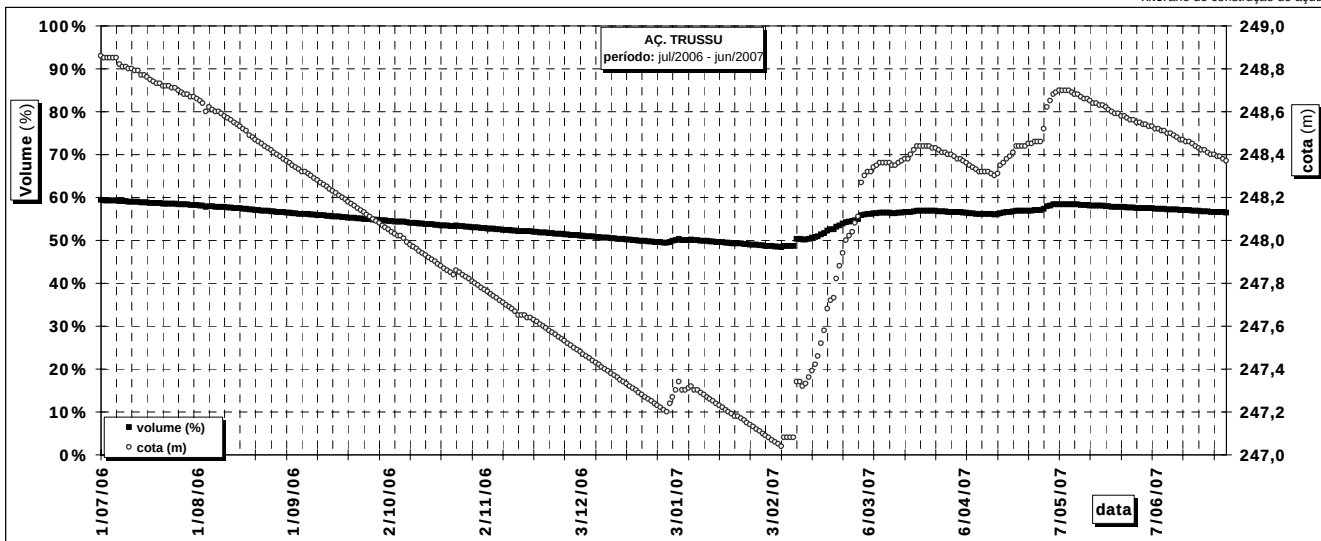

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	248,86	247,20	1,66	0,91	178.750.416	148.637.952	30.112.464	1.904	1.472	432

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FÍRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	6/2/2007	6/5/2007	72	247,04	248,69	35.372.720	1.568.160	0	4.321.797	41.262.677

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	524.098	0	565.474	0	846.947	2.797.446	20.879.472	8.832.732	3.886.819	4.863.423	0	43.196.411

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	248,86	178.750.416	59,4%	-3.627.952	-117.031	-0,20	-0,65
01/08/2006	248,66	175.122.464	58,2%	-5.623.360	-181.399	-0,31	-1,00
01/09/2006	248,35	169.499.104	56,3%	-5.260.752	-175.358	-0,29	-0,97
01/10/2006	248,06	164.238.352	54,6%	-5.079.168	-163.844	-0,28	-0,90
01/11/2006	247,78	159.159.184	52,9%	-5.079.184	-169.306	-0,28	-0,93
01/12/2006	247,50	154.080.000	51,2%	-4.716.304	-152.139	-0,26	-0,84
01/01/2007	247,24	149.363.696	49,6%	-2.721.168	-87.780	-0,15	-0,48
01/02/2007	247,09	146.642.528	48,7%	17.232.944	615.462	0,95	3,39
01/03/2007	248,04	163.875.472	54,4%	6.530.416	210.659	0,36	1,16
01/04/2007	248,40	170.405.888	56,6%	1.088.640	36.288	0,06	0,20
01/05/2007	248,46	171.494.528	57,0%	1.632.528	52.662	0,09	0,29
01/06/2007	248,55	173.127.056	57,5%	-3.446.640	-114.888	-0,19	-0,63
01/07/2007	248,36	169.680.416	56,4%				
TOTAL ANUAL				-9.070.000		-0,50	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						37.553.480	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³)	MÉDIO (%)
354	0	0	26	2.543,4	8,62	248,08	164.647.000	54,7%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência/iguatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Tucunduba


MUNICÍPIO: Senador Sá

B. HIDROGRÁFICA: Coreaú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
41.430.000	390.000	109,00	100,00	55	0	296	1919

ANO: ano de construção do açude

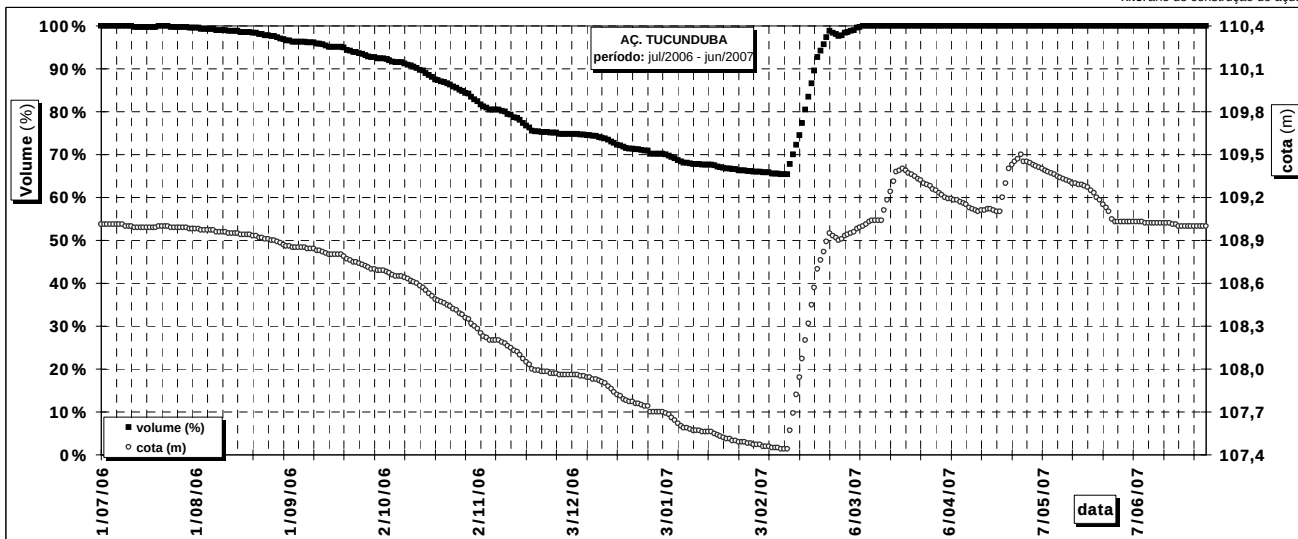

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	109,01	107,44	1,57	0,70	41.430.000	27.100.018	14.329.982	737	672	65

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	25/6/2007	127	107,44	109,50	14.836.434	0	87.837.264	4.715.831	107.389.529

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
814.592	0	0	0	0	0	0	14.442.243	22.938.790	22.110.184	41.526.421	1.196.800	103.029.030

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	109,01	41.430.000	100,0%	-202.564	-6.534	-0,03	-0,10
01/08/2006	108,98	41.227.436	99,5%	-1.215.628	-39.214	-0,12	-0,39
01/09/2006	108,86	40.011.808	96,6%	-1.722.084	-57.403	-0,17	-0,57
01/10/2006	108,69	38.289.724	92,4%	-3.950.692	-127.442	-0,39	-1,26
01/11/2006	108,30	34.339.032	82,9%	-3.339.038	-111.301	-0,34	-1,13
01/12/2006	107,96	30.999.994	74,8%	-1.950.016	-62.904	-0,26	-0,84
01/01/2007	107,70	29.049.978	70,1%	-1.724.968	-55.644	-0,23	-0,74
01/02/2007	107,47	27.325.010	66,0%	13.092.006	467.572	1,43	5,11
01/03/2007	108,90	40.417.016	97,6%	1.012.984	32.677	0,36	1,16
01/04/2007	109,26	41.430.000	100,0%	0	0	0,19	0,63
01/05/2007	109,45	41.430.000	100,0%	0	0	-0,42	-1,35
01/06/2007	109,03	41.430.000	100,0%	0	0	-0,03	-0,10
01/07/2007	109,00	41.430.000	100,0%				
TOTAL ANUAL				0		-0,01	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						18.907.930	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
161	0	103	13	146,8	3,75	108,62	37.204.140	89,8%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Ubaldinho


MUNICÍPIO: Cedro

B. HIDROGRÁFICA: Salgado

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
31.800.000	5.969.222	295,00	287,45	57	0	170	1999

ANO: ano de construção do açude

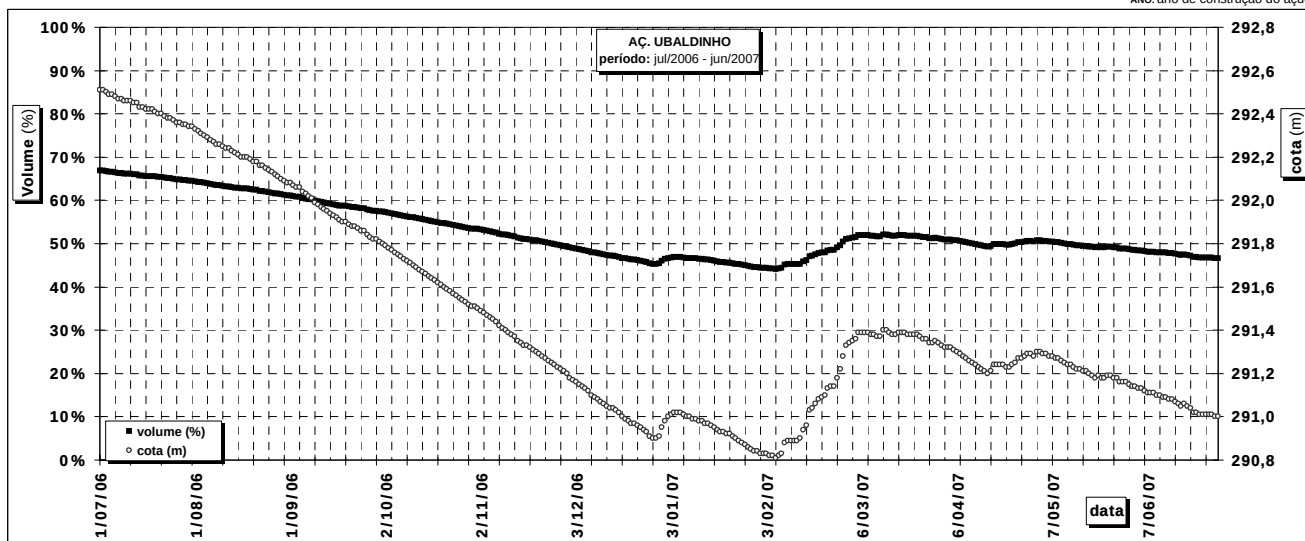

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	292,51	290,95	1,56	0,85	21.242.442	14.628.052	6.614.390	418	344	74

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	7/2/2007	18/6/2007	94	290,81	291,40	3.476.829	109.556	0	664.770	4.251.155

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	0	499.280	309.656	2.528.287	595.288	534.089	225.506	58.329	4.750.435

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	292,51	21.242.442	66,8%	-763.298	-24.623	-0,18	-0,58
01/08/2006	292,33	20.479.144	64,4%	-1.060.000	-34.194	-0,25	-0,81
01/09/2006	292,08	19.419.144	61,1%	-1.187.196	-39.573	-0,28	-0,93
01/10/2006	291,80	18.231.948	57,3%	-1.271.948	-41.031	-0,30	-0,97
01/11/2006	291,50	16.960.000	53,3%	-1.356.831	-45.228	-0,32	-1,07
01/12/2006	291,18	15.603.169	49,1%	-847.922	-27.352	-0,20	-0,65
01/01/2007	290,98	14.755.247	46,4%	-636.104	-20.519	-0,15	-0,48
01/02/2007	290,83	14.119.143	44,4%	2.120.000	75.714	0,50	1,79
01/03/2007	291,33	16.239.143	51,1%	0	0	0,00	0,00
01/04/2007	291,33	16.239.143	51,1%	-211.948	-7.065	-0,05	-0,17
01/05/2007	291,28	16.027.195	50,4%	-551.221	-17.781	-0,13	-0,42
01/06/2007	291,15	15.475.974	48,7%	-635.974	-21.199	-0,15	-0,50
01/07/2007	291,00	14.840.000	46,7%				
TOTAL ANUAL				-6.402.442		-1,51	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						6.971.910	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
362	0	0	7	2.443,4	4,80	291,46	16.790.400	52,8%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerênciaCrato

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Valério


MUNICÍPIO: Altaneira

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC. (km²)	B. HIDROGR. (km²)	ANO
2.020.000	30.000	54,00	40,00	31	0	60	1996

ANO: ano de construção do açude

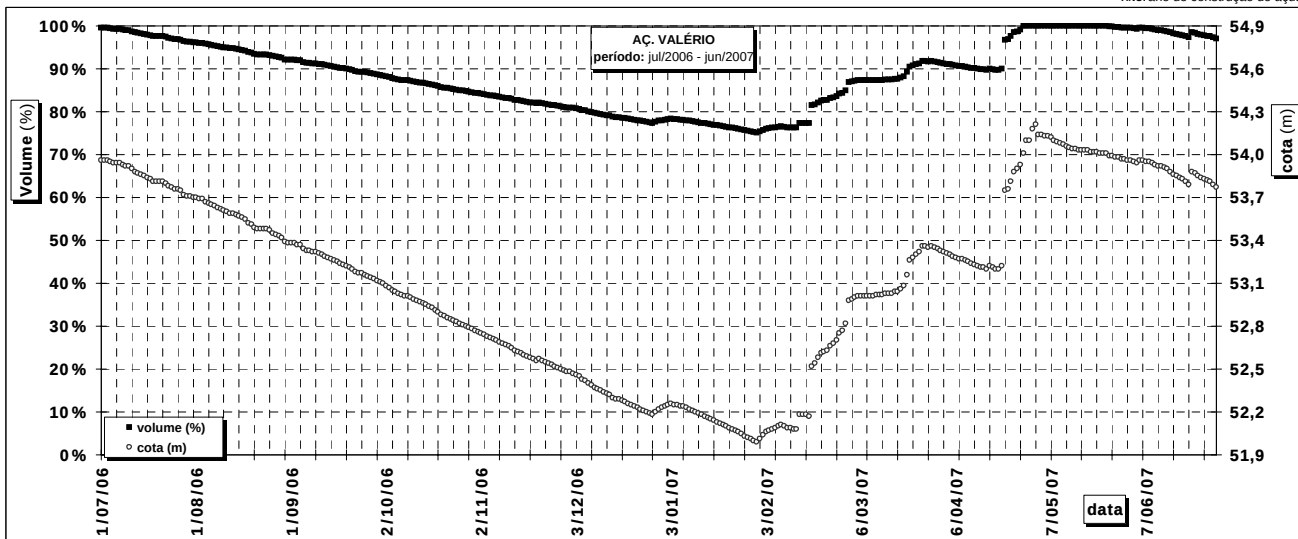

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/12/2006	183	53,96	52,23	1,73	0,95	2.009.600	1.575.200	434.400	27	26	1

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/1/2007	1/2/2007	21/6/2007	99	51,99	54,21	594.799	0	3.482.244	165.648	4.242.691

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	0	6.730	29.301	17.451	247.764	177.527	410.220	3.182.489	37.896	4.109.378

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	53,96	2.009.600	99,5%	-67.600	-2.181	-0,26	-0,84
01/08/2006	53,70	1.942.000	96,1%	-83.200	-2.684	-0,32	-1,03
01/09/2006	53,38	1.858.800	92,0%	-72.800	-2.427	-0,28	-0,93
01/10/2006	53,10	1.786.000	88,4%	-83.600	-2.697	-0,34	-1,10
01/11/2006	52,76	1.702.400	84,3%	-67.200	-2.240	-0,28	-0,93
01/12/2006	52,48	1.635.200	81,0%	-57.600	-1.858	-0,24	-0,77
01/01/2007	52,24	1.577.600	78,1%	-55.200	-1.781	-0,23	-0,74
01/02/2007	52,01	1.522.400	75,4%	194.400	6.943	0,81	2,89
01/03/2007	52,82	1.716.800	85,0%	129.001	4.161	0,51	1,65
01/04/2007	53,33	1.845.801	91,4%	174.199	5.807	0,85	2,83
01/05/2007	54,18	2.020.000	100,0%	-10.400	-335	-0,22	-0,71
01/06/2007	53,96	2.009.600	99,5%	-52.000	-1.733	-0,20	-0,67
01/07/2007	53,76	1.957.600	96,9%				
TOTAL ANUAL				-52.000		-0,20	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						1.184.644	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARM. MÉDIO (m³) (%)
365	0	28	53	179,4	3,69	53,13	1.795.780 88,9%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência/guatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇUDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Várzea da Volta


MUNICÍPIO: Moraújo

B. HIDROGRÁFICA: Coreaú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
12.500.000	2.300.000	108,00	104,00	80	0	159	1919

ANO: ano de construção do açude

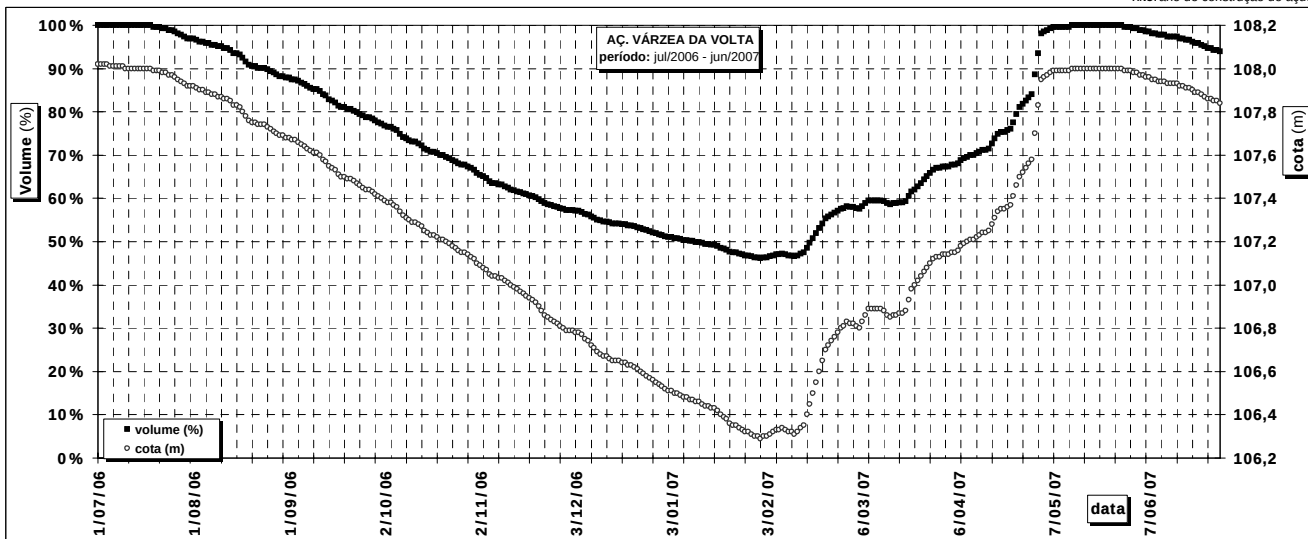

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	31/1/2007	214	108,02	106,30	1,72	0,80	12.500.000	5.790.009	6.709.991	362	294	68

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
1/2/2007	13/2/2007	28/5/2007	105	106,29	108,00	7.017.993	0	0	1.102.641	8.120.634

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m3)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
443.087	0	0	0	0	0	0	1.934.893	1.574.547	3.026.461	356.378	0	7.335.366

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	108,02	12.500.000	100,0%	-380.009	-12.258	-0,10	-0,32
01/08/2006	107,92	12.119.991	97,0%	-1.139.990	-36.774	-0,24	-0,77
01/09/2006	107,68	10.980.001	87,8%	-1.329.994	-44.333	-0,28	-0,93
01/10/2006	107,40	9.650.007	77,2%	-1.425.014	-45.968	-0,30	-0,97
01/11/2006	107,10	8.224.993	65,8%	-1.062.990	-35.433	-0,31	-1,03
01/12/2006	106,79	7.162.003	57,3%	-756.012	-24.387	-0,27	-0,87
01/01/2007	106,52	6.405.991	51,2%	-643.988	-20.774	-0,23	-0,74
01/02/2007	106,29	5.762.003	46,1%	1.512.002	54.000	0,54	1,93
01/03/2007	106,83	7.274.005	58,2%	1.140.992	36.806	0,31	1,00
01/04/2007	107,14	8.414.997	67,3%	2.659.989	88.666	0,56	1,87
01/05/2007	107,70	11.074.986	88,6%	1.377.504	44.436	0,29	0,94
01/06/2007	107,99	12.452.490	99,6%	-759.981	-25.333	-0,16	-0,53
01/07/2007	107,83	11.692.509	93,5%				
TOTAL ANUAL				-807.491		-0,19	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						7.461.403	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
134	0	0	12	622,0	2,33	107,27	9.300.000	74,4%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Sobral

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÚDES DO ESTADO DO CEARÁ

Convênio: COGERH/DNOCS

AÇUDE: Várzea do Boi


MUNICÍPIO: Tauá

B. HIDROGRÁFICA: Alto Jaguaribe

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
51.910.000	5.550.000	109,00	103,00	210	43	1.239	1954

ANO: ano de construção do açude

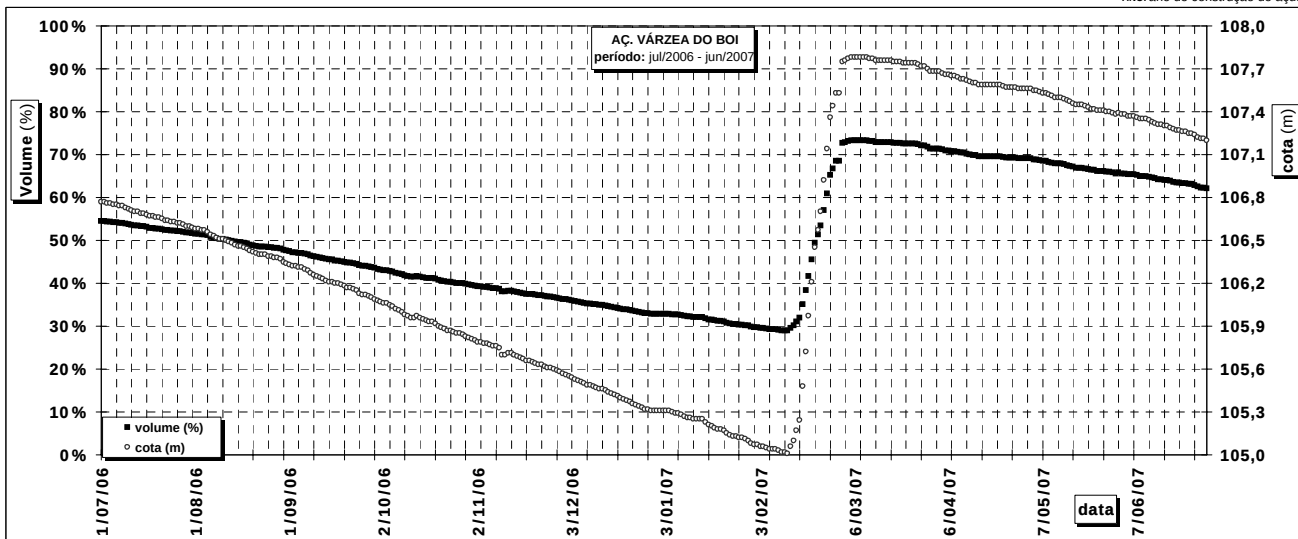

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	11/2/2007	225	106,77	105,02	1,75	0,78	28.305.672	15.067.977	13.237.695	680	680	0

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APOORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APOORTE	FIM APOORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APOORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APOORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
12/2/2007	12/2/2007	31/5/2007	55	105,01	107,78	23.140.993	0	0	1.014.888	24.155.881

APOORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	0	0	220.064	277.777	0	0	21.315.958	2.699.107	0	140.816	0	24.653.722

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	106,77	28.305.672	54,5%	-1.597.856	-51.544	-0,19	-0,61
01/08/2006	106,58	26.707.816	51,5%	-2.102.500	-67.823	-0,25	-0,81
01/09/2006	106,33	24.605.316	47,4%	-2.186.618	-72.887	-0,26	-0,87
01/10/2006	106,07	22.418.698	43,2%	-1.968.676	-63.506	-0,27	-0,87
01/11/2006	105,80	20.450.022	39,4%	-1.656.038	-55.201	-0,24	-0,80
01/12/2006	105,56	18.793.984	36,2%	-1.725.000	-55.645	-0,25	-0,81
01/01/2007	105,31	17.068.984	32,9%	-1.655.986	-53.419	-0,24	-0,77
01/02/2007	105,07	15.412.998	29,7%	20.126.990	718.821	2,46	8,79
01/03/2007	107,53	35.539.988	68,5%	1.500.016	48.388	0,15	0,48
01/04/2007	107,68	37.040.004	71,4%	-1.200.028	-40.001	-0,12	-0,40
01/05/2007	107,56	35.839.976	69,0%	-1.699.984	-54.838	-0,17	-0,55
01/06/2007	107,39	34.139.992	65,8%	-1.900.022	-63.334	-0,19	-0,63
01/07/2007	107,20	32.239.970	62,1%				
TOTAL ANUAL				3.934.298		0,43	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						20.419.534	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO (m³)	(%)
185	0	0	24	768,5	3,07	106,46	26.266.460	50,6%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência/guatu

ANUÁRIO DO MONITORAMENTO QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS AÇÜDES DO ESTADO DO CEARÁ

AÇUDE: Vieirão


MUNICÍPIO: Boa Viagem

B. HIDROGRÁFICA: Banabuiú

INFORMAÇÕES BÁSICAS

CAPAC. (m³)	V. MORTO (m³)	C. SANGRAD. (m)	COTA TOMADA (m)	L. SANGRAD. (m)	B. HIDR. CONC.(km²)	B. HIDROGR.(km²)	ANO
20.960.000		101,50		130	0	395	1988

ANO: ano de construção do açude

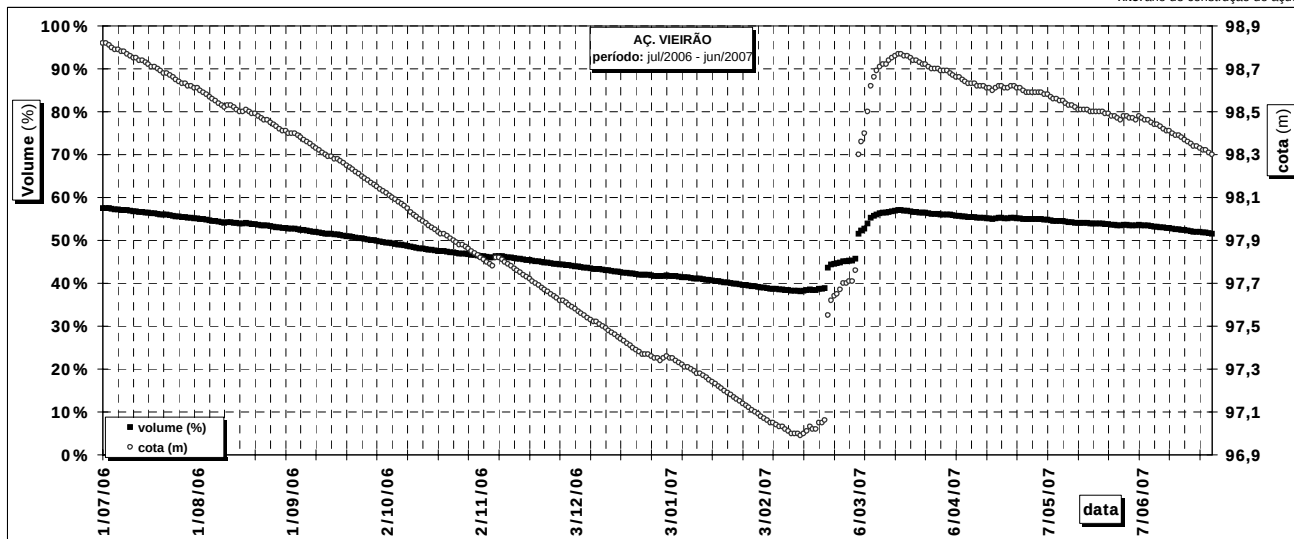

INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

--

SÍNTESE

ESTAÇÃO SECA 2006

INÍCIO	FIM	NÚMERO DE DIAS	COTA INÍCIO (m)	COTA FIM (m)	REDUÇÃO COTA (m)	REDUÇÃO MÉDIA COTA (cm/dia)	VOLUME INÍCIO (m³)	VOLUME FIM (m³)	REDUÇÃO VOLUME (m³)	VAZÃO MÉDIA REDUÇÃO (L/s)	VAZÃO MÉDIA EVAPOR. (L/s)	VAZÃO RESIDUAL (L/s)
1/7/2006	14/2/2007	228	98,82	97,00	1,82	0,80	12.056.199	8.010.000	4.046.199	205	182	23

ESTAÇÃO CHUVOSA 2007

INÍCIO APORTE D'ÁGUA	INÍCIO FIRME APORTE	FIM APORTE D'ÁGUA	NÚMERO DE DIAS APORTE	COTA MÍNIMA (m)	COTA MÁXIMA (m)	VOLUME ACRESC. (m³)	VOLUME LIBER. (m³)	VOLUME SANGR. (m³)	VOLUME EVAPOR. (m³)	APORTE D'ÁGUA TOTAL (m³)
15/2/2007	15/2/2007	5/6/2007	70	96,99	98,77	4.132.637	0	0	349.155	4.481.792

APORTE MENSAL DE ÁGUA (m³)

jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
0	112.638	0	0	117.581	36.349	32.952	1.612.870	2.626.134	122.741	54.531	56.850	4.772.646

EVOLUÇÃO MENSAL

DATA	COTA	VOLUME		VARIAÇÃO VOLUME		VARIAÇÃO COTA	
	(m)	(m³)	(%)	(m³)	(m³/dia)	(m)	(cm/dia)
01/07/2006	98,82	12.056.199	57,5%	-506.098	-16.326	-0,21	-0,68
01/08/2006	98,61	11.550.101	55,1%	-506.097	-16.326	-0,21	-0,68
01/09/2006	98,40	11.044.004	52,7%	-650.711	-21.690	-0,27	-0,90
01/10/2006	98,13	10.393.293	49,6%	-665.189	-21.458	-0,30	-0,97
01/11/2006	97,83	9.728.104	46,4%	-476.107	-15.870	-0,23	-0,77
01/12/2006	97,60	9.251.997	44,1%	-517.500	-16.694	-0,25	-0,81
01/01/2007	97,35	8.734.497	41,7%	-538.204	-17.361	-0,26	-0,84
01/02/2007	97,09	8.196.293	39,1%	1.262.701	45.096	0,61	2,18
01/03/2007	97,70	9.458.994	45,1%	2.307.999	74.452	1,00	3,23
01/04/2007	98,70	11.766.993	56,1%	-265.102	-8.837	-0,11	-0,37
01/05/2007	98,59	11.501.891	54,9%	-265.083	-8.551	-0,11	-0,35
01/06/2007	98,48	11.236.808	53,6%	-433.801	-14.460	-0,18	-0,60
01/07/2007	98,30	10.803.007	51,5%				
TOTAL ANUAL				-1.253.192		-0,52	
ESTIMATIVA DO VOLUME EVAPORADO (m³)						4.675.520	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº DADOS	Nº DIAS V.MORTO	Nº DIAS SANGR.	MAIOR ACRÉSC. (cm/dia)	TEMPO DE RESID. (dias)	PROFUND. MÉDIA (m)	COTA MÉDIA (m)	V. ARMAZ. MÉDIO	
336	0	0	54	1.603,0	4,56	98,10	10.396.160	49,6%

O monitoramento deste açude é realizado pela gerência Quixeramobim
